



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

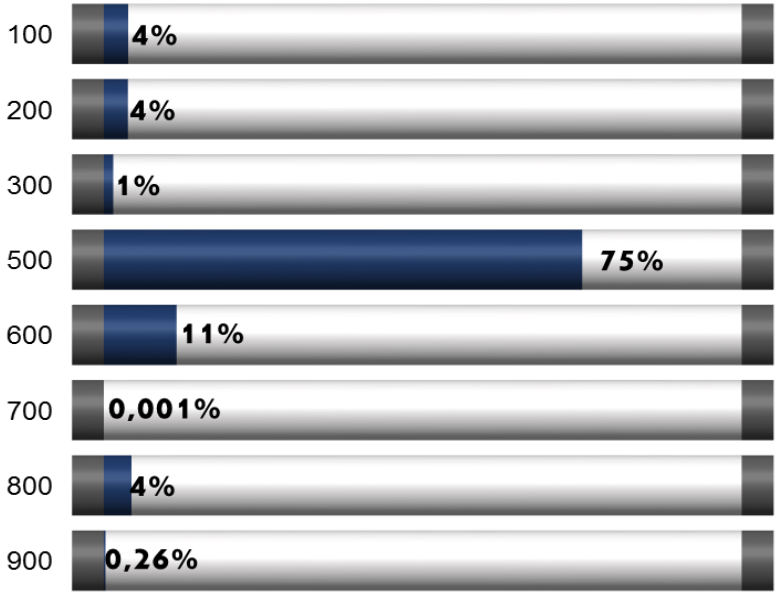


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	263.142.478.103	263.142.478.103	111.848.147.371	43%
200 Servicios No Personales	260.208.694.063	245.166.984.446	92.832.231.258	38%
300 Bienes de Consumo e Insumos	101.014.137.703	100.914.137.703	43.758.338.870	43%
500 Inversión Física	5.181.780.257.571	3.603.611.977.747	2.263.211.828.384	63%
600 Inversión Financiera	787.857.743.325	787.857.743.325	149.777.200.190	19%
700 Servicio de la Deuda Pública	59.428.734	0	0	0%
800 Transferencias	299.443.583.696	293.998.570.304	192.048.250.198	65%
900 Otros Gastos	17.754.133.607	17.754.133.607	12.233.479.461	69%
TOTAL ENTIDAD	6.911.260.456.802	5.312.446.025.235	2.865.709.475.732	54%


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

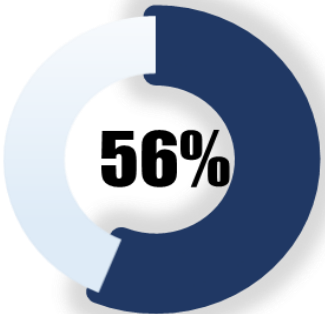


Presupuesto: \$ 248.996.293.992
Ejecutado: \$ 139.770.332.726

Recursos del Crédito Público

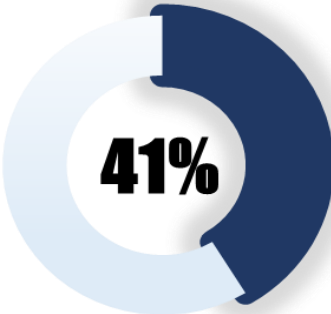

Presupuesto: \$ 5.795.539.029.998
Ejecutado: \$ 2.391.436.516.465

Recursos Institucionales

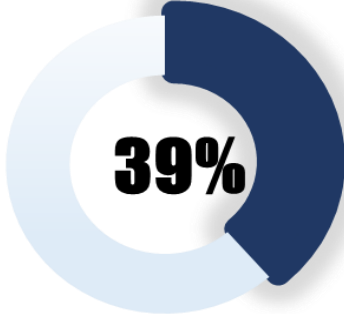

Presupuesto: \$ 866.725.132.812
Ejecutado: \$ 334.502.626.541

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.038.491.934.509	2.014.368.548.193	1.179.537.690.357	59%	989.605.420.613	189.932.269.744
01	Gestión Administrativa Financiera	370.432.138.054	370.432.138.054	179.532.078.879	48%	121.441.156.809	58.090.922.070
100 Servicios Personales		191.999.301.423	191.999.301.423	86.516.320.209	45%	53.648.085.664	32.868.234.545
200 Servicios No Personales		94.057.944.368	94.057.944.368	42.463.566.258	45%	36.420.204.463	6.043.361.795
300 Bienes de Consumo e Insumos		50.672.544.629	50.672.544.629	36.335.145.116	72%	20.136.103.386	16.199.041.730
500 Inversión Física		20.683.237.634	20.683.237.634	6.117.435.000	30%	5.056.135.000	1.061.300.000
900 Otros Gastos		13.019.110.000	13.019.110.000	8.099.612.296	62%	6.180.628.296	1.918.984.000
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	171.192.507.049	171.192.507.049	150.339.777.378	88%	114.801.020.877	35.538.756.501
800 Transferencias		171.192.507.049	171.192.507.049	150.339.777.378	88%	114.801.020.877	35.538.756.501

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	7.075.677.627	7.075.677.627	2.240.386.488	32%	1.420.334.972	820.051.516
100 Servicios Personales		5.762.046.911	5.762.046.911	2.164.525.947	38%	1.401.796.151	762.729.796
200 Servicios No Personales		444.059.514	444.059.514	26.385.941	6%	18.538.821	7.847.120
300 Bienes de Consumo e Insumos		138.987.010	138.987.010	49.474.600	36%	0	49.474.600
500 Inversión Física		690.584.192	690.584.192	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	4.000.000.000	4.000.000.000	1.016.207.938	25%	641.712.076	374.495.862
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	394.020.373	20%	263.088.140	130.932.233
200 Servicios No Personales		947.000.000	947.000.000	572.187.565	60%	378.623.936	193.563.629
300 Bienes de Consumo e Insumos		192.335.852	192.335.852	50.000.000	26%	0	50.000.000
500 Inversión Física		463.297.692	463.297.692	0	0%	0	0
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	54.042.852.627	54.042.852.627	19.578.439.880	36%	12.685.413.467	6.893.026.413
100 Servicios Personales		40.546.870.481	40.546.870.481	17.471.165.160	43%	10.675.847.645	6.795.317.515
200 Servicios No Personales		5.196.769.532	5.196.769.532	258.651.454	5%	202.965.056	55.686.398
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.182.192.000	4.182.192.000	1.848.623.266	44%	1.806.600.766	42.022.500
500 Inversión Física		3.774.746.787	3.774.746.787	0	0%	0	0
800 Transferencias		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		32.273.827	32.273.827	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	3.088.000.000	3.088.000.000	675.983.156	22%	440.346.339	235.636.817
100 Servicios Personales		1.897.000.000	1.897.000.000	313.529.210	17%	191.942.509	121.586.701
200 Servicios No Personales		941.000.000	941.000.000	362.453.946	39%	248.403.830	114.050.116
500 Inversión Física		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	1.902.000.000	1.902.000.000	36.269.160	2%	31.855.000	4.414.160
200 Servicios No Personales		745.000.000	745.000.000	36.269.160	5%	31.855.000	4.414.160
300 Bienes de Consumo e Insumos		130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.027.000.000	1.027.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.537.375.593	1.537.375.593	356.751.447	23%	68.820.155	287.931.292
200 Servicios No Personales		1.537.375.593	1.537.375.593	356.751.447	23%	68.820.155	287.931.292
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	52.835.155.574	52.835.155.574	27.999.325.604	53%	3.311.358.410	24.687.967.194
200 Servicios No Personales		285.000.000	285.000.000	96.825.132	34%	75.167.081	21.658.051
300 Bienes de Consumo e Insumos		78.290.000	78.290.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		51.771.865.574	51.771.865.574	27.902.500.472	54%	3.236.191.329	24.666.309.143
800 Transferencias		700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	27.473.891.835	27.473.891.835	18.581.031.600	68%	18.581.031.600	0
200 Servicios No Personales		1.615.686.400	1.615.686.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física		25.858.205.435	25.858.205.435	18.581.031.600	72%	18.581.031.600	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	18.613.894.440	18.613.894.440	7.633.875.643	41%	3.668.729.969	3.965.145.674
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.613.894.440	18.613.894.440	7.633.875.643	41%	3.668.729.969	3.965.145.674
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2º Etapa	38.871.822.162	38.871.822.162	20.575.071.055	53%	19.384.038.715	1.191.032.340
100 Servicios Personales		246.340.000	246.340.000	102.064.600	41%	81.494.600	20.570.000
500 Inversión Física		37.249.945.301	37.249.945.301	19.590.626.965	53%	18.420.164.625	1.170.462.340
800 Transferencias		1.375.536.861	1.375.536.861	882.379.490	64%	882.379.490	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	299.989.613	1.037.167.866
500 Inversión Física		6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	299.989.613	1.037.167.866
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
500 Inversión Física		19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	35.526.116.446	35.526.116.446	19.993.735.724	56%	19.993.735.724	0
500 Inversión Física		35.526.116.446	35.526.116.446	19.993.735.724	56%	19.993.735.724	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	52.332.916.945	28.209.530.630	10.525.192.649	37%	8.808.332.388	1.716.860.261
100 Servicios Personales		2.925.476.770	2.925.476.770	939.100.000	32%	739.300.000	199.800.000
200 Servicios No Personales		269.500.000	86.459.500	56.210.000	65%	56.210.000	0
500 Inversión Física		49.137.940.175	25.197.594.360	9.529.882.649	38%	8.012.822.388	1.517.060.261
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
24	Construcción de la Franja Costera Sur	35.706.321.074	35.706.321.074	3.759.943.520	11%	3.747.667.979	12.275.541
200 Servicios No Personales		3.749.415.936	3.749.415.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		23.868.272.126	23.868.272.126	3.747.667.979	16%	3.747.667.979	0
800 Transferencias		8.088.633.012	8.088.633.012	12.275.541	0,15%	0	12.275.541
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	416.697.409.758	416.697.409.758	314.209.457.935	75%	286.554.643.497	27.654.814.438
500 Inversión Física		416.697.409.758	416.697.409.758	314.209.457.935	75%	286.554.643.497	27.654.814.438

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	279.873.425.167	279.873.425.167	188.544.019.579	67%	172.660.601.602	15.883.417.977
200 Servicios No Personales		1.286.129	1.286.129	0	0%	0	0
500 Inversión Física		279.872.139.038	279.872.139.038	188.544.019.579	67%	172.660.601.602	15.883.417.977
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	67.253.309.353	67.253.309.353	22.509.197.160	33%	22.509.197.160	0
500 Inversión Física		61.188.699.364	61.188.699.364	22.509.197.160	37%	22.509.197.160	0
800 Transferencias		6.064.609.989	6.064.609.989	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	50.588.841.342	50.588.841.341	30.746.583.934	61%	30.746.583.934	0
500 Inversión Física		50.588.841.342	50.588.841.341	30.746.583.934	61%	30.746.583.934	0
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	85.896.043.108	85.896.043.108	39.883.023.932	46%	39.087.869.889	795.154.043
500 Inversión Física		85.896.043.108	85.896.043.108	39.883.023.932	46%	39.087.869.889	795.154.043
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	32.283.778.168	32.283.778.168	21.407.967.767	66%	14.640.029.964	6.767.937.803
500 Inversión Física		32.283.778.168	32.283.778.168	21.407.967.767	66%	14.640.029.964	6.767.937.803

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
34	SP Const de Autopista Ñu Guazu Asunción- Luque 6,30KM	2.423.492.331	2.423.492.331	2.423.492.331	100%	2.215.517.165	207.975.166
500 Inversión Física		207.975.166	207.975.166	207.975.166	100%	0	207.975.166
900 Otros Gastos		2.215.517.165	2.215.517.165	2.215.517.165	100%	2.215.517.165	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	65.979.166.251	65.979.166.251	5.147.943.270	8%	4.570.111.259	577.832.011
100 Servicios Personales		3.537.700.000	3.537.700.000	1.105.500.000	31%	886.800.000	218.700.000
200 Servicios No Personales		8.693.818.910	8.693.818.910	1.912.409.494	22%	1.553.277.483	359.132.011
500 Inversión Física		49.850.998.777	49.850.998.777	2.130.033.776	4%	2.130.033.776	0
800 Transferencias		3.896.648.564	3.896.648.564	0	0%	0	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	53.470.139.813	53.470.139.813	19.824.362.921	37%	19.824.362.921	0
500 Inversión Física		53.470.139.813	53.470.139.813	19.824.362.921	37%	19.824.362.921	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	60.778.078.039	60.778.078.039	33.179.288.212	55%	29.989.833.413	3.189.454.799
500 Inversión Física		60.778.078.039	60.778.078.039	33.179.288.212	55%	29.989.833.413	3.189.454.799
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
500 Inversión Física		1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
500 Inversión Física		18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
SUBTOTAL		2.038.491.934.509	2.014.368.548.193	1.179.537.690.357	59%	989.605.420.613	189.932.269.744

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.417.219.508.144	2.913.480.437.899	1.457.697.595.667	50%	1.312.913.315.660	144.784.280.007
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	4.079.051.769	3.719.051.769	88.000.000	2%	70.400.000	17.600.000
100 Servicios Personales		232.320.000	232.320.000	88.000.000	38%	70.400.000	17.600.000
200 Servicios No Personales		2.625.250.714	2.265.250.714	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.221.481.055	1.221.481.055	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	94.324.027.339	94.324.027.339	80.844.512.954	86%	34.169.681.524	46.674.831.430
100 Servicios Personales		1.515.205.174	1.515.205.174	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.416.166.013	2.416.166.013	529.257.440	22%	528.276.550	980.890
500 Inversión Física		90.035.156.152	90.035.156.152	80.315.255.514	89%	33.641.404.974	46.673.850.540
800 Transferencias		357.500.000	357.500.000	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	44.730.423.492	16.618.072.692	7.167.772.090	43%	6.745.964.545	421.807.545
200 Servicios No Personales		213.256.071	198.616.535	0	0%	0	0
500 Inversión Física		44.517.167.421	16.419.456.157	7.167.772.090	44%	6.745.964.545	421.807.545

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	141.810.170.688	141.810.170.688	105.929.907.794	75%	104.862.985.918	1.066.921.876
200 Servicios No Personales		64.816.209	64.816.209	31.533.713	49%	28.591.043	2.942.670
500 Inversión Física		141.745.354.479	141.745.354.479	105.898.374.081	75%	104.834.394.875	1.063.979.206
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	55.553.500.000	55.553.500.000	22.863.041.328	41%	22.863.041.328	0
200 Servicios No Personales		10.000.000.000	10.000.000.000	2.624.743.420	26%	2.624.743.420	0
500 Inversión Física		45.553.500.000	45.553.500.000	20.238.297.908	44%	20.238.297.908	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	181.334.680.897	88.675.141.292	60.222.968.513	68%	59.739.363.037	483.605.476
100 Servicios Personales		1.148.490.024	1.148.490.024	306.112.510	27%	244.890.008	61.222.502
200 Servicios No Personales		1.716.368.383	816.447.560	27.233.677	3%	25.075.719	2.157.958
500 Inversión Física		178.469.822.490	86.710.203.708	59.889.622.326	69%	59.469.397.310	420.225.016
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	59.270.373.609	56.521.943.828	54.644.398.705	97%	54.207.480.403	436.918.302
200 Servicios No Personales		3.683.226.067	1.928.736.308	1.393.314.621	72%	1.119.214.992	274.099.629
500 Inversión Física		55.587.147.542	54.593.207.520	53.251.084.084	98%	53.088.265.411	162.818.673

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	75.522.608.390	15.478.051.554	8.105.758.773	52%	8.105.758.773	0
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		34.409.586	34.409.586	2.641.530	8%	2.641.530	0
500 Inversión Física		74.708.198.804	14.663.641.968	8.103.117.243	55%	8.103.117.243	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	12.025.062.413	7.707.139.175	6.583.045.590	85%	6.583.045.590	0
500 Inversión Física		12.025.062.413	7.707.139.175	6.583.045.590	85%	6.583.045.590	0
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	14.102.946.080	11.388.204.000	6.463.610.346	57%	5.886.111.083	577.499.263
100 Servicios Personales		699.600.000	699.600.000	291.500.000	42%	233.200.000	58.300.000
200 Servicios No Personales		5.259.119.840	5.259.119.840	927.099.639	18%	892.939.987	34.159.652
500 Inversión Física		8.144.226.240	5.429.484.160	5.245.010.707	97%	4.759.971.096	485.039.611
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	85.912.925.833	32.072.400.277	20.506.767.571	64%	9.841.538.095	10.665.229.476
200 Servicios No Personales		2.792.717.385	2.686.112.424	144.772.483	5%	144.772.483	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		214.200.000	214.200.000	0	0%	0	
500 Inversión Física		82.347.125.833	28.613.205.238	20.361.995.088	71%	9.696.765.612	10.665.229.476
900 Otros Gastos		558.882.615	558.882.615	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.


En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	6.175.021.609	6.075.021.609	1.683.919.108	28%	1.489.341.471	194.577.637
200 Servicios No Personales		2.425.144.300	2.425.144.300	1.683.919.108	69%	1.489.341.471	194.577.637
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.749.877.309	3.649.877.309	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	5.041.224.407	5.041.224.407	1.611.340.273	32%	1.611.340.273	0
500 Inversión Física		5.041.224.407	5.041.224.407	1.611.340.273	32%	1.611.340.273	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.591.325.335	245.508.903
500 Inversión Física		6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.591.325.335	245.508.903
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	5.896.193.672	5.896.193.672	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.896.193.672	5.896.193.672	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	520.112.054	520.112.054	0	0%	0
500 Inversión Física		520.112.054	520.112.054	0	0%	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	4.603.549.270	4.603.549.270	76.963.486	2%	76.963.486
500 Inversión Física		4.603.549.270	4.603.549.270	76.963.486	2%	76.963.486
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	3.078.487.196	3.078.487.196	0	0%	0
500 Inversión Física		3.078.487.196	3.078.487.196	0	0%	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	7.518.937.004	7.518.937.004	2.296.087.727	31%	370.684.522
500 Inversión Física		7.518.937.004	7.518.937.004	2.296.087.727	31%	370.684.522
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristóbal Ruta 6	4.033.435.702	4.033.435.702	0	0%	0
500 Inversión Física		2.727.860.457	2.727.860.457	0	0%	0
800 Transferencias		1.305.575.245	1.305.575.245	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	844.166.488.543	844.166.488.543	160.696.498.273	19%	160.050.750.850	645.747.423
200 Servicios No Personales		19.000.000.000	19.000.000.000	2.905.000.000	15%	2.324.000.000	581.000.000
500 Inversión Física		11.715.132.940	11.715.132.940	2.676.770.460	23%	2.676.770.460	0
600 Inversión Financiera		787.857.743.325	787.857.743.325	149.777.200.190	19%	149.777.200.190	0
800 Transferencias		25.593.612.278	25.593.612.278	5.337.527.623	21%	5.272.780.200	64.747.423
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	17.281.066.122	17.281.066.122	6.996.364.100	40%	6.996.364.100	0
200 Servicios No Personales		4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.843.197.516	12.843.197.516	6.996.364.100	54%	6.996.364.100	0
800 Transferencias		437.868.606	437.868.606	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	9.830.000.000	5.296.897.326	4.937.752.689	93%	4.937.752.689	0
500 Inversión Física		9.830.000.000	5.296.897.326	4.937.752.689	93%	4.937.752.689	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	100.441.850.001	70.974.638.800	22.657.477.622	32%	22.437.236.359	220.241.263
200 Servicios No Personales		3.085.000.000	1.888.914.011	808.025.084	43%	808.025.084	0
500 Inversión Física		97.356.850.001	69.085.724.789	21.849.452.538	32%	21.629.211.275	220.241.263
54	Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	37.995.436.674	17.067.303.932	7.811.979.584	46%	6.469.776.677	1.342.202.907
100 Servicios Personales		936.000.000	936.000.000	114.950.000	12%	91.960.000	22.990.000
200 Servicios No Personales		3.224.409.586	1.037.432.189	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.835.027.088	15.093.871.743	7.697.029.584	51%	6.377.816.677	1.319.212.907
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	164.812.107.349	65.592.124.435	29.204.281.790	45%	25.698.446.207	3.505.835.583
200 Servicios No Personales		1.700.000.000	545.384.604	32.467.533	6%	0	32.467.533
500 Inversión Física		163.112.107.349	65.046.739.831	29.171.814.257	45%	25.698.446.207	3.473.368.050

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	672.611.053.796	435.622.203.254	400.437.973.954	92%	397.820.661.756	2.617.312.198
100 Servicios Personales		1.011.360.000	1.011.360.000	346.794.752	34%	294.933.603	51.861.149
200 Servicios No Personales		13.630.430.000	13.630.430.000	10.125.171.232	74%	8.268.237.407	1.856.933.825
500 Inversión Física		657.969.263.796	420.980.413.254	389.966.007.970	93%	389.257.490.746	708.517.224
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	224.811.961.165	214.686.961.165	30.645.099.756	14%	21.233.694.960	9.411.404.796
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	176.000.000	26%	140.800.000	35.200.000
200 Servicios No Personales		2.017.673.300	2.017.673.300	105.698.379	5%	92.237.987	13.460.392
500 Inversión Física		222.121.087.865	211.996.087.865	30.363.401.377	14%	21.000.656.973	9.362.744.404
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	5.775.472.863	5.775.472.863	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.775.472.863	5.775.472.863	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	611.827.085.909	121.166.393.898	84.517.613.562	70%	71.074.304.758	13.443.308.804
200 Servicios No Personales		358.345.482	153.651.646	110.000.000	72%	16.500.000	93.500.000
500 Inversión Física		607.892.765.427	120.537.911.389	84.404.928.462	70%	71.057.804.758	13.347.123.704
800 Transferencias		3.575.975.000	474.830.863	2.685.100	1%	0	2.685.100

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	150.708.440.996	50.848.600.744	44.891.152.751	88%	27.704.943.739	17.186.209.012
200 Servicios No Personales		820.000.000	263.067.868	0	0%	0	0
500 Inversión Física		148.388.440.996	49.085.532.876	44.891.152.751	91%	27.704.943.739	17.186.209.012
800 Transferencias		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	157.728.601.281	134.616.253.444	130.423.438.395	97%	115.919.327.432	14.504.110.963
200 Servicios No Personales		868.451.836	868.451.836	0	0%	0	0
500 Inversión Física		156.860.149.445	133.747.801.608	130.423.438.395	98%	115.919.327.432	14.504.110.963
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	88.470.317.450	58.989.559.410	53.175.859.764	90%	47.284.533.861	5.891.325.903
200 Servicios No Personales		326.757.000	104.828.375	0	0%	0	0
500 Inversión Física		88.143.560.450	58.884.731.035	53.175.859.764	90%	47.284.533.861	5.891.325.903
86	SP Mej. Gestion y Mant de la Red Vial PY (BIRF 7406)	3.244.212.816	3.244.212.816	1.918.350.000	59%	1.918.350.000	0
500 Inversión Física		1.325.862.816	1.325.862.816	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.918.350.000	1.918.350.000	1.918.350.000	100%	1.918.350.000	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	0	10.708.754.545
500 Inversión Física		11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	0	10.708.754.545

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	107.075.002.876	14.785.465.234	1.123.887.472	8%	1.123.887.472	0
200 Servicios No Personales		3.169.643.630	3.144.174.173	0	0%	0	0
500 Inversión Física		101.345.930.512	10.839.254.879	1.123.887.472	10%	1.123.887.472	0
700 Servicio de la Deuda Pública		59.428.734	0	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.500.000.000	802.036.182	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	113.803.372.094	113.803.372.094	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		510.000.000	510.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		113.293.372.094	113.293.372.094	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	244.596.399.343	122.420.852.849	72.747.029.495	59%	72.747.029.495	0
200 Servicios No Personales		3.412.500.000	1.094.779.388	0	0%	0	0
500 Inversión Física		240.533.899.343	121.117.544.054	72.747.029.495	60%	72.747.029.495	0
800 Transferencias		650.000.000	208.529.407	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy -San Jose de los Arroyos	4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	100%	0	4.075.678.694
500 Inversión Física		4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	100%	0	4.075.678.694
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	27.804.643.807	27.804.643.807	9.803.474.725	35%	9.803.474.725	0
200 Servicios No Personales		17.053.741.019	17.053.741.019	8.227.242.640	48%	8.227.242.640	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.673.902.788	9.673.902.788	500.000.000	5%	500.000.000	0
500 Inversión Física		1.077.000.000	1.077.000.000	1.076.232.085	100%	1.076.232.085	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	310.428.057.720	252.309.821.902	155.097.139.734	61%	146.020.384.246	9.076.755.488
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	4.022.189.595	4.022.189.595	2.664.554.100	66%	2.664.554.100	0
200 Servicios No Personales		13.228.758	13.228.758	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.008.960.837	4.008.960.837	2.664.554.100	66%	2.664.554.100	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	7.445.707.423	6.581.941.598	5.419.167.559	82%	5.346.080.807	73.086.752
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.445.707.423	6.581.941.598	5.419.167.559	82%	5.346.080.807	73.086.752

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	32.992.679.907	17.227.831.245	11.652.009.115	68%	10.982.264.587	669.744.528
200 Servicios No Personales		2.869.547.140	2.869.547.140	1.300.093.240	45%	828.643.240	471.450.000
500 Inversión Física		30.123.132.767	14.358.284.105	10.351.915.875	72%	10.153.621.347	198.294.528
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	52.590.788.240	41.760.138.824	38.214.031.770	92%	36.696.058.855	1.517.972.915
100 Servicios Personales		1.010.400.000	1.010.400.000	286.000.000	28%	228.800.000	57.200.000
200 Servicios No Personales		5.797.795.368	5.300.906.916	3.757.385.217	71%	2.872.897.593	884.487.624
500 Inversión Física		45.782.592.872	35.448.831.908	34.170.646.553	96%	33.594.361.262	576.285.291
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	22.403.050.539	22.403.050.539	9.658.107.163	43%	6.392.624.183	3.265.482.980
500 Inversión Física		22.403.050.539	22.403.050.539	9.658.107.163	43%	6.392.624.183	3.265.482.980
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.961.553.346	1.961.553.346	695.338.765	35%	672.639.217	22.699.548
200 Servicios No Personales		1.740.958.606	1.740.958.606	695.338.765	40%	672.639.217	22.699.548
500 Inversión Física		220.594.740	220.594.740	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	55.100.000	55.100.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		55.100.000	55.100.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	4.494.371.140	4.494.371.140	509.180.255	11%	509.180.255	0
500 Inversión Física		4.494.371.140	4.494.371.140	509.180.255	11%	509.180.255	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	105.108.038.518	74.449.066.603	54.900.577.953	74%	54.056.053.303	844.524.650
200 Servicios No Personales		2.003.186.515	1.579.243.776	871.046.645	55%	755.942.726	115.103.919
500 Inversión Física		103.104.852.003	72.869.822.827	54.029.531.308	74%	53.300.110.577	729.420.731
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	67.973.579.012	67.973.579.012	22.922.473.063	34%	20.239.228.948	2.683.244.115
200 Servicios No Personales		12.128.324.819	12.128.324.819	6.836.926.744	56%	5.292.352.783	1.544.573.961
300 Bienes de Consumo e Insumos		31.981.808.115	31.981.808.115	4.975.095.888	16%	4.975.095.888	0
500 Inversión Física		13.119.402.398	13.119.402.398	3.113.096.911	24%	2.589.607.797	523.489.114
800 Transferencias		10.744.043.680	10.744.043.680	7.997.353.520	74%	7.382.172.480	615.181.040

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	11.381.000.000	11.381.000.000	8.461.699.991	74%	8.461.699.991	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.381.000.000	11.381.000.000	8.461.699.991	74%	8.461.699.991	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	85.420.883.017	72.587.143.829	45.900.798.428	63%	39.910.197.098	5.990.601.330
01	SP Proyecto Acueducto	1.727.852.967	1.727.852.967	177.132.164	10%	177.132.164	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.727.852.967	1.727.852.967	177.132.164	10%	177.132.164	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	49.135.312.877	45.003.670.428	23.141.313.407	51%	17.190.843.077	5.950.470.330
100 Servicios Personales		5.715.800.864	5.715.800.864	1.031.909.610	18%	847.565.600	184.344.010
200 Servicios No Personales		5.160.470.054	5.160.470.054	1.835.706.698	36%	398.738.585	1.436.968.113
500 Inversión Física		37.258.041.959	33.330.834.354	20.273.697.099	61%	15.944.538.892	4.329.158.207
800 Transferencias		1.001.000.000	796.565.156	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	18.680.900.000	11.685.667.768	9.029.179.605	77%	9.009.114.105	20.065.500
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	100.327.500	38%	80.262.000	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.614.400.000	1.013.254.894	926.998.453	91%	926.998.453	0
500 Inversión Física		15.802.500.000	10.408.412.874	8.001.853.652	77%	8.001.853.652	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	15.876.817.173	14.169.952.666	13.553.173.252	96%	13.533.107.752	20.065.500
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	100.327.500	38%	80.262.000	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.184.400.000	847.785.703	788.904.600	93%	788.904.600	0
500 Inversión Física		13.428.417.173	13.058.166.963	12.663.941.152	97%	12.663.941.152	0
SUBTOTAL		4.813.068.448.881	3.238.377.403.630	1.658.695.533.829	51%	1.498.843.897.004	159.851.636.825

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	59.700.073.412	59.700.073.412	27.476.251.546	46%	22.874.819.549	4.601.431.997
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	59.700.073.412	59.700.073.412	27.476.251.546	46%	22.874.819.549	4.601.431.997
800 Transferencias		59.700.073.412	59.700.073.412	27.476.251.546	46%	22.874.819.549	4.601.431.997
SUBTOTAL		59.700.073.412	59.700.073.412	27.476.251.546	46%	22.874.819.549	4.601.431.997
TOTAL ENTIDAD		6.911.260.456.802	5.312.446.025.235	2.865.709.475.732	54%	2.511.324.137.166	354.385.338.566

FUENTE MH - SIAF, al 30/06/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
