



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

PARLAMENTO ABIERTO DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva,
Geográfica y Costo por Unidad.**

30/09/2017




MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/09/17

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE	Gs.	5,01	billones
✓ EJECUCIÓN	Gs.	2,68	billones
54% de Ejecución Financiera al 3er trimestre del año.			

Distribución Porcentual por Grupos de Inversión del Presupuesto
Financiero del MOPC

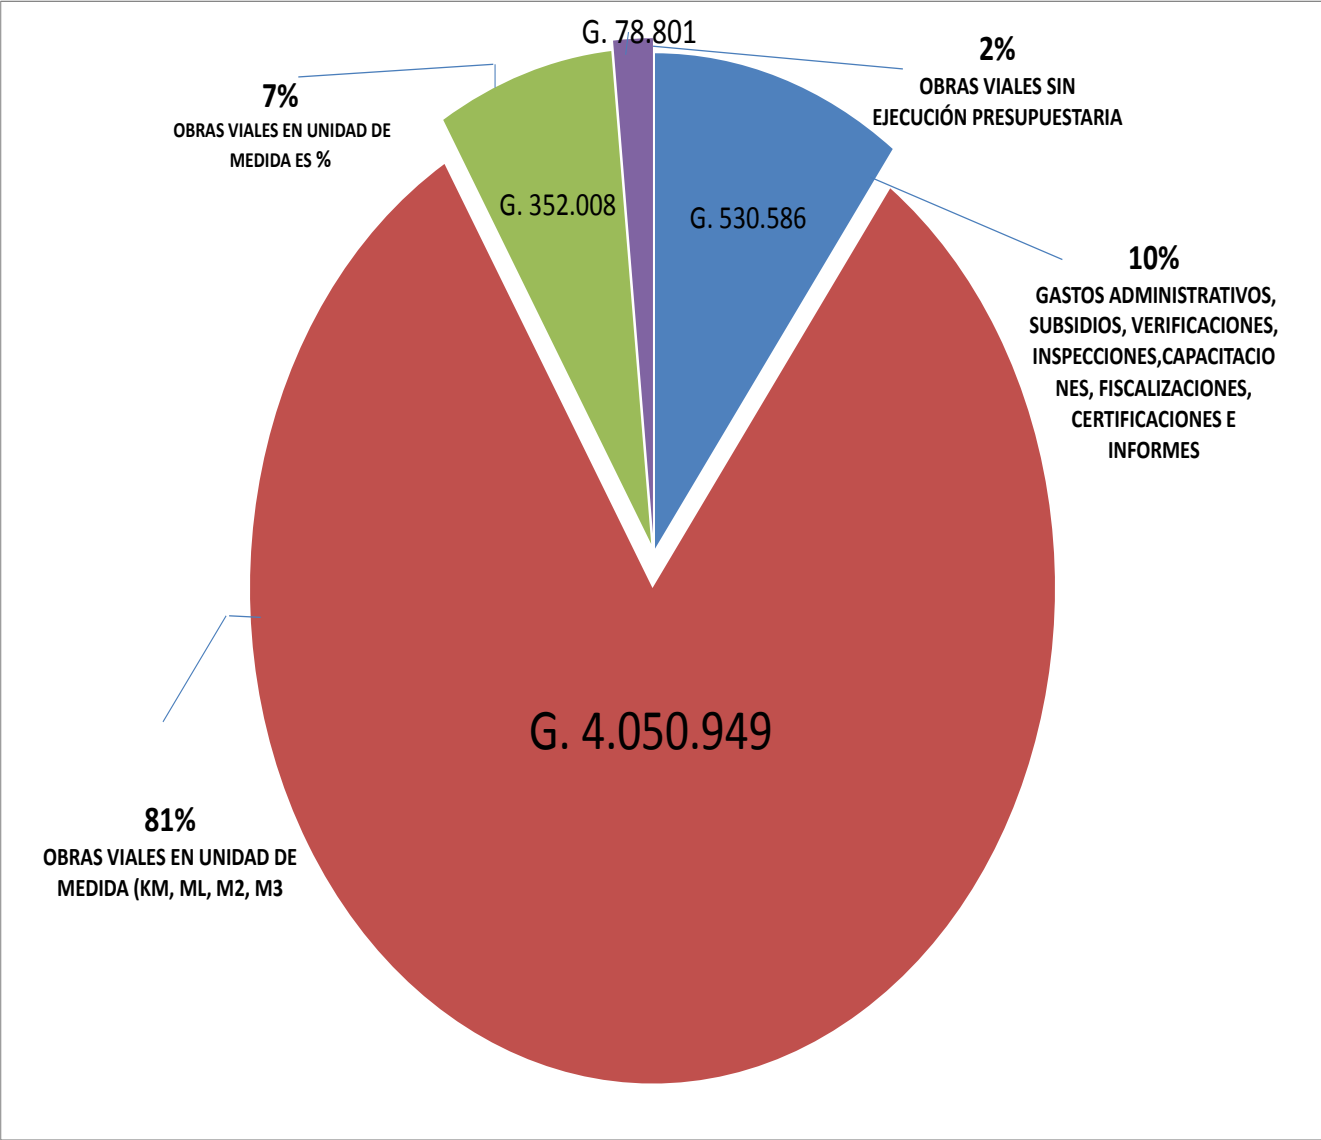



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSIDIOS, VERIFICACIONES, INSPECCIONES, CAPACITACIONES, FISCALIZACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES	530.586	530.576	288.975	241.611	54%	10%	11%
2	OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (KM, METRO LINEAL, METRO CUADRADO, METRO CUBICO)	4.050.949	4.050.949	2.225.447	1.825.502	55%	81%	83%
3	OBRAS VIALES DONDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PORCENTAJE	352.008	352.008	164.689	187.319	47%	7%	6%
4	OBRAS VIALES SIN EJECUCIÓN	78.801	45.301	0	78.801	0%	2%	0%
TOTAL EN GUARANÍES		5.012.344	4.978.834	2.679.111	2.333.233	53%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		872	866	466	406			

Fuente: SIAF,12/10/17 T.C. 5.620

MTMS

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSIDIOS, VERIFICACIONES, INSPECCIONES, CAPACITACIONES, FISCALIZACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES.

Con un Presupuesto Financiero de G. 530,59 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria de G. 288,98 mil millones que representa el 54%.(Pág.7).

- **Inspecciones de Permiso:** Las gestiones de los Recursos Naturales muestra que cada inspecciones de permisos y concesiones mineras de hidrocarburos tuvo un costo de 190,46 millones cada uno, cada inspección de cantera G. 21,19 millones, cada mapa geológico entregado G. 20,61 millones. (Pág.7).
- **Regulación de la Marina Mercante:** Por cada fiscalización del cumplimiento de Normas Legales realizados G.11 millones. (Pág.7)

2. OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (KM, METRO, METRO LINEAL, METRO CUADRADO, METRO CUBICO).

Con un Presupuesto Financiero de G. 4,05 billones, una Ejecución Presupuestaria Financiera de G. 2,23 billones que representa el 55%

- **Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay:** con Préstamos del BIRF, se ha ejecutado financieramente G. 9,30 mil millones, sin ejecución Productiva. (Pág.9).
- **FOCEM – Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Tramo Concepción – Vallemí:** 100 Km como Meta Inicial al 3er trimestre del año, con Avance de Producción de tan solo 2 Km y un costo de G. 22,78 mil millones por Km. (Pág. 10).
- **La Pavimentación Asfáltica del Tramo San Juan Nepomuceno – empedrado Ruta VI:** con un costo de G. 63,84 mil millones 1 solo km y sin Avance de Producción. (Pág.10).

3.-OBRAS VIALES DONDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PORCENTAJE.

Con un Presupuesto Financiero de G. 352 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria Financiera de G. 164,69 mil millones que representa el 47%, donde no se puede determinar el costo unitario de la obra.
(Pág. 13).

4.-OBRAS VIALES SIN EJECUCION PRESUPUESTARIA.


Cuenta un Presupuesto Financiero de G. 78,80 mil millones, sin Ejecución Presupuestaria al tercer trimestre del año. (Pág. 14). ¿Será que se ejecutará en el último trimestre del año?



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRODUCTIVA EN KM,M,M2,ML

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA			
	Unidad	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA				
KILOMETRO	KM	19.207	16.919	88%
METROS	M	1.400	1.000	71%
M2	M2	11.400	6.600	58%
METRO LINEAL	ML	5.466	3.802	70%
UNIDADES	Unidad	40	17	43%
Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en km, m,m2, ml	MTIMS			

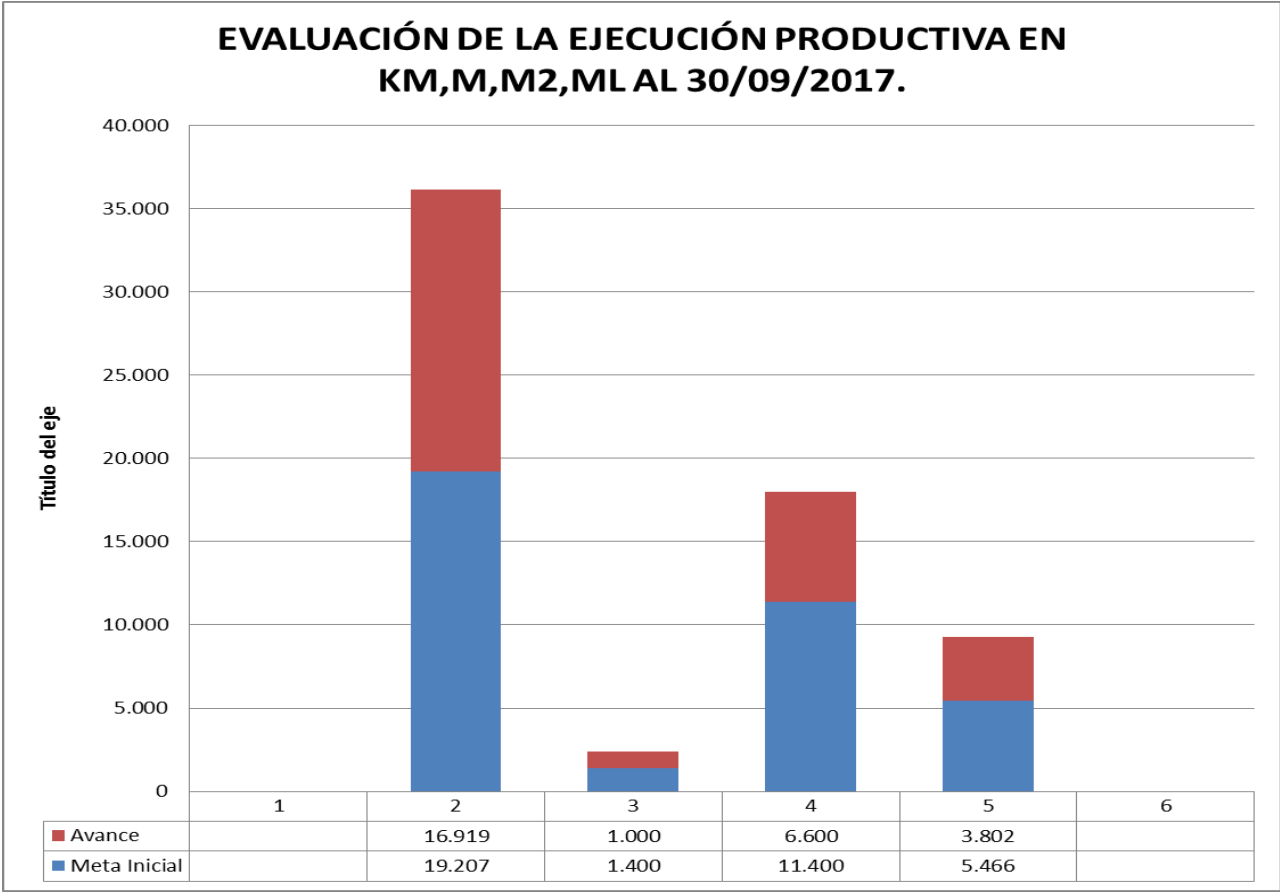



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL			
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA AL 30/09/2017			
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA		
	KM		
	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (KM)	19.207	16.919	88%
1-Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión	300	300	100%
2-Rutas Pavimentadas Mantenidas	17.467	16.052	92%
SP Conservación de Obras Viales	148	4.845	3274%
SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	100	0	0%
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos	100	0	0%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	377	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	377	0	0%
SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	13.418	8.944	67%
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos	13.418	8.944	67%
SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	102	47	46%
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos	102	47	46%
SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	3.322	2.216	67%
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos	3.322	2.216	67%
3-Rutas Pavimentadas Construidas	1.064	464	44%
SP Pav. Asf. s/ Empedrados	24	18	75%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	24	18	75%
Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	15	14	93%
Rutas Pavimentadas Construidas	15	14	93%
SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguarí- Carapeguá -Quiindy-Caapucu	13	12	92%
Rutas Pavimentadas Construidas	13	12	92%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)	20	14	70%
Rutas Pavimentadas Construidas	20	14	70%
SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	65	42	65%
Rutas Pavimentadas Construidas	65	42	65%
SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	95	62	65%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	95	62	65%
SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	12	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	12	0	0%
SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	100	2	2%
Rutas Pavimentadas Construidas	100	2	2%
SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	102	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	102	0	0%
Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	0	0	0%
SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	12	0	0%
Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	1	0	0%
Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	1	0	0%
Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	6	0	0%
Avenida Costanera Construida	6	0	0%
SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	100	8	8%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	27	15	56%
Rutas Pavimentadas Construidas	27	15	56%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	377	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	12	0	0%
Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	141	116	82%
Rutas Pavimentadas Construidas	141	116	82%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	7	5	71%
Rutas Pavimentadas Construidas	7	5	71%
Rutas Pavimentadas Construidas	100	8	8%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	4	20	500%
Rutas Pavimentadas Construidas	4	20	500%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	256	103	40%
SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	256	103	40%
Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	63	33	52%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	63	33	52%
4-Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido	6	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido	6	0	0%
5- Puentes Construidos	370	103	28%
Puentes Construidos	370	103	28%

Fuente: SIAF 12 /10/2017, en Km.

MTIM



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/ 09/17

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL			
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2017			
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA METROS		
	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (M)			
Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	1.400	1.000	71%
Fuente: SIAF 12 /10/2017, en metros			MTIM

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL			
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2017			
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA M2		
	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (M2)			
Obras de Reconversión Urbana Construidas	11.400	6.600	58%
Fuente: SIAF 12 /10/2017, en m2			MTIM

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL			
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2017			
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA ML		
	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (ML).	5.466	3.802	70%
Puentes Construidos	85	45	53%
Puentes Construidos	86	105	122%
Puentes Construidos	442	124	28%
Paso a Desnivel Construidos	155	68	44%
Alcantarillas Construidas	3.720	1.494	40%
Alcantarillas Construidas	378	1.454	385%
Puentes Mantenidos	600	512	85%
Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en ml			MTIM

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL			
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA AL 30/09/2017			
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PRODUCTIVA		
	Meta Inicial	Avance	%
OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (UNIDADES)	40	17	43%
Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	1	0	0%
Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	3	2	67%
SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	36	15	42%
Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en unidades			MTIM



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5.012.345.917.605		4.978.835.917.905	2.679.112.656.870	54%						
1-					GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSIDIOS, VERIFICACIONES, INSPECCIONES, CAPACITACIONES, FISCALIZACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES	530.586.245.639		530.576.245.639	288.975.793.099	54%						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	387.686.622.727		387.676.622.727	224.603.567.768	58%	%	100	58	58%	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.970.261.234		34.970.261.234	19.928.281.433	57%						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público			25.183.512.000	15.924.762.000	63%	Subsidios	20.280	8.172	40%	1.241.791	1.948.698
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros			9.786.749.234	4.003.519.433	41%	Verificación	4.816	2.026	42%	2.032.132	1.976.071
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504		2.474.531.504	1.110.352.660	45%						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas			1.317.871.868	819.248.123	62%	Fiscaliz.	107	74	69%	12.316.560	11.070.921
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas			637.146.436	229.602.337	36%	Certific.	2.400	2.136	89%	265.478	107.492
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas			519.513.200	61.502.200	12%	Certific.	12.700	12.774	101%	40.907	4.815
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101		7.901.447.101	2.821.597.844	36%						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras			1.865.371.634	550.982.819	30%	Unidades	36	26	72%	51.815.879	21.191.647
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos			4.137.323.080	1.714.120.948	41%	Unidades	19	9	47%	217.753.846	190.457.883
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados			1.898.752.387	556.494.077	29%	Unidades	41	27	66%	46.311.034	20.610.892
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749		29.387.157.749	15.113.078.067	51%						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional			29.301.157.749	15.087.030.199	51%	Operativos	10.330	16.546	160%	2.836.511	911.823
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas			86.000.000	26.047.868	30%	Capac.	215	114	53%	400.000	228.490
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	786.875.000		786.875.000	342.044.179	43%						
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión			215.800.000	104.000.000	48%	Informes	57	1	2%	3.785.965	104.000.000
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas			571.075.000	238.044.179	42%	Capac.	50	1	2%	11.421.500	238.044.179

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE									NO SE PUEDE OBTENER EL COSTO UNITARIO PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN PORCENTAJE	
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	27.283.827.170	27.283.827.170	9.368.105.356	34%	%	100	31	31%		
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción										
3	2	1	29	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	12.570.048.110	12.570.048.110	2.867.972.810	23%	%	100	23	23%		
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A .Metropolitana Asu.12550-12551/PLR										
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66	%	100	48	48%		
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2										
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	4.608.919.581	4.608.919.581	101.803.182	2%	%	100	2	2%		
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)										
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	1.300.000.000	1.300.000.000	12.510.146	1%	%	100	40	40%		
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)										
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	13.663.137.782	13.663.137.782	10.287.496.587	75%	%	100	40	40%		
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)										
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20%	%	100	10	10%		
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua										
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	1.200.000.000	1.200.000.000	921.853.044	77%	%	100	10	10%		
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas										
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	5.019.313.781	5.019.313.781	1.060.782.815	21%	%	100	45	45%		

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

2. OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (KM, METRO, METRO LINEAL, METRO CUADRADO, METRO CÚBICO).

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2-					OBRAS VIALES EN UNIDAD DE MEDIDA (KM, METRO, METRO LINEAL, METRO CUADRADO, METRO CUBICO).	4.050.949.020.817	4.050.949.021.117	2.225.447.619.815	55%						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos										
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión	83.903.080.518	83.903.080.518	13.630.496.166	16%	Km	300	300	100%	279.676.935	45.434.987
2	2	2			Control de Cursos Hídricos										
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	49.945.057.433	49.945.057.433	49.041.022.326	98%	Metros	1.400	1.000	71%	35.675.041	49.041.022
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales										
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas	535.091.236.008	535.091.236.008	279.091.815.068	52%	KM	148	4.845	3274%	3.615.481.324	57.604.090
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)										
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos	53.735.878.771	53.735.878.771	9.297.057.762	17%	Km	100	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados										
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	248.118.215.219	248.118.215.219	89.039.872.964	36%	Km	24	18	75%	10.338.258.967	4.946.659.609
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa										
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	201.555.841.581	201.555.841.581	72.270.865.277	36%	Km	15	14	93%	13.437.056.105	5.162.204.663
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari-Carapeguá -Quiindy-Caapucu										
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	31.438.660.449	31.438.660.449	15.750.296.726	50%	Km	13	12	92%	2.418.358.496	1.312.524.727
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)										
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	92.028.556.458	92.028.556.458	51.487.977.833	56%	Km	20	14	70%	4.601.427.823	3.677.712.702
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros										
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	474.503.687.799	474.503.687.799	337.413.312.102	71%	Km	65	42	65%	7.300.056.735	8.033.650.288
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	374.092.855.718	374.092.855.717	208.862.759.640	56%						
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		281.193.696.403	166.146.064.527	59%	Km	95	62	65%	2.959.933.646	2.679.775.234
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		8.178.847.075	4.998.705.764	61%	ML	85	45	53%	96.221.730	111.082.350
3	2	1	8	1354	Paso a Dsnivel Construidos		84.720.312.239	37.717.989.349	45%	ML	155	68	44%	546.582.660	554.676.314
Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes															
MTMS															

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.										
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15%	Km	12	0	0%	1.461.938.629	Sin Avance de Producción
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi										
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	120.614.934.655	120.614.934.655	45.565.076.431	38%	Km	100	2	2%	1.206.149.347	22.782.538.216
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km										
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	26.234.067.803	26.234.067.803	10.503.825.054	40%	Km	102	0	0%	257.196.743	Sin Avance de Producción
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)										
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	5.487.000.000	5.487.000.000	1.160.208.991	21%	Km	0	0	0%	No se puede obtener Costo Unitario no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	160.340.530.231	160.340.530.231	136.524.858.286	85%						
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		85.875.690.215	70.266.801.523	82%	Km	27	15	56%	3.180.581.119	4.684.453.435
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		74.464.840.016	66.258.056.763	89%	Km	377	0	0%	197.519.470	Sin Avance de Producción
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry - Luque										
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	15.651.330.684	15.651.330.684	2.486.761.230	16%	Km	12	0	0%	1.304.277.557	Sin Avance de Producción
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial										
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	371.218.380.016	371.218.380.016	274.751.427.581	74%	Km	141	116	82%	2.632.754.468	2.368.546.789
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná										
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	46.726.033.348	46.726.033.348	10.815.087.158	23%	km	7	5	71%	6.675.147.621	2.163.017.432
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi										
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas	44.614.035.927	44.614.035.927	18.656.834.285	42%	Unidades	1	0	0%	44.614.035.927	Sin Avance de Producción
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI										
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	63.840.000.000	63.840.000.000	43.332.149.145	68%	Km	1	0	0%	63.840.000.000	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S _p	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar										
3	2	1	26	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	18.385.875.925	18.385.875.925	140.000.000	1%	Km	1	0	0%	Sin Avance de Producción	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa										
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida	119.224.276.199	119.224.276.199	69.784.761.717	59%	km	6	0	0%	19.870.712.700	Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.049.377.613	176.049.377.914	80.733.085.209	46%						
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		83.227.565.759	54.275.465.018	65%	M2	11.400	6.600	58%	7.300.664	8.223.555
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		92.821.812.155	26.457.620.191	29%	Km	6	0	0%	15.470.302.026	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001										
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	41.375.273.277	41.375.273.277	30.800.879.574	74%	Km	100	8	8%	413.752.733	3.850.109.947
3	2	2	5		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo										
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas	21.000.000.000	21.000.000.000	2.772.475.498	13%	Unidades	3	2	67%	7.000.000.000	1.386.237.749
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú										
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	26.419.671.818	26.419.671.818	26.240.889.306	99%	Km	4	20	500%	6.604.917.955	1.312.044.465
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	236.903.364.380	236.903.364.380	136.186.820.892	57%						
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		5.465.729.581	1.972.177.668	36%	ML	3.720	1.494	40%	1.469.282	1.320.065
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		152.203.104.518	95.440.423.897	63%	Km	13.418	8.944	67%	11.343.203	10.670.888
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		79.234.530.281	38.774.219.327	49%	ML	600	512	85%	132.057.550	75.730.897
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	49.358.178.578	49.358.178.578	37.582.437.307	76%						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	9.370.115.173	55%	ML	378	1.454	385%	45.478.587	6.444.371
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		26.271.351.062	24.947.245.347	95%	Km	102	47	46%	257.562.265	530.792.454
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		5.895.921.454	3.265.076.787	55%	ML	86	105	122%	68.557.226	31.095.969

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3	6	SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	209.887.208.560	209.887.208.560	104.958.570.067	50%						
3	2	3	6	1350 Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		51.903.120.140	32.167.854.538	62%	Km	3.322	2.216	67%	15.624.058	14.516.180
3	2	3	6	1351 Caminos de Todo Tiempo Construidos		120.940.051.774	57.943.338.126	48%	Km	256	103	40%	472.422.077	562.556.681
3	2	3	6	1353 Puentes Construidos		37.044.036.646	14.847.377.403	40%	ML	442	124	28%	83.810.038	119.736.915
3	2	3	9	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes										
3	2	3	9	1353 Puentes Construidos	62.055.455.048	62.055.455.048	29.358.433.126	47%	Km	370	103	28%	167.717.446	285.033.331
3	2	3	10	Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental										
3	2	3	10	1351 Caminos de Todo Tiempo Construidos	52.202.213.500	52.202.213.500	30.781.858.386	59%	Km	63	33	52%	828.606.563	932.783.587
3	3	1	1	SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17%						
3	3	1	1	1344 Obras de Infraestructura Mantenidas		19.923.771.588	3.521.015.669	18%	Unidades	32	14	44%	622.617.862	251.501.119
3	3	1	1	1346 Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.481.708.166	224.153.409	15%	Unidades	4	1	25%	370.427.042	224.153.409

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

3. OBRAS VIALES DONDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PORCENTAJE.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3-					OBRAS VIALES DONDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PORCENTAJE %	352.008.808.665	352.008.808.665	164.689.243.956	47%					NO SE PUEDE OBTENER EL COSTO UNITARIO PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN PORCENTAJE		
3	1	1	1	1	SP Proyecto Acueducto											
3	1	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos	133.459.905.541	133.459.905.541	51.847.390.258	39%	%	100	92			92%
3	1	1	1	2	SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA											
3	1	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado	7.124.048.543	7.124.048.543	1.863.949.060	26%	%	100	17			17%
3	1	1	1	4	SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	81.610.180.251	81.610.180.251	45.794.203.899	56%							
3	1	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		25.004.489.484	6.324.087.706	25%	%	100	23			23%
3	1	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		56.605.690.767	39.470.116.193	70%	%	100	79			79%
3	1	1	1	6	Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción											
3	1	1	1	6	1389	Sistema Alcantarillado Sanitario Mejorado	54.311.450.917	54.311.450.917	22.093.019.646	41%	%	100	87			87%
3	1	1	1	7	Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo											
3	1	1	1	7	1389	Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	24.271.032.458	24.271.032.458	20.479.727.762	84%	%	100	87			87%
3	2	1	1	6	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda Laguna Grande)											
3	2	1	1	6	1326	Sistema de Alcantarillado Sanitario	11.530.693.738	11.530.693.738	9.310.734.146	81%	%	20	14			70%
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	39.701.497.217	39.701.497.217	13.300.219.185	34%							
3	2	2	1	1	1355	Parque Lineales Construidos		23.152.517.367	3.763.734.509	16%	%	100	28			28%
3	2	2	1	1	1356	Comisarias Construidas		7.015.386.489	6.391.657.760	91%	Unidades	1	0			0%
3	2	2	1	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		9.533.593.361	3.144.826.916	33%	%	96	63			66%

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

4. OBRAS VIALES SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
4-					OBRAS VIALES SIN EJECUCIÓN	78.801.842.484	45.301.842.484	0	0%					SIN EJECUCION PRESUPUESTARIA	
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz										
3	2	1	33	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0%	%	100	0	0%		
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales										
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	12.942.160.987	12.942.160.987	0	0%	Km	6	0	0%		
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)										
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	Km	102	0	0%		
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)										
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión	880.444.945	880.444.945	0	0%	Informes	2	0	0%		
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000									
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0%		0	0	0%		
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py										
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	M3	296.000	0	0%		
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATN/OC- 11921-PR										
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	50.000.000	50.000.000	0	0%	%	100	0	0%		
3	2	1	27		Hailitación Tr Remanso Falcon										
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	750.000.000	750.000.000	0	0%	Km	0	0	0%		
3	2	1	83		Ampliación y duplicación de las Rutas 2 y 7										
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	KM	0	0	0%		
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales										
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0	%	100	0	0		
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/ Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0%						
3	3	1	3		Iglesia la Encarnación	1.500.000.000	0	0	0%						

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
EVALUACIÓN DEL COSTO DE OBRAS A CARGO DEL M.O.P.C
DESDE EL AÑO 2006 AL 30/09/2017.

RESUMEN

FECHA		OBRAS	EJECUCIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	Avance	COSTO POR UNIDAD
DEL	AL					
2006	30/09/2017	APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL RIO PILCOMAYO- CANAL LADO PARAGUAYO, AMPLIADO Y ENCAUSADO.	243.038	KM	600	Sin poder determinar el costo unitario
2013	30/09/2017	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10.	828.638	Km	19	43.612
2014	30/09/2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVDA PERÚ - CIUDAD DEL ESTE .	24.565	KM	20	Sin poder determinar el costo unitario
2016	30/09/2017	MEJORAMIENTO DEL MURO DE LA DEFENSA COSTANERA DE ALBERDI.	69.363	KM	1	69.363
2016	30/09/2017	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE FUERTE OLIMPO.	7.589	KM	2	3.794
2016	30/09/2017	CONSTRUCCIÓN AVDA COSTANERA 2DA ETAPA.	135.231	KM	1	135.231
2016	30/09/2017	MEJORAMIENTO DE 151 KM CAPITAN BADO - SANTA ROSA.	243.333	KM	54	4.506

IAF, MH, en millones de guaranies

MTMS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

1. APROVECAMIENTO HÍDRICO DEL RIO PILCOMAYO - CANAL LADO PARAGUAYO, AMPLIADO Y ENCAUSADO.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS AÑOS 2006 A SETIEMBRE DEL 2017										
1	DESCRIPCIÓN				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
		Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	Obras del Pilcomayo	21.246.569.265	0	0%	km	591	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
	Canales terminados según especificaciones técnicas	13.334.719.529	0	0%		90	0	0%		
	Cañadas mantenidas y limpiadas	4.774.473.185	0	0%		200	0	0%		
	Construcción y mantenimiento de caminos	3.137.376.551	0	0%		301	0	0%		
2007	Obras de Ampliación y profundización del canal de aguas del Río Pilcomayo y Gastos Administrativos	23.165.591.667	18.437.593.949	80%	%	100	54	54%	SIN PODER DETERMINAR LA PRODUCCIÓN	
2008		17.896.157.577	15.115.391.661	84%		100	96	96%		
2009		21.613.906.475	17.294.781.535	80%		100	113	113%		
2010		16.575.766.765	10.420.375.957	63%		100	97	97%		
2011		22.708.801.933	17.554.415.503	77%		100	94	94%		
2012		27.599.047.667	27.309.859.067	99%		100	100	100%		
2013		43.953.814.784	37.011.081.755	84%		100	87	87%		
2014		33.572.704.341	19.063.247.360	57%		100	57	57%		
2015		55.967.821.113	47.051.422.039	84%		100	100	100%		
2016	FLUJO HIDRÍCO DEL RIO PILCOMAYO CONSERVADO EN TODA SU EXTENSIÓN	21.997.981.983	20.149.450.651	92%	Km	300	300	100%	73.326.607	67.164.836
SETIEMBRE 2017		83.903.080.518	13.630.496.166	16%		300	300	100%	279.676.935	45.434.987
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES		411.448	243.038	59%	SIN PODER DETERMINAR LA PRODUCCIÓN TOTAL Y EL COSTO					
TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES		73	43	59%						

Fuente: SIAF , TC. Gs. 5.620, en millones los totales

MTMS

Fuente: SIAF , TC. Gs. 5.620, en millones los totales

MTMS

- Desde el Año 2006 al 30/09/2017 con un Presupuesto acumulado de US\$ 73 millones se han Ejecutado Financieramente US\$ 43 millones.
- Año 2006 sin Ejecución Presupuestaria.
- Desde el año 2007 al 2015 se ha ejecutado financieramente US\$. 37 millones donde la meta de producción fue determinada en % que no permite medir, ni comprobar el avance de producción.
- Desde el año 2016 al 30/09/17 fueron Ejecutados Financieramente US\$. 6 millones con una Ejecución Productiva de 600 Km de Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión, con un costo por cada Km US\$10.000.
- El M.O.P.C. MANIFIESTA COMO RESULTADO GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE RIEGOS VINCULADOS A LA COLMATACIÓN.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10.

	OBRAS	EJECUCIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	COSTO POR UNIDAD
	TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES	828.632	KM	221	19	43.612
	TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	147	KM	221	19	8
2013	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10	9.513	KM	3	3	3.171
2014		9.836	Km	4	8	1.230
2015		807.483	KM	112	8	100.935
2016		0	KM	0	0	Sin ejecución Presupuestaria
30/09/2017		1.800	KM	102	0	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF,MH,en millones de guaranies y en millones de dólares al T.C. 5620

MTMS

Esta obra se dio inicio en el año 2013. El M.O.P.C. registra al 30 de setiembre de 2017 que han realizado 19 Km. con un costo por cada Km de G. 43.612 millones, equivalente a USD 8 millones.

3. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PERÚ- CUIDAD DEL ESTE.

Numero	OBRAS	Presupuesto	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Costo por Unidad	
										Meta Inicial	Avance
3	Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú - Ciudad Del Este	113.789.343.636	83.110.561.124	24.564.981.642	30%	Km	4	20	500%	20.777.640.281	Sin Poder determinar el costo unitario
2014	Rutas Pavimentadas Construidas	30.500.000.000	0	0	0%	Km	0	0	0%	Sin Ejecución Productiva	
2015	Rutas Pavimentadas Construidas	30.500.000.000	30.500.000.000	7.486.994.951	25%	Km	0	0	0%		
2016	Rutas Pavimentadas Construidas	26.369.671.818	26.369.671.818	17.077.986.691	65	Km	0	0	0%		
30/09/2017	Rutas Pavimentadas Construidas	26.419.671.818	26.240.889.306	0	0%	Km	4	20	500%	6.560.222.327	Sin Poder determinar el costo unitario

Fuente: SIAF, en millones de guaranies

MTMS

Esta obra se dio inicio en el año 2014, sin meta de producción en los años 2014, 2015 y 2016, con una Ejecución acumulada de G. 24.565 millones.

Recién en el año 2017 muestra una Meta de Producción de 4 Km y una Ejecución Productiva de 500%.,donde muestra que han ejecutado productivamente 20 Km .

Sin embargo no tiene Ejecución Presupuestaria Financiera.

De donde salió el financiamiento de los 20 km ?.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

4. MEJORAMIENTO DEL MURO DE LA DEFENSA CONSTANERA DE ALBERDI – ÑEEMBUCÚ.

Numero	OBRAS	Presupuesto	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Costo por Unidad	
										Meta Inicial	Avance
4	Mejoram. del Muro de la Defensa Costera de Alberdi-Ñeembucú	105.436.991.335	105.436.991.335	69.362.793.482	66%	Unidades	1	1	100%	105.436.991.335	69.362.793.482
2016	Obras de Infraestructuras Mejoradas	60.822.955.408	60.822.955.408	50.705.959.197	83%	Unidades	1	1	100%	60.822.955.408	50.705.959.197
30/09/2017	Obras de Infraestructuras Mejoradas	44.614.035.927	44.614.035.927	18.656.834.285	42%	Unidades	1	0	0%	44.614.035.927	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MTMS

En el año 2016 muestra 1 unidad del muro a construir, se ejecutó el 100%, sin embargo este año 2017 nuevamente se vuelve a presupuestar sin avance de producción.

Teniendo en cuenta la ejecución acumulada del año 2016 al 30 de setiembre de 2017, muestra que el costo del muro es de G. 69,36 mil millones.

5. MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE FUERTE OLIMPO.

Numero	OBRAS	Presupuesto	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Costo por Unidad	
										Meta Inicial	Avance
5	Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	26.000.000.000	26.000.000.000	7.588.922.343	29%	Unidades	3	2	67%	8.666.666.667	3.794.461.172
2016	Obras de Infraestructura Construidas	5.000.000.000	5.000.000.000	4.816.446.845	96%	Unidades	0	0	0%	0	0
30/09/2017	Obras de Infraestructura Construidas	21.000.000.000	21.000.000.000	2.772.475.498	13	Unidades	3	2	67%	7.000.000.000	1.386.237.749

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MTMS

El Resultado que muestra el M.O.P.C. es el de fomentar el turismo y el comercio, así como la presencia del Estado en el Aeropuerto de Fuerte Olimpo.

Muestra acumuladamente una Meta de Producción de 3 (tres) unidades, con un Avance de Producción de 2 (dos) unidades y un costo por unidad de 3,79 mil millones.

Es importante aclarar en qué consiste las 2 (dos) unidades que tuvo el Avance de Producción.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

6. CONSTRUCCIÓN AVENIDA COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA.

Numero	OBRAS	Presupuesto	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Costo por Unidad	
										Meta Inicial	Avance
6	Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	248.175.699.798	248.175.699.798	135.231.376.736	54	KM	106	1	1%	2.341.280.187	135.231.376.736
2015	Pavimentación Asfáltica	52.727.147.400	52.727.147.400	0	0	KM	0	0	0%	Sin Meta de Producción	
2016	Avenida Costanera Construida	76.224.276.199	76.224.276.199	65.446.615.019	86	KM	100	1	1%	762.242.762	65.446.615.019
30/09/2017	Avenida Costanera Construida	119.224.276.199	119.224.276.199	69.784.761.717	59%	KM	6	0	0%	19.870.712.700	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MTMS

Acceso rápido al Microcentro de Asunción mejorado. Aumentando la transitabilidad en menor tiempo. Baja congestión vehicular.

Con una meta de producción acumulada de 106 Km, sin embargo el M.O.P.C.: registró que tuvieron un avance de tan solo 1 Km al 30/09/17, con un costo de G. 135,23 mil millones.

7. MEJORAMIENTO DE 151 KM CAPITAN BADO – SAN ROSA.

Numero	OBRAS	Presupuesto	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Costo por Unidad	
										Meta Inicial	Avance
7	Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	421.677.110.951	421.677.110.951	243.333.423.185	58%	Km	40	54	135%	10.541.927.774	4.506.174.503
2016	Rutas Pavimentadas Construidas	220.121.269.370	220.121.269.370	171.062.557.908	78%	Km	25	40	160%	8.804.850.775	4.276.563.948
30/09/2017	Rutas Pavimentadas Construidas	201.555.841.581	201.555.841.581	72.270.865.277	36%	Km	15	14	93%	13.437.056.105	5.162.204.663

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

MTMS

El M.O.P.C. muestra una Meta Inicial acumulada de 40 km, sin han realizado 54 Km de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del Año 2016 al 30/09/17, lo que indica que cada Km tuvo un costo de G.4, 51 millones.




2. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 892 millones
- PLAN FINANCIERO: US\$ 886 millones
- EJECUTÓ: US\$ 477 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SETIEMBRE 2017

(en Billones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 2,22 BILLONES

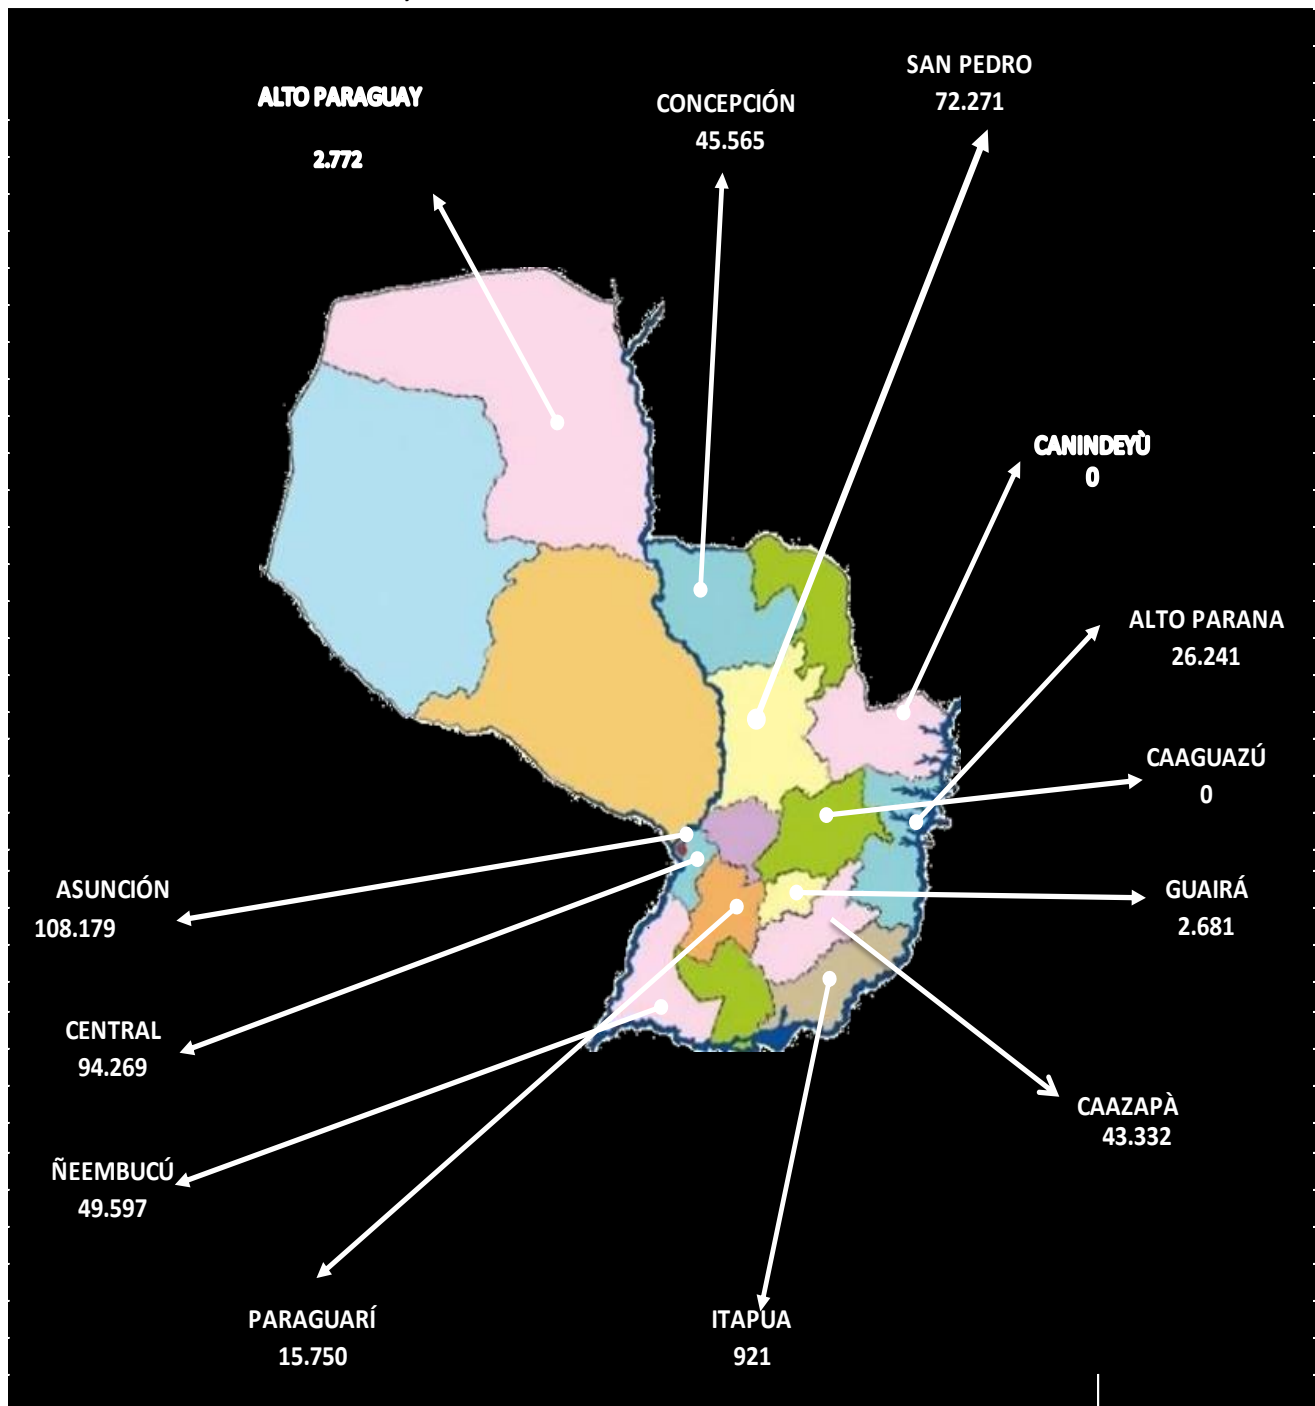





3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	239.507	226.007	108.179	131.328	48%	5%	4%
22 01	CONCEPCION	120.615	120.615	45.565	75.050	38%	2%	2%
22 02	SAN PEDRO	201.556	201.556	72.271	129.285	36%	4%	3%
22 04	GUAIRA	17.543	17.543	2.681	14.862	15%	0%	0%
22 05	CAAGUAZU	10.000	0	0	10.000	0%	0%	0%
22 06	CAAZAPA	63.840	63.840	43.332	20.508	68%	1%	2%
22 07	ITAPUA	1.200	1.200	921	279	77%	0%	0%
22 09	PARAGUARI	31.438	31.438	15.750	15.688	50%	1%	1%
22 10	ALTO PARANA	26.420	26.420	26.241	179	99%	1%	1%
22 11	CENTRAL	180.466	170.376	94.269	86.197	52%	4%	4%
22 12	ÑEEMBUCU	104.375	104.375	49.598	54.777	48%	2%	2%
22 14	CANINDEYU	1.800	1.800	0	1.800	0%	0%	0%
22 16	ALTO PARAGUAY	21.000	21.000	2.772	18.228	13%	0%	0%
99	ALCANCE NACIONAL	3.992.585	3.992.575	2.217.533	1.775.052	56%	80%	83%
TOTAL EN GUARANÍES		5.012.345	4.978.745	2.679.112	2.312.725	53%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		892	886	477	412			

Fuente: SIAF,12/10/17 T.C. 5.620

MTMS

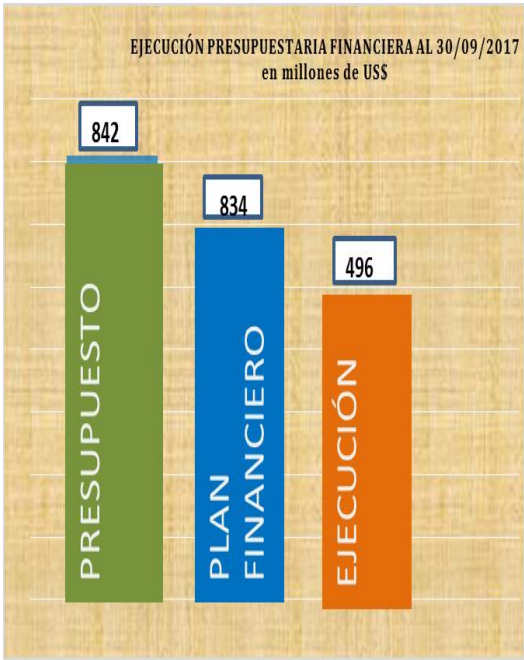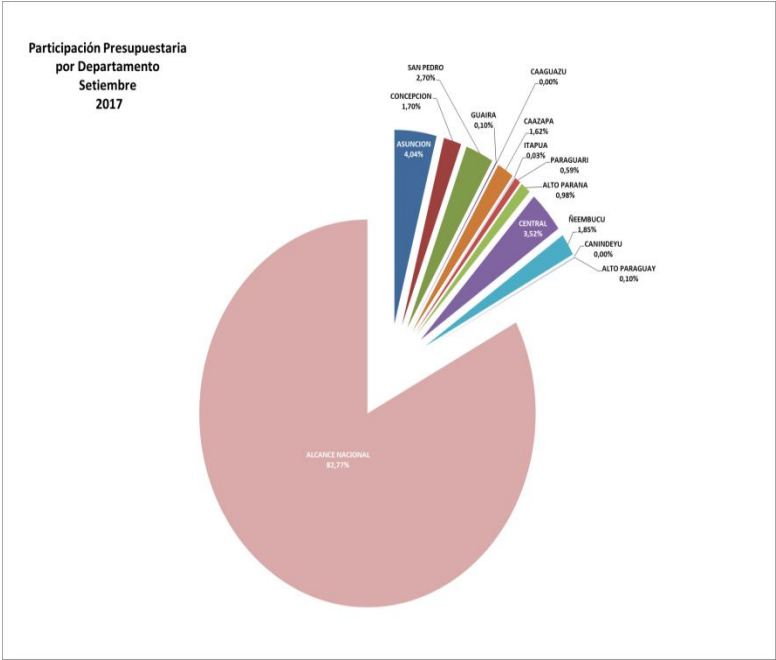

Asunción: Cuenta con un Presupuesto de G. 239,51 mil millones, tuvo una Ejecución Financiera de G. 108,18 mil millones que representa el 48 %.

Región Oriental: con un Presupuesto de G. 998,76 mil millones, equivalente al 20 % de la inversión, donde los Dptos. De Guairá, Caaguazú y Canindeyú tuvieron 0% de Ejecución, indicando que sus Proyectos no fueron ejecutados.

No podemos distinguir por Área Geográfica el 80% de lo Presupuestado y el 83 % de lo Ejecutado.

En las hojas siguientes se muestra el análisis de los Programas desarrollados por Área Geográfica Financiera, Productiva y Costo por Unidad.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DEL M.O.P.C. AL 30/09/2017.

4.1 ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ASUNCION	239.507.272.443	226.007.272.443	108.178.852.566	48%						
SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	39.701.497.217	39.701.497.217	13.300.219.185	34%						
Parque Lineales Construidos		23.152.517.367	3.763.734.509	16%	%	100	28	28%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Comisarias Construidas		7.015.386.489	6.391.657.760	91%	Unidades	1	0	0%	7.015.386.489	Sin Avance de Producción
Muelles Deportivos Construidos		9.533.593.361	3.144.826.916	33%	%	96	63	66%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.867.972.810	23%						
Rutas Pavimentadas Construidas		12.570.048.110	2.867.972.810	23%	KM	10	23	230%	1.257.004.811	124.694.470
Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	119.224.276.199	119.224.276.199	69.784.761.717	59%						
Avenida Costanera Construida		119.224.276.199	69.784.761.717	59%	KM	6	0	0%	19.870.712.700	Sin Avance de Producción
SP elaboración Plan Ord.Terr.Area Metropolitana Asunción 112550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66%						
Rutas Pavimentadas Construidas		200.000.000	132.879.208	66%	KM	100	48	48%	2.000.000	2.768.317
Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%		0	0	0%	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0%		0	0	0%		
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahía de Asunción	54.311.450.917	54.311.450.917	22.093.019.646	41%						
Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		54.311.450.917	22.093.019.646	41%	%	100	87	87%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Se destina presupuestariamente G. 239,51 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria Financiera del 48%, que representa G.108, 18 mil millones. **NO CUENTAN CON AVANCE DE PRODUCCIÓN** los siguientes: Constr. de Avda. Costanera Cent Hist. Y Parque Bicentenario, Const. de Av. Costanera Norte 2ª Etapa, Elaboración Plan Ord. Terr. Área Metropolitana Asunción 112550-12551/PLR

SIN PLAN FINANCIERO: Restauración de Villa Inglesa c/ Ciclovía, Iglesia La Encarnación

4.2 DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CONCEPCIÓN										
SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	120.614.934.655	120.614.934.655	45.565.076.431	38%	Km	100	2	2%	1.206.149.347	22.782.538.216

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Cuenta con un Presupuesto de G. 120,61 mil millones, ejecutando G. 45,57 mil millones, que representa el 38% de su Ejecución Financiera, con un Costo por Km. de G. 22,78 mil millones

4.3 DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SAN PEDRO										
Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado- Santa Rosa	201.555.841.581	201.555.841.581	72.270.865.277	36%	Km	15	14	93%	13.437.056.105	5.162.204.663

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Cuenta con un Presupuesto de G. 201,56 mil millones para el Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado- Santa Rosa, ejecutando G. 72,27 mil millones, que representa el 36% de su Ejecución Financiera, con un Costo por Km de G. 5,16 mil millones. Con una Ejecución Productiva al 30/09/17 del 93%.

4.4 DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GUAIRA										
SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15%	Km	12	0	0%	1.461.938.629	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Cuenta con un Presupuesto de G. 17,54 mil millones, ejecutando 2,68 mil millones equivalente al 15 % de su Ejecución Financiera, **SIN AVANCE DE PRODUCCIÓN**.

4.5 DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CAAGUAZU										
Empedrado San Roque Tr. Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0%		0	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Tiene asignado un Presupuesto Vigente de G. 10 mil millones para Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales, **SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

4.6 DEPARTAMENTO DE CAAZAPÀ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CAAZAPA										
Pav.Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	63.840.000.000	63.840.000.000	43.332.149.145	68%	Km	1	0	0%	63.840.000.000	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Cuenta con un Presupuesto de G. 63,84 mil millones para Rutas Pavimentadas –San Juan Nepomuceno, ejecutando G. 43, 33 mil millones equivalente a 68% a su Ejecución Financiera. **SIN AVANCE DE PRODUCCIÓN.**

4.7 DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ITAPUA										
Construcción Proyecto Itapúa	1.200.000.000	1.200.000.000	921.853.044	0%	%	100	10	10%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Con un Presupuesto asignado de G. 1,20 mil millones para Rutas Pavimentadas –Proyecto Itapúa .**SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.**



4.8 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PARAGUARI										
SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy-Caapucu	31.438.660.449	31.438.660.449	15.750.296.726	50%	Km	13	12	92%	2.418.358.496	1.312.524.727

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Con un Presupuesto destinado de G. 31,44 mil millones para Mejoramiento de las Travesías Urbanas de la ciudad de Paraguarí – Carapeguá- Quiindy – Caacupú,se observa una Ejecución Presupuestaria de 15,75 mil millones, que representa un 50% de su Ejecución Financiera.

4.9 DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ALTO PARANA										
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú- Ciudad del Este	26.419.671.818	26.419.671.818	26.240.889.306	99%	Km	4	20	500%	6.604.917.955	1.312.044.465

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Financieramente cuenta un Presupuesto con G. 26, 42 mil millones para la Ampliación y Mejoramiento de la Avda. Perú – Ciudad del Este ejecutando G. 26,24 mil millones equivalente al 99% de su Ejecución Financiera , muestra una Meta de Producción de 4 Km y una Ejecución Productiva de 20 Km.

4.10 DEPARTAMENTO CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017											
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
CENTRAL	180.465.681.141	170.375.681.141	94.269.026.025	55%							
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	103.559.250.196	103.559.250.196	60.798.711.979	59%							
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	9.310.734.146	81%	%	100	44	44%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
Rutas Pavimentadas Construidas		92.028.556.458	51.487.977.833	56%	Km	20	14	70%	4.601.427.823	3.677.712.702	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	24.271.032.458	24.271.032.458	20.479.727.762	84%							
Sistema de alcantarillado Mejorado		24.271.032.458	20.479.727.762	84%	%	100	87	87%	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
Hailitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0%		0	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria		
SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	26.234.067.803	26.234.067.803	10.503.825.054	40%							
Rutas Pavimentadas Construidas		26.234.067.803	10.503.825.054	40%	Km	102	0	0%	257.196.743	Sin Avance de Producción	
SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry - Luque	15.651.330.684	15.561.330.684	2.486.761.230	0%							
Rutas Pavimentadas Construidas		15.561.330.684	2.486.761.230	16%	Km	12	0	0%	1.296.777.557	Sin Avance de Producción	
Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0%				0%	Sin Plan Financiero y Sin Meta de Producción		

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Se destina presupuestariamente G. 180,47 mil millones, con un Plan Financiero de G. 170,38 mil millones con una Ejecución Financiera de G. 94,27 mil millones equivalente al 55%

4.11 DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ÑEEMBUCU	104.375.185.129	104.375.185.129	49.597.713.859	48%						
Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	44.614.035.927	44.614.035.927	18.656.834.285	42%	Unidades	1	0	0%	44.614.035.927	Sin Avance de Producción
SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	41.375.273.277	41.375.273.277	30.800.879.574	74%						
Estudio de Inversión		0	0	0%	Informes	1	0	0%	Sin Visualizar Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
Rutas Pavimentadas Construidas		35.973.373.277	30.800.879.574	86%	Km	100	8	8%	359.733.733	3.850.109.947
Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0%	Unidades	1	0	0%	No presenta Meta Inicial a la fecha del Informe	
Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	18.385.875.925	18.385.875.925	140.000.000	1%						
Estudio de Inversión		810.000.000	140.000.000	17%	Informes	2	2	100%	405.000.000	70.000.000
Rutas Pavimentadas Construidas		17.575.875.925	0	0%	Km	1	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Con un Presupuesto de G.104, 38 mil millones y con Ejecución Financiera de G.49, 60 mil millones equivalente al 48%, **SIN AVANCE DE PRODUCCIÓN**
El Mejoramiento Tr.Alberdi Pilar –Rutas Pavimentadas construidas SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA a Setiembre de 2017.

4.12 DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CANINDEYU										
SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	Km	102	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes

MTMS

En el Departamento de Canindeyú las Obras Complementarias cuentan con Presupuesto de G 1,80 mil millones. **SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** al 30 de setiembre de 2017.

4.13 DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ALTO PARAGUAY										
Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000	21.000.000.000	2.772.475.498	13%	Unidades	3	2	67%	7.000.000.000	1.386.237.749

Fuente: SIAF al12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS

Cuenta un Presupuesto de G. 21 mil millones, una Ejecución Financiera de 2,77 mil millones, la Meta Inicial presentada es de 3 (tres) Aeropuertos, muestra un Avance de Producción de 2(un) Aeropuerto; cuyo costo por unidad es de 1.386 millones al 30/09/17.



4.14 ALCANCE NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
1	1				Administración General	387.686.622.727	387.676.622.727	224.603.567.768	58						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.676.622.727	224.603.567.768	58	%	100	58	58	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.970.261.234	34.970.261.234	19.928.281.433	57						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	15.924.762.000	63	Subsidios	20.280	8.172	40	1.241.791	1.948.698
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.786.749.234	4.003.519.433	41	Verificación	4.816	2.026	42	2.032.132	1.976.071
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504	2.474.531.504	1.110.352.660	45						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.317.871.868	819.248.123	62	Fiscaliz.	107	74	69	12.316.560	11.070.921
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		637.146.436	229.602.337	36	Certific.	2.400	2.136	89	265.478	107.492
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	61.502.200	12	Certific.	12.700	12.774	101	40.907	4.815
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	83.903.080.518	83.903.080.518	13.630.496.166	16						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		9.683.500.000	325.000.000	3	Informes	5	3	60	1.936.700.000	108.333.333
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		74.219.580.518	13.305.496.166	18	Km	300	300	100	247.398.602	44.351.654
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	49.945.057.433	49.945.057.433	49.041.022.326	98						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo conservado en toda su Extensión		0	0	0	Km	0	0	0		
2	2	2		1332	Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		49.591.557.433	49.041.022.326	99	Metros	1.400	1.000	71	35.422.541	49.041.022
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	2.821.597.844	36						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.865.371.634	550.982.819	30	Unidades	36	26	72	51.815.879	21.191.647
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.137.323.080	1.714.120.948	41	Unidades	19	9	47	217.753.846	190.457.883
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.898.752.387	556.494.077	29	Unidades	41	27	66	46.311.034	20.610.892

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.387.157.749	15.113.078.067	51						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		29.301.157.749	15.087.030.199	51	Operativos	10.330	16.546	160	2.836.511	911.823
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		86.000.000	26.047.868	30	Capac.	215	114	53	400.000	228.490
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	133.459.905.541	133.459.905.541	51.847.390.258	39						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		133.159.905.541	51.847.390.258	39	%	100	92	92	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	1.863.949.060	26						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.287.999.880	316.850.716	25	Informes	3	3	100	429.333.293	105.616.905
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.836.048.663	1.547.098.344	27	%	100	17	17	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	81.610.180.251	81.610.180.251	45.794.203.899	56						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		22.414.327.947	5.632.923.016	25	%	100	23	23		
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		5.180.323.074	1.382.329.380	27	Informes	12	1	8	431.693.590	1.382.329.380
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		54.015.529.230	38.778.951.503	72	%	100	79	79	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	535.091.236.008	535.091.236.008	279.091.815.068	52						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		1.610.000.000	0	0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		30.000.000.000	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		503.481.236.008	279.091.815.068	55	KM	148	4.845	3.274	3.401.900.243	57.604.090

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	53.735.878.771	53.735.878.771	9.297.057.762	17						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.000.000.000	334.381.882	17	%	100	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		1.165.136.122	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		35.343.865.431	8.962.675.880	25	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.925.461.011	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		12.301.416.207	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	248.118.215.219	248.118.215.219	89.039.872.964	36						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		248.118.215.219	89.039.872.964	36	Km	24	18	75	10.338.258.967	4.946.659.609
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	474.503.687.799	474.503.687.799	337.413.312.102	71						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		21.215.664.923	13.952.917.323	66	Informes	5	5	100	4.243.132.985	2.790.583.465
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		453.288.022.876	323.460.394.779	71	Km	65	42	65	6.973.661.890	7.701.437.971
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	374.092.855.718	374.092.855.718	208.862.759.640	56						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	526.320.605	44	Informes	25	25	100	47.487.233	21.052.824
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.797.969.460	165.970.624.325	59	Km	95	62	65	2.955.768.100	2.676.945.554
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		0	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		7.783.120.132	4.823.265.562	62	ML	85	45	53	91.566.119	107.183.679
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		84.324.585.296	37.542.549.148	45	ML	155	68	44	544.029.583	552.096.311
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	0	0						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	0	0	Km	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	5.487.000.000	5.487.000.000	1.160.208.991	21						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.032.000.000	1.160.208.991	23	Km	0	0	0	No se puede obtener Costo Unitario no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	160.340.530.231	160.340.530.231	136.524.858.286	85						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.375.349.057	89	Informes	6	3	50	257.400.000	458.449.686
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		85.103.490.215	69.579.126.994	82	Km	27	15	56	3.151.981.119	4.638.608.466
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		73.692.640.016	65.570.382.235	89	Km	377	0	0	195.471.194	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)	880.444.945	880.444.945	0	0						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		880.444.945	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	371.218.380.016	371.218.380.016	274.751.427.581	74						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		371.218.380.016	274.751.427.581	74	Km	141	116	82	2.632.754.468	2.368.546.789
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	46.726.033.348	46.726.033.348	10.815.087.158	23						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		12.777.278.990	4.208.685.896	33	Informes	3	2		4.259.092.997	2.104.342.948
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		33.948.754.358	6.606.401.262	19	km	7	5	71	4.849.822.051	1.321.280.252
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATNOC- 11921-PR	50.000.000	50.000.000	0	0						
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		50.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	kM	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/IME -12239-PR	786.875.000	786.875.000	342.044.179	43						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		215.800.000	104.000.000	48	Informes	57	1	2	3.785.965	104.000.000
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	238.044.179	42	Capac.	50	1	2	11.421.500	238.044.179
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.283.827.170	27.283.827.170	9.368.105.356	34						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.283.827.170	9.368.105.356	34	%	100	31	31	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0						
3	2	1	33	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.278.015.103	0	0	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	101.803.182	2						
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		4.608.919.581	101.803.182	2	%	100	2	2	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	0	0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0						
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.601.221.449	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.300.000.000	1.300.000.000	12.510.146	1						
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.300.000.000	12.510.146	1	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	10.287.496.587	75						
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		13.663.137.782	10.287.496.587	75	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20						
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.534.103.900	303.468.000	20	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	5.019.313.781	5.019.313.781	1.060.782.815	21						
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		5.019.313.781	1.060.782.815	21	%	100	45	45	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial	
3	2	1	83		Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0						
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.000.000.000	0	0	Km	0	0		Sin ejecución Productiva	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.049.377.613	176.049.377.613	80.733.085.209	46						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		3.457.645.953	159.057.539	5	Informes	4	1	25	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		81.498.742.482	54.195.936.248	66	M2	11.400	6.600	58	7.149.012	8.211.505
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		91.092.989.178	26.378.091.422	29	Km	6	0	0	15.182.164.863	Sin Avance de Producción
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		19.000.000.000	0	0	M3	296.000	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	30		Reparación,rehabilitación del Muro de Pilar	0	0	0	0						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	1	0	0		
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	236.903.364.380	236.903.364.380	136.186.820.892	57						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		13.042.230.245	3.200.422.631	25	Informes	37	16	43	352.492.709	200.026.414
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.494	40	312.310	613.145
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		147.768.746.235	94.352.280.202	64	Km	13.418	8.944	67	11.012.725	10.549.226
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		74.930.594.300	37.718.079.859	50	ML	600	512	85	124.884.324	73.668.125
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	49.358.178.578	49.358.178.578	37.582.437.307	76						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	9.370.115.173	55	ML	378	1.454	385	45.478.587	6.444.371
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		26.271.351.062	24.947.245.347	95	Km	102	47	46	257.562.265	530.792.454
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		5.895.921.454	3.265.076.787	55	ML	86	105	122	68.557.226	31.095.969
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	209.887.208.560	209.887.208.560	104.958.570.067	50						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		10.685.945.521	2.973.760.870	28	Informes	34	18	53	314.292.515	165.208.937
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		48.376.758.118	31.186.513.451	64	Km	3.322	2.216	67	14.562.540	14.073.336
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		117.306.830.297	56.932.259.430	49	Km	256	103	40	458.229.806	552.740.383
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		33.517.674.624	13.866.036.316	41	ML	442	124	28	75.831.843	111.822.874
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	62.055.455.048	62.055.455.048	29.358.433.126	47						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		62.055.455.048	29.358.433.126	47	Km	370	103	28	167.717.446	285.033.331
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	52.202.213.500	52.202.213.500	30.781.858.386	59						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		52.202.213.500	30.781.858.386	59	Km	63	33	52	828.606.563	932.783.587
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	316.306.817	73	Informes	1	1	100	430.500.000	Sin Avance de Producción
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Mantenidas		19.708.521.588	3.362.862.261	17	Unidades	32	14	44	615.891.300	240.204.447
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	66.000.000	5	Unidades	4	1	25	316.614.542	66.000.000

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5.012.345.917.605	4.978.835.917.605	2.679.112.656.870	54						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	387.686.622.727	387.676.622.727	224.603.567.768	58						
1	1				Administración General	387.686.622.727	387.676.622.727	224.603.567.768	58						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.676.622.727	224.603.567.768	58	%	100	58	58	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	208.581.535.539	208.581.535.539	101.644.828.496	49						
2	1				Competitividad e Innovación	37.444.792.738	37.444.792.738	21.038.634.093	56						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.970.261.234	34.970.261.234	19.928.281.433	57						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	15.924.762.000	63	Subsidios	20.280	8.172	40	1.241.791	1.948.698
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.786.749.234	4.003.519.433	41	Verificación	4.816	2.026	42	2.032.132	1.976.071
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504	2.474.531.504	1.110.352.660	45						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.317.871.868	819.248.123	62	Fiscaliz.	107	74	69	12.316.560	11.070.921
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		637.146.436	229.602.337	36	Certific.	2.400	2.136	89	265.478	107.492
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	61.502.200	12	Certific.	12.700	12.774	101	40.907	4.815
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	133.848.137.951	133.848.137.951	62.671.518.492	47						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	83.903.080.518	83.903.080.518	13.630.496.166	16						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		9.683.500.000	325.000.000	3	Informes	5	3	60	1.936.700.000	108.333.333
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		74.219.580.518	13.305.496.166	18	Km	300	300	100	247.398.602	44.351.654

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	49.945.057.433	49.945.057.433	49.041.022.326	98						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo conservado en toda su Extensión		0	0	0	Km	0	0	0		
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		49.591.557.433	49.041.022.326	99	Metros	1.400	1.000	71	35.422.541	49.041.022
2	3				Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.901.447.101	2.821.597.844	36						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	2.821.597.844	36						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.865.371.634	550.982.819	30	Unidades	36	26	72	51.815.879	21.191.647
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.137.323.080	1.714.120.948	41	Unidades	19	9	47	217.753.846	190.457.883
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.898.752.387	556.494.077	29	Unidades	41	27	66	46.311.034	20.610.892
2	4				Servicios Sociales de Calidad	29.387.157.749	29.387.157.749	15.113.078.067	51						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.387.157.749	15.113.078.067	51						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		29.301.157.749	15.087.030.199	51	Operativos	10.330	16.546	160	2.836.511	911.823
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		86.000.000	26.047.868	30	Capac.	215	114	53	400.000	228.490
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.416.077.759.339	4.382.577.759.339	2.352.864.260.606	54						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	300.776.617.710	300.776.617.710	142.078.290.625	47						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	300.776.617.710	300.776.617.710	142.078.290.625	47						

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	133.459.905.541	133.459.905.541	51.847.390.258	39						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		133.159.905.541	51.847.390.258	39	%	100	92	92	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	1.863.949.060	26						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.287.999.880	316.850.716	25	Informes	3	3	100	429.333.293	105.616.905
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.836.048.663	1.547.098.344	27	%	100	17	17	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	81.610.180.251	81.610.180.251	45.794.203.899	56						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		22.414.327.947	5.632.923.016	25	%	100	23	23		
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		5.180.323.074	1.382.329.380	27	Informes	12	1	8	431.693.590	1.382.329.380
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		54.015.529.230	38.778.951.503	72	%	100	79	79	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	54.311.450.917	54.311.450.917	22.093.019.646	41						
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		54.311.450.917	22.093.019.646	41	%	100	87	87		
3	1	1	6	1390	Sistemmas de Residuos Sólidos Instalados		0	0	0	%	100	0	0		
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	24.271.032.458	24.271.032.458	20.479.727.762	84						
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		24.271.032.458	20.479.727.762	84	%	100	85	85		

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2				Competitividad e Innovación	4.080.395.661.875	4.060.395.661.875	2.207.040.800.903	54						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	3.017.219.145.685	3.007.219.145.685	1.644.540.370.636	55						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	535.091.236.008	535.091.236.008	279.091.815.068	52						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		1.610.000.000	0	0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		30.000.000.000	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		503.481.236.008	279.091.815.068	55	KM	148	4.845	3.274	3.401.900.243	57.604.090
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	53.735.878.771	53.735.878.771	9.297.057.762	17						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.000.000.000	334.381.882	17	%	100	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		1.165.136.122	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		35.343.865.431	8.962.675.880	25	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.925.461.011	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		12.301.416.207	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	248.118.215.219	248.118.215.219	89.039.872.964	36						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		248.118.215.219	89.039.872.964	36	Km	24	18	75	10.338.258.967	4.946.659.609
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	201.555.841.581	201.555.841.581	72.270.865.277	36						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		201.555.841.581	72.270.865.277	36	Km	15	14	93	13.437.056.105	5.162.204.663
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari-Carapeguá -Quiindy-Caapucu	31.438.660.449	31.438.660.449	15.750.296.726	50						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		31.438.660.449	15.750.296.726	50	Km	13	12	92	2.418.358.496	1.312.524.727

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	103.559.250.196	103.559.250.196	60.798.711.979	59						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	9.310.734.146	81	%	100	44	44	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		92.028.556.458	51.487.977.833	56	Km	20	14	70	4.601.427.823	3.677.712.702
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	474.503.687.799	474.503.687.799	337.413.312.102	71						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		21.215.664.923	13.952.917.323	66	Informes	5	5	100	4.243.132.985	2.790.583.465
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		453.288.022.876	323.460.394.779	71	Km	65	42	65	6.973.661.890	7.701.437.971
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	374.092.855.718	374.092.855.718	208.862.759.640	56						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	526.320.605	44	Informes	25	25	100	47.487.233	21.052.824
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.797.969.460	165.970.624.325	59	Km	95	62	65	2.955.768.100	2.676.945.554
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		0	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		7.783.120.132	4.823.265.562	62	ML	85	45	53	91.566.119	107.183.679
3	2	1	8	1354	Paso a Densivel Construidos		84.324.585.296	37.542.549.148	45	ML	155	68	44	544.029.583	552.096.311
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	0	0						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	0	0	Km	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.543.263.547	2.680.535.630	15	Km	12	0	0	1.461.938.629	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	120.614.934.655	120.614.934.655	45.565.076.431	38						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		120.614.934.655	45.565.076.431	38	Km	100	2	2	1.206.149.347	22.782.538.216
				1358	Avenida Costanera Construida		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	26.234.067.803	26.234.067.803	10.503.825.054	40						
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.234.067.803	10.503.825.054	40	Km	102	0	0	257.196.743	Sin Avance de Producción
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.800.000.000	0	0	Km	102	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	5.487.000.000	5.487.000.000	1.160.208.991	21						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.032.000.000	1.160.208.991	23	Km	0	0	0	No se puede obtener Costo Unitario no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	160.340.530.231	160.340.530.231	136.524.858.286	85						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.375.349.057	89	Informes	6	3	50	257.400.000	458.449.686
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		85.103.490.215	69.579.126.994	82	Km	27	15	56	3.151.981.119	4.638.608.466
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		73.692.640.016	65.570.382.235	89	Km	377	0	0	195.471.194	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. E/ Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)	880.444.945	880.444.945	0	0						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		880.444.945	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry - Luque	15.651.330.684	15.651.330.684	2.486.761.230	16						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.651.330.684	2.486.761.230	16	Km	12	0	0	1.304.277.557	Sin Avance de Producción
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	371.218.380.016	371.218.380.016	274.751.427.581	74						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		371.218.380.016	274.751.427.581	74	Km	141	116	82	2.632.754.468	2.368.546.789
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	46.726.033.348	46.726.033.348	10.815.087.158	23						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		12.777.278.990	4.208.685.896	33	Informes	3	2	67	4.259.092.997	2.104.342.948
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		33.948.754.358	6.606.401.262	19	km	7	5	71	4.849.822.051	1.321.280.252
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATN/OC- 11921-PR	50.000.000	50.000.000	0	0						
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		50.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	kM	0	0	0		
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	786.875.000	786.875.000	342.044.179	43						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		215.800.000	104.000.000	48	Informes	57	1	2	3.785.965	104.000.000
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	238.044.179	42	Capac.	50	1	2	11.421.500	238.044.179
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000								Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	44.614.035.927	44.614.035.927	18.656.834.285	42						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		44.614.035.927	18.656.834.285	42	Unidades	1	0	0	44.614.035.927	Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.283.827.170	27.283.827.170	9.368.105.356	34						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.283.827.170	9.368.105.356	34	%	100	31	31	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	63.840.000.000	63.840.000.000	43.332.149.145	68						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		63.840.000.000	43.332.149.145	68	Km	1	0	0	63.840.000.000	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	18.385.875.925	18.385.875.925	140.000.000	1						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	140.000.000	17	Informes	2	2	100	405.000.000	70.000.000
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.575.875.925	0	0	Km	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	27		Hailitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0						
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.867.972.810	23						
3	2	1	29	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		12.570.048.110	2.867.972.810	23	%	100	23	23	125.700.481	124.694.470
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A .Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66						
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		200.000.000	132.879.208	66	%	100	48	48	2.000.000	2.768.317
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0						
3	2	1	33	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.278.015.103	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	101.803.182	2						
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		4.608.919.581	101.803.182	2	%	100	2	2	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	0	0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0						
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.601.221.449	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.300.000.000	1.300.000.000	12.510.146	1						
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.300.000.000	12.510.146	1	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	10.287.496.587	75						
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		13.663.137.782	10.287.496.587	75	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20						
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.534.103.900	303.468.000	20	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	921.853.044	77						
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.200.000.000	921.853.044	77	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	5.019.313.781	5.019.313.781	1.060.782.815	21						
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		5.019.313.781	1.060.782.815	21	%	100	45	45	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	43		Hab. De La red Vial Pav. EN COR,PAR,GAAG,CAAZ		0	0	0		0	0	0		
3	2	1	43	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	44		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de San Pedro		0	0	0						
3	2	1	44	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	45		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de Villeta,Alberdi		0	0	0						
3	2	1	45	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	46		Habilitacion Red Vial Pav. Misiones e Itapúa		0	0	0						
3	2	1	46	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	46	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	47		Habilitacion Red Vial Pav. Dptos San Pedro,Caag. Y Canind		0	0	0						
3	2	1	47	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	47	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	47	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	83		Ampliación y duplicación de las Rutas 2 y 7	5.000.000.000		5.000.000.000	0	0						
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas			5.000.000.000	0	0	KM	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	452.770.096.124		442.770.096.124	223.632.310.489	51						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	39.701.497.217		39.701.497.217	13.300.219.185	34						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión			2.149.100.000	1.389.648.730	65	Informes	4	0	0	537.275.000	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos			22.443.314.367	3.305.150.428	15	%	100	28	28	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas			6.306.183.489	5.933.073.679	94	Unidades	1	0	0	6.306.183.489	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos			8.802.899.361	2.672.346.348	30	%	96	63	66	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	119.224.276.199		119.224.276.199	69.784.761.717	59						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida			119.224.276.199	69.784.761.717	59	km	6	0	0	19.870.712.700	Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.049.377.613		176.049.377.613	80.733.085.209	46						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión			3.457.645.953	159.057.539	5	Informes	4	1	25	864.411.488	159.057.539
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas			81.498.742.482	54.195.936.248	66	M2	11.400	6.600	58	7.149.012	8.211.505
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido			91.092.989.178	26.378.091.422	29	Km	6	0	0	15.182.164.863	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	41.375.273.277		41.375.273.277	30.800.879.574	74						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión			0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas			35.973.373.277	30.800.879.574	86	Km	100	8	8	359.733.733	3.850.109.947
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas			5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	5		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000		21.000.000.000	2.772.475.498	13						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas			21.000.000.000	2.772.475.498	13	Unidades	3	2	67	7.000.000.000	1.386.237.749
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	26.419.671.818		26.419.671.818	26.240.889.306	99						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas			26.419.671.818	26.240.889.306	99	Km	4	20	500	6.604.917.955	Sin Avance de Producción
3	2	2	17	1345	Obras de Infraestructura Construidas			0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000		0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	19.000.000.000		19.000.000.000	0	0						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegalidad del Río Paraguay			19.000.000.000	0	0	M3	296.000	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	30		Reparación,rehabilitación del Muro de Pilar			0	0	0						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas			0	0	0	Unidades	1	0	0		
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	610.406.420.066		610.406.420.066	338.868.119.778	56						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	236.903.364.380		236.903.364.380	136.186.820.892	57						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión			13.042.230.245	3.200.422.631	25	Informes	37	16	43	352.492.709	200.026.414
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas			1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.494	40	312.310	613.145
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas			0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos			147.768.746.235	94.352.280.202	64	Km	13.418	8.944	67	11.012.725	10.549.226
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos			74.930.594.300	37.718.079.859	50	ML	600	512	85	124.884.324	73.668.125

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	49.358.178.578	49.358.178.578	37.582.437.307	76						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	9.370.115.173	55	ML	378	1.454	385	45.478.587	6.444.371
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		26.271.351.062	24.947.245.347	95	Km	102	47	46	257.562.265	530.792.454
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		5.895.921.454	3.265.076.787	55	ML	86	105	122	68.557.226	31.095.969
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	209.887.208.560	209.887.208.560	104.958.570.067	50						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		10.685.945.521	2.973.760.870	28	Informes	34	18	53	314.292.515	165.208.937
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		48.376.758.118	31.186.513.451	64	Km	3.322	2.216	67	14.562.540	14.073.336
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		117.306.830.297	56.932.259.430	49	Km	256	103	40	458.229.806	552.740.383
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		33.517.674.624	13.866.036.316	41	ML	442	124	28	75.831.843	111.822.874
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	62.055.455.048	62.055.455.048	29.358.433.126	47						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		62.055.455.048	29.358.433.126	47	Km	370	103	28	167.717.446	285.033.331
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	52.202.213.500	52.202.213.500	30.781.858.386	59						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		52.202.213.500	30.781.858.386	59	Km	63	33	52	828.606.563	932.783.587
3	2	3	11		Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Región Oriental		0	0	0						
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	34.905.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	34.905.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	316.306.817	73	Informes	1	1	100	430.500.000	Sin Avance de Producción
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Mantenidas		19.708.521.588	3.362.862.261	17	Unidades	32	14	44	615.891.300	240.204.447
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	66.000.000	5	Unidades	4	1	25	316.614.542	66.000.000
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS
