



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP


Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

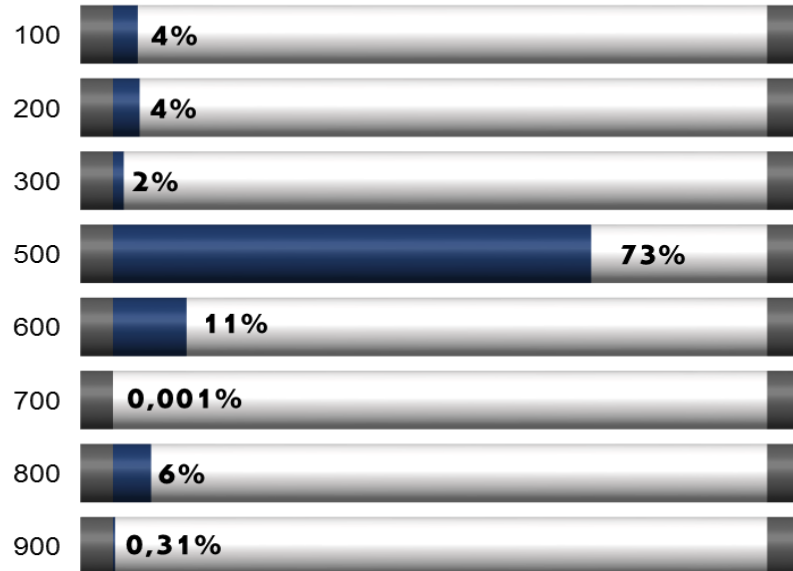


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	265.014.478.103	263.252.478.103	170.880.738.914	65%
200 Servicios No Personales	285.230.356.495	267.614.622.750	136.142.492.448	51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	115.641.566.370	115.541.566.370	54.957.749.757	48%
500 Inversión Física	5.117.894.714.771	4.288.098.290.967	2.929.476.083.086	68%
600 Inversión Financiera	787.857.743.325	787.857.743.325	755.268.011.076	96%
700 Servicio de la Deuda Pública	59.428.734	0	0	0%
800 Transferencias	407.600.683.696	404.010.105.148	274.564.092.188	68%
900 Otros Gastos	21.708.910.648	21.708.910.648	17.078.382.819	79%
TOTAL ENTIDAD	7.001.007.882.142	6.148.083.717.311	4.338.367.550.288	71%


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

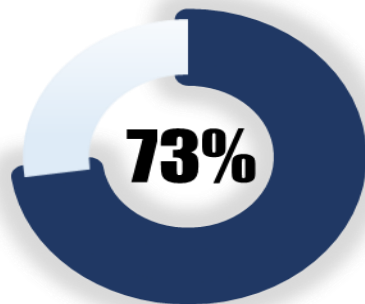


Presupuesto: ₡ 254.043.893.992
Ejecutado: ₡ 184.733.127.725

Recursos del Crédito Público

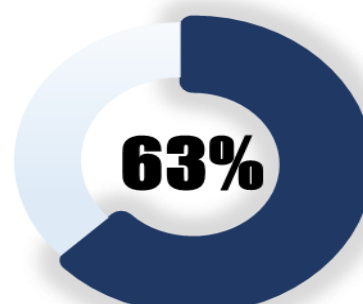

Presupuesto: ₡ 5.874.338.855.338
Ejecutado: ₡ 3.688.843.589.802

Recursos Institucionales

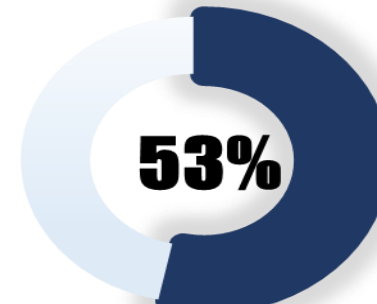

Presupuesto: ₡ 872.625.132.812
Ejecutado: ₡ 464.790.832.761

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.970.664.977.908	1.967.541.591.592	1.497.417.727.245	76%	1.435.761.054.027	61.656.673.218
01	Gestión Administrativa Financiera	380.432.138.054	380.432.138.054	245.398.159.417	65%	209.553.187.861	35.844.971.556
100 Servicios Personales		191.999.301.423	191.999.301.423	131.493.047.055	68%	108.562.014.550	22.931.032.505
200 Servicios No Personales		99.937.058.368	99.937.058.368	59.169.777.091	59%	46.504.982.603	12.664.794.488
300 Bienes de Consumo e Insumos		51.653.430.629	51.653.430.629	37.047.044.273	72%	36.877.477.016	169.567.257
500 Inversión Física		20.683.237.634	20.683.237.634	6.117.435.000	30%	6.117.435.000	0
900 Otros Gastos		16.159.110.000	16.159.110.000	11.570.855.998	72%	11.491.278.692	79.577.306
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	271.192.507.049	271.192.507.049	211.276.585.830	78%	199.922.822.948	11.353.762.882
800 Transferencias		271.192.507.049	271.192.507.049	211.276.585.830	78%	199.922.822.948	11.353.762.882

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	7.075.677.627	7.075.677.627	3.343.307.177	47%	2.990.676.507	352.630.670
100 Servicios Personales		5.762.046.911	5.762.046.911	3.227.794.626	56%	2.914.815.966	312.978.660
200 Servicios No Personales		444.059.514	444.059.514	46.460.941	10%	26.385.941	20.075.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		138.987.010	138.987.010	69.051.610	50%	49.474.600	19.577.010
500 Inversión Física		690.584.192	690.584.192	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	4.000.000.000	4.000.000.000	1.455.889.247	36%	1.250.049.068	205.840.179
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	626.318.747	32%	547.506.579	78.812.168
200 Servicios No Personales		1.067.000.000	1.067.000.000	755.434.500	71%	635.742.489	119.692.011
300 Bienes de Consumo e Insumos		192.335.852	192.335.852	57.336.000	30%	50.000.000	7.336.000
500 Inversión Física		463.297.692	463.297.692	16.800.000	4%	16.800.000	0
800 Transferencias		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	54.042.852.627	54.042.852.627	30.045.875.300	56%	24.254.872.791	5.791.002.509
100 Servicios Personales		40.546.870.481	40.546.870.481	26.571.251.094	66%	21.645.995.556	4.925.255.538
200 Servicios No Personales		5.196.769.532	5.196.769.532	513.685.300	10%	262.418.072	251.267.228
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.182.192.000	4.182.192.000	2.828.952.906	68%	2.317.659.163	511.293.743
500 Inversión Física		3.774.746.787	3.774.746.787	111.615.000	3%	28.800.000	82.815.000
800 Transferencias		310.000.000	310.000.000	20.371.000	7%	0	20.371.000
900 Otros Gastos		32.273.827	32.273.827	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	3.088.000.000	3.088.000.000	951.531.711	31%	859.840.128	91.691.583
100 Servicios Personales		1.897.000.000	1.897.000.000	495.750.885	26%	424.024.800	71.726.085
200 Servicios No Personales		941.000.000	941.000.000	455.780.826	48%	435.815.328	19.965.498
500 Inversión Física		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	1.902.000.000	1.902.000.000	60.469.672	3%	56.076.488	4.393.184
200 Servicios No Personales		645.000.000	645.000.000	60.469.672	9%	56.076.488	4.393.184
300 Bienes de Consumo e Insumos		230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.027.000.000	1.027.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.307.875.593	1.307.875.593	499.434.459	38%	474.892.592	24.541.867
200 Servicios No Personales		1.307.875.593	1.307.875.593	499.434.459	38%	474.892.592	24.541.867
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	31.167.306.530	31.167.306.530	30.136.161.603	97%	28.013.511.347	2.122.650.256
200 Servicios No Personales		285.000.000	285.000.000	218.045.073	77%	111.010.875	107.034.198
300 Bienes de Consumo e Insumos		78.290.000	78.290.000	14.100.000	18%	0	14.100.000
500 Inversión Física		30.104.016.530	30.104.016.530	29.204.016.530	97%	27.902.500.472	1.301.516.058
800 Transferencias		700.000.000	700.000.000	700.000.000	100%	0	700.000.000
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	26.130.110.110	26.130.110.110	18.581.031.600	71%	18.581.031.600	0
200 Servicios No Personales		1.615.686.400	1.615.686.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.514.423.710	24.514.423.710	18.581.031.600	76%	18.581.031.600	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	20.357.126.314	20.357.126.314	18.299.870.844	90%	18.299.870.844	0
500 Inversión Física		20.357.126.314	20.357.126.314	18.299.870.844	90%	18.299.870.844	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	38.871.822.162	38.871.822.162	20.932.085.660	54%	20.099.617.989	832.467.671
100 Servicios Personales		246.340.000	246.340.000	163.676.425	66%	143.204.600	20.471.825
500 Inversión Física		37.249.945.301	37.249.945.301	19.853.174.945	53%	19.074.033.899	779.141.046
800 Transferencias		1.375.536.861	1.375.536.861	915.234.290	67%	882.379.490	32.854.800
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif	229.500.000	229.500.000	100.500.000	44%	0	100.500.000
800 Transferencias		229.500.000	229.500.000	100.500.000	44%	0	100.500.000
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	1.337.157.479	0
500 Inversión Física		6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	1.337.157.479	0
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
500 Inversión Física		19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	33.510.888.374	33.510.888.374	19.993.735.724	60%	19.993.735.724	0
500 Inversión Física		33.510.888.374	33.510.888.374	19.993.735.724	60%	19.993.735.724	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	29.462.477.881	26.339.091.566	15.774.082.437	60%	15.630.682.437	143.400.000
100 Servicios Personales		2.925.476.770	2.925.476.770	1.405.200.000	48%	1.261.800.000	143.400.000
200 Servicios No Personales		269.500.000	86.459.500	56.210.000	65%	56.210.000	0
500 Inversión Física		26.267.501.111	23.327.155.296	14.312.672.437	61%	14.312.672.437	0
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	3.250.000.000	3.250.000.000	500.000.000	15%	0	500.000.000
200 Servicios No Personales		2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		500.000.000	500.000.000	500.000.000	100%	0	500.000.000
24	Construcción de la Franja Costera Sur	34.106.214.501	34.106.214.501	8.048.472.052	24%	5.496.378.872	2.552.093.180
200 Servicios No Personales		3.749.415.936	3.749.415.936	822.519.237	22%	292.056.122	530.463.115
500 Inversión Física		22.268.165.553	22.268.165.553	7.213.677.274	32%	5.192.047.209	2.021.630.065
800 Transferencias		8.088.633.012	8.088.633.012	12.275.541	0,15%	12.275.541	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	360.455.899.290	360.455.899.290	358.289.586.972	99%	358.289.586.972	0
500 Inversión Física		360.455.899.290	360.455.899.290	358.289.586.972	99%	358.289.586.972	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	258.489.932.037	258.489.932.037	244.510.179.335	95%	244.221.367.458	288.811.877
200 Servicios No Personales		1.286.129	1.286.129	0	0%	0	0
500 Inversión Física		258.488.645.908	258.488.645.908	244.510.179.335	95%	244.221.367.458	288.811.877
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	67.253.309.353	67.253.309.353	28.333.249.780	42%	28.333.249.780	0
500 Inversión Física		61.188.699.364	61.188.699.364	28.333.249.780	46%	28.333.249.780	0
800 Transferencias		6.064.609.989	6.064.609.989	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	59.306.841.342	59.306.841.341	31.405.009.580	53%	31.405.009.580	0
500 Inversión Física		59.306.841.342	59.306.841.341	31.405.009.580	53%	31.405.009.580	0
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	85.335.827.036	85.335.827.036	68.345.346.607	80%	68.345.346.607	0
500 Inversión Física		85.335.827.036	85.335.827.036	68.345.346.607	80%	68.345.346.607	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	32.283.778.168	32.283.778.168	23.224.409.725	72%	22.395.549.065	828.860.660
500 Inversión Física		32.283.778.168	32.283.778.168	23.224.409.725	72%	22.395.549.065	828.860.660

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
34	SP Const de Autopista Ñu Guazu Asunción- Luque 6,30KM	2.423.492.331	2.423.492.331	2.423.492.331	100%	2.423.492.331	0
500 Inversión Física		207.975.166	207.975.166	207.975.166	100%	207.975.166	0
900 Otros Gastos		2.215.517.165	2.215.517.165	2.215.517.165	100%	2.215.517.165	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	48.979.166.251	48.979.166.251	7.483.858.633	15%	6.864.803.489	619.055.144
100 Servicios Personales		3.537.700.000	3.537.700.000	1.900.276.666	54%	1.588.193.333	312.083.333
200 Servicios No Personales		8.693.818.910	8.693.818.910	2.825.446.175	32%	2.518.474.364	306.971.811
500 Inversión Física		32.850.998.777	32.850.998.777	2.160.147.854	7%	2.160.147.854	0
800 Transferencias		3.896.648.564	3.896.648.564	597.987.938	15%	597.987.938	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	34.364.575.486	34.364.575.486	34.364.575.486	100%	34.364.575.486	0
500 Inversión Física		34.364.575.486	34.364.575.486	34.364.575.486	100%	34.364.575.486	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	35.778.078.039	35.778.078.039	34.822.542.868	97%	34.822.542.868	0
500 Inversión Física		35.778.078.039	35.778.078.039	34.822.542.868	97%	34.822.542.868	0
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
500 Inversión Física		1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
500 Inversión Física		18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
SUBTOTAL		1.970.664.977.908	1.967.541.591.592	1.497.417.727.245	76%	1.435.761.054.027	61.656.673.218

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.397.847.760.505	3.644.449.023.847	2.476.440.137.131	68%	2.120.329.632.619	356.110.504.512
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	4.079.051.769	3.719.051.769	140.800.000	4%	123.200.000	17.600.000
100 Servicios Personales		232.320.000	232.320.000	140.800.000	61%	123.200.000	17.600.000
200 Servicios No Personales		2.625.250.714	2.265.250.714	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.221.481.055	1.221.481.055	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	94.374.027.339	94.374.027.339	87.853.026.651	93%	87.853.026.651	0
100 Servicios Personales		1.515.205.174	1.515.205.174	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.416.166.013	2.416.166.013	1.373.871.834	57%	1.373.871.834	0
500 Inversión Física		90.335.156.152	90.335.156.152	86.479.154.817	96%	86.479.154.817	0
800 Transferencias		107.500.000	107.500.000	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	35.730.423.492	32.414.910.239	11.548.167.753	36%	8.240.001.919	3.308.165.834
200 Servicios No Personales		213.256.071	207.174.273	42.000.000	20%	42.000.000	0
500 Inversión Física		35.517.167.421	32.207.735.966	11.506.167.753	36%	8.198.001.919	3.308.165.834

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	141.110.170.688	141.110.170.688	110.279.871.331	78%	107.599.013.815	2.680.857.516
200 Servicios No Personales		64.816.209	64.816.209	31.533.713	49%	31.533.713	0
500 Inversión Física		141.045.354.479	141.045.354.479	110.248.337.618	78%	107.567.480.102	2.680.857.516
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	65.803.500.000	65.803.500.000	36.137.035.081	55%	25.374.750.932	10.762.284.149
200 Servicios No Personales		6.500.000.000	6.500.000.000	2.745.215.862	42%	2.745.215.862	0
500 Inversión Física		59.303.500.000	59.303.500.000	33.391.819.219	56%	22.629.535.070	10.762.284.149
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	188.984.680.897	135.077.372.408	86.082.513.058	64%	84.919.726.386	1.162.786.672
100 Servicios Personales		1.148.490.024	1.148.490.024	489.780.016	43%	428.557.514	61.222.502
200 Servicios No Personales		2.366.368.383	1.466.447.560	313.833.917	21%	285.191.635	28.642.282
500 Inversión Física		185.469.822.490	132.462.434.824	85.278.899.125	64%	84.205.977.237	1.072.921.888
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	67.770.373.609	65.021.943.828	63.537.520.211	98%	61.448.347.816	2.089.172.395
200 Servicios No Personales		4.333.226.067	2.578.736.308	2.088.806.764	81%	1.628.881.440	459.925.324
500 Inversión Física		63.437.147.542	62.443.207.520	61.448.713.447	98%	59.819.466.376	1.629.247.071

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	75.522.608.390	15.633.180.723	10.533.486.093	67%	9.757.184.658	776.301.435
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		34.409.586	34.409.586	7.938.336	23%	6.172.734	1.765.602
500 Inversión Física		74.708.198.804	14.818.771.137	10.525.547.757	71%	9.751.011.924	774.535.833
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	14.375.062.413	10.057.139.175	8.836.963.208	88%	7.140.311.621	1.696.651.587
500 Inversión Física		14.375.062.413	10.057.139.175	8.836.963.208	88%	7.140.311.621	1.696.651.587
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	15.143.183.040	15.143.183.040	9.808.821.383	65%	6.851.107.004	2.957.714.379
100 Servicios Personales		699.600.000	699.600.000	466.400.000	67%	408.100.000	58.300.000
200 Servicios No Personales		2.056.574.262	2.056.574.262	1.743.333.914	85%	1.014.099.639	729.234.275
500 Inversión Física		12.387.008.778	12.387.008.778	7.599.087.469	61%	5.428.907.365	2.170.180.104
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	114.872.688.873	61.032.163.317	43.956.366.282	72%	31.745.803.888	12.210.562.394
200 Servicios No Personales		2.696.717.385	2.590.112.424	144.772.483	6%	144.772.483	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		214.200.000	214.200.000	0	0%	0	
500 Inversión Física		111.402.888.873	57.668.968.278	43.252.711.184	75%	31.042.148.790	12.210.562.394
900 Otros Gastos		558.882.615	558.882.615	558.882.615	100%	558.882.615	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	6.175.021.609	6.075.021.609	2.121.221.683	35%	2.121.221.683	0
200 Servicios No Personales		2.425.144.300	2.425.144.300	1.743.598.391	72%	1.743.598.391	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.749.877.309	3.649.877.309	377.623.292	10%	377.623.292	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	5.041.224.407	5.041.224.407	1.902.258.285	38%	1.902.258.285	0
500 Inversión Física		5.041.224.407	5.041.224.407	1.902.258.285	38%	1.902.258.285	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.836.834.238	0
500 Inversión Física		6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.836.834.238	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
500 Inversión Física		843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	4.746.733.970	4.746.733.970	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.746.733.970	4.746.733.970	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.


En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	520.112.054	520.112.054	0	0%	0	0
500 Inversión Física		520.112.054	520.112.054	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	4.242.252.083	4.242.252.083	432.116.537	10%	432.116.537	0
500 Inversión Física		4.242.252.083	4.242.252.083	432.116.537	10%	432.116.537	0
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	3.030.312.369	3.030.312.369	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.030.312.369	3.030.312.369	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	7.394.687.954	7.394.687.954	2.704.014.244	37%	2.704.014.244	0
500 Inversión Física		7.394.687.954	7.394.687.954	2.704.014.244	37%	2.704.014.244	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristóbal Ruta 6	4.033.435.702	4.033.435.702	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.727.860.457	2.727.860.457	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.305.575.245	1.305.575.245	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	849.681.265.584	849.681.265.584	772.730.440.208	91%	577.519.627.226	195.210.812.982
200 Servicios No Personales		19.000.000.000	19.000.000.000	4.648.000.000	24%	3.486.000.000	1.162.000.000
500 Inversión Física		13.415.132.940	13.415.132.940	3.662.124.468	27%	3.454.762.150	207.362.318
600 Inversión Financiera		787.857.743.325	787.857.743.325	755.268.011.076	96%	561.426.560.412	193.841.450.664
800 Transferencias		28.593.612.278	28.593.612.278	8.337.527.623	29%	8.337.527.623	0
900 Transferencias		814.777.041	814.777.041	814.777.041	100%	814.777.041	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	18.781.035.853	18.781.035.853	8.684.785.787	46%	7.886.018.321	798.767.466
200 Servicios No Personales		4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.343.167.247	14.343.167.247	8.684.785.787	61%	7.886.018.321	798.767.466
800 Transferencias		437.868.606	437.868.606	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	13.030.000.000	9.445.328.544	8.552.589.198	91%	4.937.752.689	3.614.836.509
500 Inversión Física		13.030.000.000	9.445.328.544	8.552.589.198	91%	4.937.752.689	3.614.836.509

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	66.941.850.001	65.745.764.012	22.778.693.455	35%	22.778.693.455	0
200 Servicios No Personales		3.085.000.000	1.888.914.011	808.025.084	43%	808.025.084	0
500 Inversión Física		63.856.850.001	63.856.850.001	21.970.668.371	34%	21.970.668.371	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	39.195.436.674	28.589.502.330	13.510.289.676	47%	10.121.111.717	3.389.177.959
100 Servicios Personales		936.000.000	936.000.000	183.920.000	20%	160.930.000	22.990.000
200 Servicios No Personales		3.224.409.586	1.037.432.189	0	0%	0	0
500 Inversión Física		35.035.027.088	26.616.070.141	13.326.369.676	50%	9.960.181.717	3.366.187.959
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	153.812.107.349	73.927.445.206	35.000.971.897	47%	31.821.563.152	3.179.408.745
200 Servicios No Personales		3.900.000.000	2.745.384.604	1.411.500.996	51%	35.714.286	1.375.786.710
500 Inversión Física		149.912.107.349	71.182.060.602	33.589.470.901	47%	31.785.848.866	1.803.622.035

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	672.611.053.796	615.104.056.485	472.881.977.865	77%	452.582.504.218	20.299.473.647
100 Servicios Personales		1.011.360.000	1.011.360.000	535.484.798	53%	445.446.561	90.038.237
200 Servicios No Personales		18.630.430.000	18.630.430.000	13.805.318.181	74%	12.060.063.027	1.745.255.154
500 Inversión Física		652.969.263.796	595.462.266.485	458.541.174.886	77%	440.076.994.630	18.464.180.256
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	229.770.726.142	219.645.726.142	68.576.962.872	31%	42.842.015.459	25.734.947.413
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	404.800.000	60%	281.600.000	123.200.000
200 Servicios No Personales		2.017.673.300	2.017.673.300	113.545.499	6%	113.545.499	0
500 Inversión Física		227.079.852.842	216.954.852.842	68.058.617.373	31%	42.446.869.960	25.611.747.413
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	5.511.423.594	5.511.423.594	204.834.715	4%	204.834.715	0
500 Inversión Física		5.511.423.594	5.511.423.594	204.834.715	4%	204.834.715	0
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	12.229.000.000	12.229.000.000	12.228.484.062	99,99%	11.076.915.725	1.151.568.337
500 Inversión Física		12.229.000.000	12.229.000.000	12.228.484.062	99,99%	11.076.915.725	1.151.568.337
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	1.163.000.000	1.163.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.163.000.000	1.163.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	969.000.000	969.000.000	968.384.106	99,94%	532.000.000	436.384.106
500 Inversión Física		969.000.000	969.000.000	968.384.106	99,94%	532.000.000	436.384.106
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	1.165.000.000	1.165.000.000	1.164.670.023	99,97%	1.164.670.023	0
500 Inversión Física		1.165.000.000	1.165.000.000	1.164.670.023	99,97%	1.164.670.023	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	3.839.000.000	3.839.000.000	439.759.324	11%	0	439.759.324
500 Inversión Física		3.839.000.000	3.839.000.000	439.759.324	11%	0	439.759.324
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	3.326.000.000	3.326.000.000	298.818.478	9%	0	298.818.478
500 Inversión Física		3.326.000.000	3.326.000.000	298.818.478	9%	0	298.818.478
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	6.974.000.000	6.974.000.000	4.688.658.498	67%	4.688.658.498	0
500 Inversión Física		6.974.000.000	6.974.000.000	4.688.658.498	67%	4.688.658.498	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.807.970.647	1.807.970.647	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.807.970.647	1.807.970.647	0	0%	0	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	4.122.000.000	4.122.000.000	2.822.000.000	68%	2.822.000.000	0
500 Inversión Física		4.122.000.000	4.122.000.000	2.822.000.000	68%	2.822.000.000	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	5.692.000.000	5.692.000.000	1.884.241.803	33%	638.306.792	1.245.935.011
500 Inversión Física		5.692.000.000	5.692.000.000	1.884.241.803	33%	638.306.792	1.245.935.011
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	1.315.000.000	1.315.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.315.000.000	1.315.000.000	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	544.527.085.909	327.666.393.898	134.298.811.352	41%	104.072.949.781	30.225.861.571
200 Servicios No Personales		358.345.482	153.651.646	110.000.000	72%	110.000.000	0
500 Inversión Física		540.592.765.427	327.037.911.389	134.157.948.142	41%	103.960.264.681	30.197.683.461
800 Transferencias		3.575.975.000	474.830.863	30.863.210	6%	2.685.100	28.178.110

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	157.708.440.996	115.474.833.769	68.623.182.980	59%	46.557.020.793	22.066.162.187
200 Servicios No Personales		820.000.000	466.823.526	0	0%	0	0
500 Inversión Física		153.888.440.996	112.008.010.243	68.331.555.515	61%	46.265.393.328	22.066.162.187
800 Transferencias		3.000.000.000	3.000.000.000	291.627.465	10%	291.627.465	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	157.728.601.281	156.806.427.063	154.364.487.742	98%	154.364.487.742	0
200 Servicios No Personales		868.451.836	868.451.836	131.560.000	15%	131.560.000	0
500 Inversión Física		156.860.149.445	155.937.975.227	154.232.927.742	99%	154.232.927.742	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	88.470.317.450	87.910.858.721	82.147.208.380	93%	72.759.580.489	9.387.627.891
200 Servicios No Personales		326.757.000	104.828.375	0	0%	0	0
500 Inversión Física		88.143.560.450	87.806.030.346	82.147.208.380	94%	72.759.580.489	9.387.627.891
86	SP Mej. Gestion y Mant de la Red Vial PY (BIRF 7406)	3.244.212.816	3.244.212.816	1.918.350.000	59%	1.918.350.000	0
500 Inversión Física		1.325.862.816	1.325.862.816	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.918.350.000	1.918.350.000	1.918.350.000	100%	1.918.350.000	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	10.708.754.545	0
500 Inversión Física		11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	10.708.754.545	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	100.725.002.876	46.935.465.234	3.656.850.921	8%	2.687.984.396	968.866.525
200 Servicios No Personales		3.169.643.630	3.144.174.173	0	0%	0	0
500 Inversión Física		94.995.930.512	41.339.254.879	3.656.850.921	9%	2.687.984.396	968.866.525
700 Servicio de la Deuda Pública		59.428.734	0	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.500.000.000	2.452.036.182	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	113.803.372.094	113.803.372.094	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		510.000.000	510.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		113.293.372.094	113.293.372.094	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	230.246.399.343	132.595.611.739	93.221.812.354	70%	93.221.812.354	0
200 Servicios No Personales		2.762.500.000	444.779.388	0	0%	0	0
500 Inversión Física		226.833.899.343	131.942.302.944	93.221.812.354	71%	93.221.812.354	0
800 Transferencias		650.000.000	208.529.407	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy -San Jose de los Arroyos	4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	99,99%	4.075.678.694	0
500 Inversión Física		4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	99,99%	4.075.678.694	0
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	27.804.643.807	27.804.643.807	18.297.422.158	66%	18.297.422.158	0
200 Servicios No Personales		17.053.741.019	17.053.741.019	16.721.190.073	98%	16.721.190.073	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.673.902.788	9.673.902.788	500.000.000	5%	500.000.000	0
500 Inversión Física		1.077.000.000	1.077.000.000	1.076.232.085	99,93%	1.076.232.085	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	388.282.980.235	362.708.753.197	257.025.935.252	71%	215.030.844.055	41.995.091.197
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	4.022.189.595	4.022.189.595	3.532.202.771	88%	3.505.215.559	26.987.212
200 Servicios No Personales		13.228.758	13.228.758	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.008.960.837	4.008.960.837	3.532.202.771	88%	3.505.215.559	26.987.212
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	10.978.045.779	10.793.297.395	7.766.146.196	72%	6.663.591.969	1.102.554.227
200 Servicios No Personales		25.000.000	25.000.000	21.420.000	0%	0	21.420.000
500 Inversión Física		10.953.045.779	10.768.297.395	7.744.726.196	72%	6.663.591.969	1.081.134.227

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	44.719.472.935	31.259.624.273	20.130.033.375	64%	15.193.081.719	4.936.951.656
200 Servicios No Personales		6.624.647.140	6.624.647.140	2.294.653.080	35%	1.697.817.140	596.835.940
500 Inversión Física		38.094.825.795	24.634.977.133	17.835.380.295	72%	13.495.264.579	4.340.115.716
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	72.038.172.999	72.038.172.999	63.535.056.594	88%	51.469.142.417	12.065.914.177
100 Servicios Personales		1.010.400.000	1.010.400.000	457.600.000	45%	400.400.000	57.200.000
200 Servicios No Personales		6.397.795.368	6.397.795.368	6.029.537.958	94%	5.618.639.459	410.898.499
500 Inversión Física		64.629.977.631	64.629.977.631	57.047.918.636	88%	45.450.102.958	11.597.815.678
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	19.646.298.311	19.646.298.311	13.240.719.832	67%	13.240.719.832	0
500 Inversión Física		19.646.298.311	19.646.298.311	13.240.719.832	67%	13.240.719.832	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.961.553.346	1.961.553.346	957.227.152	49%	957.227.152	0
200 Servicios No Personales		1.740.958.606	1.740.958.606	864.625.617	50%	864.625.617	0
500 Inversión Física		220.594.740	220.594.740	92.601.535	42%	92.601.535	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	3.447.298.625	3.447.298.625	509.180.255	15%	509.180.255	0
500 Inversión Física		3.447.298.625	3.447.298.625	509.180.255	15%	509.180.255	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	137.320.326.966	125.390.696.974	100.044.744.565	80%	83.323.749.847	16.720.994.718
200 Servicios No Personales		3.780.625.590	3.356.682.851	1.411.792.853	42%	965.139.941	446.652.912
500 Inversión Física		133.539.701.376	122.034.014.123	98.632.951.712	81%	82.358.609.906	16.274.341.806
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	81.762.621.679	81.762.621.679	36.761.661.007	45%	30.625.624.334	6.136.036.673
200 Servicios No Personales		12.128.324.819	12.128.324.819	7.975.543.061	66%	7.593.428.736	382.114.325
300 Bienes de Consumo e Insumos		45.528.350.782	45.528.350.782	14.063.641.676	31%	8.309.719.328	5.753.922.348
500 Inversión Física		11.361.902.398	11.361.902.398	4.725.122.750	42%	4.725.122.750	0
800 Transferencias		12.744.043.680	12.744.043.680	9.997.353.520	78%	9.997.353.520	0
16	Construcción Cam. Vec. Pav. Dpto. Paraguari	1.006.000.000	1.006.000.000	1.005.652.534	99,97%	0	1.005.652.534
500 Inversión Física		1.006.000.000	1.006.000.000	1.005.652.534	99,97%	0	1.005.652.534
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	11.381.000.000	11.381.000.000	9.543.310.971	84%	9.543.310.971	0
500 Inversión Física		11.381.000.000	11.381.000.000	9.543.310.971	84%	9.543.310.971	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	183.564.490.082	112.736.675.263	65.994.653.235	59%	53.089.050.602	12.905.602.633
01	SP Proyecto Acueducto	1.393.500.000	1.393.500.000	177.132.164	13%	177.132.164	0
500 Inversión Física		1.393.500.000	1.393.500.000	177.132.164	13%	177.132.164	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	60.813.447.569	60.813.447.569	41.985.078.533	69%	29.119.606.900	12.865.471.633
100 Servicios Personales		5.715.800.864	5.715.800.864	1.997.590.602	35%	1.654.638.663	342.951.939
200 Servicios No Personales		7.146.976.911	7.146.976.911	2.421.708.505	34%	2.316.444.577	105.263.928
500 Inversión Física		46.599.669.794	46.599.669.794	37.271.111.080	80%	25.148.523.660	12.122.587.420
800 Transferencias		1.351.000.000	1.351.000.000	294.668.346	22%	0	294.668.346

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	18.680.900.000	18.680.900.000	10.219.072.786	55%	10.199.007.286	20.065.500
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	160.524.000	61%	140.458.500	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.614.400.000	2.614.400.000	926.998.453	35%	926.998.453	0
500 Inversión Física		15.802.500.000	15.802.500.000	9.131.550.333	58%	9.131.550.333	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	23.876.817.173	23.876.817.173	13.613.369.752	57%	13.593.304.252	20.065.500
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	160.524.000	61%	140.458.500	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.184.400.000	2.184.400.000	788.904.600	36%	788.904.600	0
500 Inversión Física		21.428.417.173	21.428.417.173	12.663.941.152	59%	12.663.941.152	0
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	78.399.825.340	7.972.010.521	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		1.872.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		9.811.648.078	3.990.662.699	0	0%	0	0
500 Inversión Física		66.716.177.262	3.871.347.822	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
SUBTOTAL		4.969.695.230.822	4.119.894.452.307	2.799.460.725.618	68%	2.388.449.527.276	411.011.198.342

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	60.647.673.412	60.647.673.412	41.489.097.425	68%	33.814.162.879	7.674.934.546
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	60.647.673.412	60.647.673.412	41.489.097.425	68%	33.814.162.879	7.674.934.546
800 Transferencias		60.647.673.412	60.647.673.412	41.489.097.425	68%	33.814.162.879	7.674.934.546
SUBTOTAL		60.647.673.412	60.647.673.412	41.489.097.425	68%	33.814.162.879	7.674.934.546
TOTAL ENTIDAD		7.001.007.882.142	6.148.083.717.311	4.338.367.550.288	71%	3.858.024.744.182	480.342.806.106

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
