



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL


DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	262.368.060.108	261.401.695.698	69.105.785.522	26%
200 Servicios No Personales	232.301.097.497	202.457.586.578	39.253.642.521	19%
300 Bienes de Consumo e Insumos	137.476.592.472	117.582.731.636	13.431.124.534	11%
500 Inversión Física	5.362.617.896.888	2.870.550.513.760	906.194.232.951	32%
600 Inversión Financiera	912.527.819.343	912.527.819.343	310.192.333.477	34%
800 Transferencias	350.261.303.314	344.933.006.859	98.792.281.432	29%
900 Otros Gastos	5.371.435.965	5.371.435.965	435.493.791	8%
TOTAL ENTIDAD	7.269.618.688.786	4.721.519.273.038	1.437.404.894.228	30%

Participación Presupuestaria

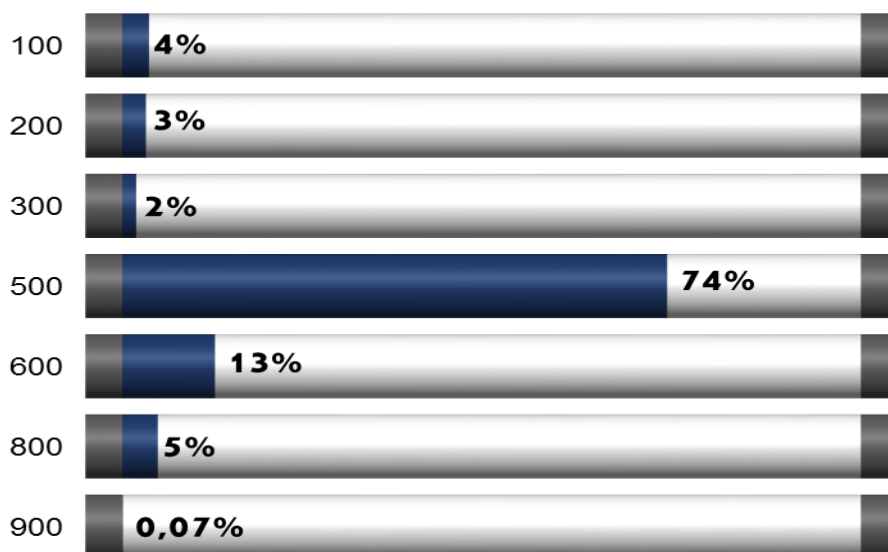


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro




Presupuesto: \$ 241.831.837.373
Ejecutado: \$ 55.224.660.120

Recursos del Crédito Público

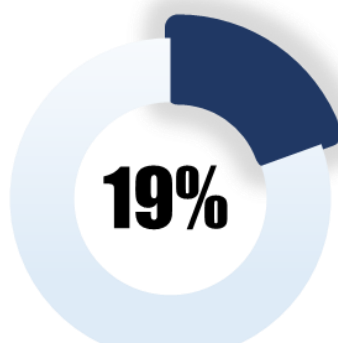

Presupuesto: \$ 6.274.019.139.334
Ejecutado: \$ 1.222.362.342.482

Recursos Institucionales

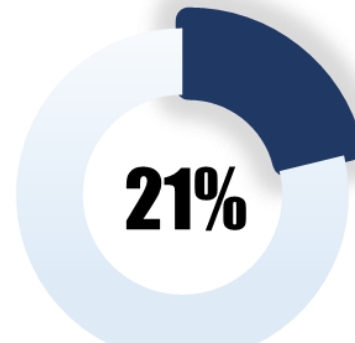

Presupuesto: \$ 753.767.712.079
Ejecutado: \$ 159.817.891.626

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.654.886.575.561	1.417.602.638.358	422.906.221.397	30%	225.051.172.649	197.855.048.748
01	Gestión Administrativa Financiera	337.714.092.948	337.714.092.948	79.928.792.235	24%	53.396.879.697	26.531.912.538
100 Servicios Personales		192.576.999.634	192.576.999.634	53.858.695.526	28%	37.840.802.124	16.017.893.402
110 Remuneraciones Básicas		146.947.557.354	146.947.557.354	38.876.053.474	26%	26.597.452.269	12.278.601.205
120 Remuneraciones Temporales		7.903.347.436	7.903.347.436	1.762.722.631	22%	1.578.728.387	183.994.244
130 Asignaciones Complementarias		17.633.284.316	17.633.284.316	6.476.827.721	37%	4.717.519.449	1.759.308.272
140 Personal Contratado		19.014.405.314	19.014.405.314	6.214.472.007	33%	4.578.101.737	1.636.370.270
190 Otros Gastos del Personal		1.078.405.214	1.078.405.214	528.619.693	49%	369.000.282	159.619.411
200 Servicios No Personales		90.802.753.811	90.802.753.811	22.804.618.948	25%	15.137.407.703	7.667.211.245
210 Servicios Básicos		3.361.666.249	3.361.666.249	2.583.044.662	77%	1.309.569.285	1.273.475.377
220 Transporte y Almacenaje		300.000.000	300.000.000	25.013.065	8%	0	25.013.065
230 Pasajes y Viáticos		5.560.791.911	5.560.791.911	787.722.449	14%	371.075.719	416.646.730
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		17.461.958.607	17.461.958.607	4.475.473.237	26%	2.680.576.796	1.794.896.441
250 Alquileres y Derechos		2.527.797.910	2.527.797.910	313.815.530	12%	238.815.530	75.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		13.688.539.134	13.688.539.134	4.298.696.663	31%	2.924.456.126	1.374.240.537
270 Servicio Social		43.000.000.000	43.000.000.000	9.859.539.717	23%	7.151.600.622	2.707.939.095
280 Otros Servicios en General		4.592.000.000	4.592.000.000	461.313.625	10%	461.313.625	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		32.824.813.000	32.824.813.000	2.810.473.970	9%	182.869.870	2.627.604.100
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.289.412.000	1.289.412.000	169.675.500	13%	140.000.000	29.675.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.135.000.000	2.135.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		23.999.876.500	23.999.876.500	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		5.150.524.500	5.150.524.500	2.640.798.470	51%	42.869.870	2.597.928.600
500 Inversión Física		16.108.090.538	16.108.090.538	19.510.000	0,12%	0	19.510.000
520 Construcciones		97.167.998	97.167.998	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.565.000.000	1.565.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.733.393.340	4.733.393.340	19.510.000	0,41%	0	19.510.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		9.712.529.200	9.712.529.200	0	0%	0	0
800 Transferencias		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.361.435.965	5.361.435.965	435.493.791	8%	235.800.000	199.693.791
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.361.435.965	5.361.435.965	435.493.791	8%	235.800.000	199.693.791
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	262.638.850.728	262.638.850.728	81.868.599.676	31%	29.836.177.614	52.032.422.062
800 Transferencias		262.638.850.728	262.638.850.728	81.868.599.676	31%	29.836.177.614	52.032.422.062
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		262.638.850.728	262.638.850.728	81.868.599.676	31%	29.836.177.614	52.032.422.062

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	8.833.737.408	8.833.737.408	1.897.276.256	21%	1.043.467.993	853.808.263
100 Servicios Personales		5.935.052.542	5.935.052.542	1.468.676.396	25%	1.043.467.993	425.208.403
110	Remuneraciones Básicas	2.703.355.590	2.703.355.590	799.880.228	30%	599.910.171	199.970.057
120	Remuneraciones Temporales	135.624.290	135.624.290	28.173.971	21%	28.173.971	0
130	Asignaciones Complementarias	831.823.519	831.823.519	219.241.379	26%	166.571.776	52.669.603
140	Personal Contratado	2.121.249.143	2.121.249.143	399.780.818	19%	232.612.075	167.168.743
190	Otros Gastos del Personal	143.000.000	143.000.000	21.600.000	15%	16.200.000	5.400.000
200 Servicios No Personales		1.318.976.708	1.318.976.708	428.599.860	32%	0	428.599.860
230	Pasajes y Viáticos	3.017.194	3.017.194	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	146.959.514	146.959.514	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.069.000.000	1.069.000.000	428.599.860	40%	0	428.599.860
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		38.987.010	38.987.010	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.170.000	2.170.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.913.010	21.913.010	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	14.904.000	14.904.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.530.721.148	1.530.721.148	0	0%	0	0
520	Construcciones	564.387.968	564.387.968	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	491.226.800	491.226.800	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	434.133.876	434.133.876	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	40.972.504	40.972.504	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.762.730.598	7.762.730.598	1.177.535.107	15%	308.689.517	868.845.590
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	354.498.771	18%	261.015.013	93.483.758
120 Remuneraciones Temporales		394.767.134	394.767.134	42.698.178	11%	42.698.178	0
130 Asignaciones Complementarias		758.482.961	758.482.961	215.131.413	28%	161.433.851	53.697.562
140 Personal Contratado		661.265.361	661.265.361	60.485.968	9%	30.242.984	30.242.984
190 Otros Gastos del Personal		162.851.000	162.851.000	36.183.212	22%	26.640.000	9.543.212
200 Servicios No Personales		2.704.934.290	2.704.934.290	823.036.336	30%	47.674.504	775.361.832
230 Pasajes y Viáticos		849.516.000	849.516.000	121.728.710	14%	45.586.184	76.142.526
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		677.000.000	677.000.000	192.228.212	28%	2.088.320	190.139.892
250 Alquileres y Derechos		408.000.000	408.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		770.418.290	770.418.290	509.079.414	66%	0	509.079.414
300 Bienes de Consumo e Insumos		224.429.852	224.429.852	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.699.852	25.699.852	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		77.030.000	77.030.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		69.000.000	69.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.700.000	23.700.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.436.000.000	2.436.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		331.000.000	331.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	59.307.655.268	59.307.655.268	12.711.573.838	21%	8.747.341.675	3.964.232.163
100 Servicios Personales		41.038.212.449	41.038.212.449	11.169.881.131	27%	7.540.258.773	3.629.622.358
110 Remuneraciones Básicas		33.896.827.367	33.896.827.367	9.792.111.664	29%	6.600.838.198	3.191.273.466
120 Remuneraciones Temporales		1.082.042.734	1.082.042.734	64.813.165	6%	64.813.165	0
130 Asignaciones Complementarias		3.200.000.000	3.200.000.000	821.053.287	26%	597.633.622	223.419.665
140 Personal Contratado		2.756.987.941	2.756.987.941	485.887.126	18%	270.957.899	214.929.227
190 Otros Gastos del Personal		102.354.407	102.354.407	6.015.889	6%	6.015.889	0
200 Servicios No Personales		9.384.482.856	9.384.482.856	339.980.935	4%	82.086.227	257.894.708
230 Pasajes y Viáticos		1.088.928.005	1.088.928.005	32.435.580	3%	24.270.772	8.164.808
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.305.554.851	7.305.554.851	121.000.000	2%	0	121.000.000
250 Alquileres y Derechos		150.000.000	150.000.000	13.315.455	9%	13.315.455	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		840.000.000	840.000.000	173.229.900	21%	44.500.000	128.729.900
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.205.585.604	4.205.585.604	1.201.711.772	29%	1.124.996.675	76.715.097
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		178.672.000	178.672.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		245.664.000	245.664.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.181.249.600	1.181.249.600	1.124.996.675	95%	1.124.996.675	0
360 Combustibles y Lubricantes		2.600.000.004	2.600.000.004	76.715.097	3%	0	76.715.097
500 Inversión Física		4.587.100.547	4.587.100.547	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		4.575.342.407	4.575.342.407	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		11.758.140	11.758.140	0	0%	0	0
800 Transferencias		92.273.812	92.273.812	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
890 Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.763.395.960	2.763.395.960	452.012.488	16%	277.832.487	174.180.001
100 Servicios Personales		1.922.386.800	1.922.386.800	223.569.592	12%	155.866.997	67.702.595
120 Remuneraciones Temporales		460.000.000	460.000.000	26.306.342	6%	20.922.715	5.383.627
130 Asignaciones Complementarias		615.000.000	615.000.000	152.951.758	25%	112.793.536	40.158.222
140 Personal Contratado		847.386.800	847.386.800	44.311.492	5%	22.150.746	22.160.746
200 Servicios No Personales		581.000.000	581.000.000	228.442.896	39%	121.965.490	106.477.406
230 Pasajes y Viáticos		581.000.000	581.000.000	228.442.896	39%	121.965.490	106.477.406
500 Inversión Física		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.830.000.000	1.830.000.000	11.082.027	1%	0	11.082.027
200 Servicios No Personales		595.000.000	595.000.000	11.082.027	2%	0	11.082.027
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	325.000.000	325.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	170.000.000	170.000.000	11.082.027	7%	0	11.082.027
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.035.000.000	1.035.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	255.000.000	255.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.402.420.000	1.402.420.000	527.375.880	38%	421.713.832	105.662.048
200 Servicios No Personales		1.402.420.000	1.402.420.000	527.375.880	38%	421.713.832	105.662.048
230	Pasajes y Viáticos	227.500.000	227.500.000	26.177.138	12%	11.103.574	15.073.564
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	884.720.000	884.720.000	286.698.742	32%	281.910.258	4.788.484
250	Alquileres y Derechos	290.200.000	290.200.000	214.500.000	74%	128.700.000	85.800.000
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	127.299.618.718	81.989.195.219	15.784.616.730	19%	13.399.024.516	2.385.592.214
200 Servicios No Personales		232.300.000	232.300.000	127.294.471	55%	14.641.662	112.652.809
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	81.900.000	81.900.000	35.961.607	44%	7.559.486	28.402.121
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	91.332.864	83%	7.082.176	84.250.688
300 Bienes de Consumo e Insumos		956.651.531	956.651.531	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	113.321.531	113.321.531	0	0%	0	0
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	183.330.000	183.330.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		125.150.667.187	79.840.243.688	15.657.322.259	20%	13.384.382.854	2.272.939.405
520	Construcciones	125.145.627.187	79.835.203.688	15.657.322.259	20%	13.384.382.854	2.272.939.405
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.040.000	5.040.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	22.971.047.305	12.274.339.315	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.339.121.393	1.339.121.393	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.339.121.393	1.339.121.393	0	0%	0
500	Inversión Física	21.631.925.912	10.935.217.922	0	0%	0
520	Construcciones	21.516.845.484	10.820.137.494	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	115.080.428	115.080.428	0	0%	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	13.142.867.693	944.310.675	0	0%	0
200	Servicios No Personales	101.124.991	101.124.991	0	0%	0
250	Alquileres y Derechos	101.124.991	101.124.991	0	0%	0
500	Inversión Física	13.041.742.702	843.185.684	0	0%	0
520	Construcciones	13.041.742.702	843.185.684	0	0%	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	26.479.274.806	8.530.790.467	5.976.095.239	70%	5.976.095.239
100	Servicios Personales	264.864.936	264.864.936	32.670.000	12%	32.670.000
140	Personal Contratado	264.864.936	264.864.936	32.670.000	12%	32.670.000
500	Inversión Física	25.990.338.117	8.041.853.778	5.943.425.239	74%	5.943.425.239
520	Construcciones	23.717.960.993	7.041.853.778	5.943.425.239	84%	5.943.425.239
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.272.377.124	1.000.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	224.071.753	224.071.753	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224.071.753	224.071.753	0	0%	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	9.350.596.130	9.350.596.130	947.050.969	10%	947.050.969
500	Inversión Física	9.350.596.130	9.350.596.130	947.050.969	10%	947.050.969
520	Construcciones	9.350.596.130	9.350.596.130	947.050.969	10%	947.050.969
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	12.663.380.391	12.663.380.391	2.947.608.864	23%	317.240.721
200	Servicios No Personales	7.661.999	7.661.999	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.661.999	7.661.999	0	0%	0
500	Inversión Física	12.655.718.392	12.655.718.392	2.947.608.864	23%	317.240.721
520	Construcciones	12.655.718.391	12.655.718.391	2.947.608.864	23%	317.240.721
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1	1	0	0%	0
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	5.601.979.826	3.204.078.241	0	0%	0
200	Servicios No Personales	318.028.641	278.342.224	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	318.028.641	278.342.224	0	0%	0
500	Inversión Física	2.445.042.933	1.534.670.974	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.445.042.933	1.534.670.974	0	0%	0
800	Transferencias	2.838.908.252	1.391.065.043	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	2.838.908.252	1.391.065.043	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	13.357.188.338	13.273.011.025	3.874.154.660	29%	2.770.654.552	1.103.500.108
200 Servicios No Personales		2.201.949.213	2.201.949.213	1.082.385.881	49%	658.015.389	424.370.492
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.201.949.213	2.201.949.213	1.082.385.881	49%	658.015.389	424.370.492
500 Inversión Física		11.125.733.167	11.056.603.893	2.791.768.779	25%	2.112.639.163	679.129.616
520	Construcciones	11.025.616.810	11.007.546.878	2.791.768.779	25%	2.112.639.163	679.129.616
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.116.357	49.057.015	0	0%	0	0
800 Transferencias		29.505.958	14.457.919	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.505.958	14.457.919	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	103.193.205.442	78.528.847.229	77.852.086.085	99%	11.624.791.484	66.227.294.601
500 Inversión Física		103.193.205.442	78.528.847.229	77.852.086.085	99%	11.624.791.484	66.227.294.601
520	Construcciones	103.193.205.442	78.528.847.229	77.852.086.085	99%	11.624.791.484	66.227.294.601
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	82.165.016.628	61.325.339.351	4.769.140.042	8%	4.769.140.042	0
500 Inversión Física		82.165.016.628	61.325.339.351	4.769.140.042	8%	4.769.140.042	0
520	Construcciones	82.165.016.628	61.325.339.351	4.769.140.042	8%	4.769.140.042	0
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	9.564.493.974	9.564.493.974	5.320.315.400	56%	0	5.320.315.400
500 Inversión Física		9.564.493.974	9.564.493.974	5.320.315.400	56%	0	5.320.315.400
520	Construcciones	9.564.493.974	9.564.493.974	5.320.315.400	56%	0	5.320.315.400
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	149.148.987.622	135.094.980.862	37.442.277.671	28%	20.070.457.918	17.371.819.753
500 Inversión Física		149.148.987.622	135.094.980.862	37.442.277.671	28%	20.070.457.918	17.371.819.753
520	Construcciones	149.148.987.622	135.094.980.862	37.442.277.671	28%	20.070.457.918	17.371.819.753
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	191.879.866.475	120.000.000.000	27.887.438.835	28%	18.730.738.755	9.156.700.080
500 Inversión Física		191.879.866.475	120.000.000.000	27.887.438.835	28%	18.730.738.755	9.156.700.080
520	Construcciones	191.879.866.475	120.000.000.000	27.887.438.835	28%	18.730.738.755	9.156.700.080
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	8.021.753.506	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.021.753.506	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.021.753.506	0	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	18.783.679.896	12.475.473.910	2.888.472.813	23%	933.178.885	1.955.293.928
100 Servicios Personales		2.563.780.000	2.563.780.000	768.500.000	30%	0	768.500.000
140	Personal Contratado	2.542.880.000	2.542.880.000	747.600.000	29%	0	747.600.000
190	Otros Gastos del Personal	20.900.000	20.900.000	20.900.000	100%	0	20.900.000
200 Servicios No Personales		4.960.815.812	4.960.815.812	1.797.057.283	36%	610.263.355	1.186.793.928
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.960.815.812	4.960.815.812	1.797.057.283	36%	610.263.355	1.186.793.928
500 Inversión Física		10.606.084.084	4.297.878.098	0	0%	0	0
520	Construcciones	7.463.572.759	1.155.366.773	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	304.880.000	304.880.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	139.840.000	139.840.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.697.791.325	2.697.791.325	0	0%	0	0
800 Transferencias		653.000.000	653.000.000	322.915.530	49%	322.915.530	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	373.000.000	373.000.000	322.915.530	87%	322.915.530	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	18.278.730.519	18.278.730.519	11.303.444.616	62%	11.303.444.616	0
500 Inversión Física		18.278.730.519	18.278.730.519	11.303.444.616	62%	11.303.444.616	0
520 Construcciones		18.278.730.519	18.278.730.519	11.303.444.616	62%	11.303.444.616	0
41	Ejec de Conv de Coop con el MSPYBS bajo la Ley de Emergencia	781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	0	491.643.875
500 Inversión Física		781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	0	491.643.875
520 Construcciones		781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	0	491.643.875
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	86.493.426.100	86.493.426.100	46.011.402.708	53%	46.011.402.708	0
500 Inversión Física		86.493.426.100	86.493.426.100	46.011.402.708	53%	46.011.402.708	0
520 Construcciones		86.493.426.100	86.493.426.100	46.011.402.708	53%	46.011.402.708	0
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	6.086.692.062	3.206.874.820	694.280.715	22%	0	694.280.715
500 Inversión Física		6.086.692.062	3.206.874.820	694.280.715	22%	0	694.280.715
520 Construcciones		6.086.692.062	3.206.874.820	694.280.715	22%	0	694.280.715
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	7.370.434.122	7.370.434.122	141.944.668	2%	141.944.668	0
500 Inversión Física		7.370.434.122	7.370.434.122	141.944.668	2%	141.944.668	0
520 Construcciones		7.370.434.122	7.370.434.122	141.944.668	2%	141.944.668	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Sur	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		60.000.000.000	60.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		60.000.000.000	60.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.654.886.575.561	1.417.602.638.358	422.906.221.397	30%	225.051.172.649	197.855.048.748

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.798.147.636.300	2.811.432.246.751	894.351.506.600	32%	572.965.057.749	321.386.448.851
04	SP FOCES-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	1.341.259.310	1.238.225.382	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	211.200.000	211.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	211.200.000	211.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	928.032.000	928.032.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	928.032.000	928.032.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	202.027.310	98.993.382	0	0%	0	0
520	Construcciones	202.027.310	98.993.382	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	40.655.107.233	40.655.107.233	26.365.586.522	65%	23.625.905.498	2.739.681.024
200	Servicios No Personales	1.484.349.148	1.484.349.148	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.484.349.148	1.484.349.148	0	0%	0	0
500	Inversión Física	39.170.758.085	39.170.758.085	26.365.586.522	67%	23.625.905.498	2.739.681.024
520	Construcciones	39.170.758.085	39.170.758.085	26.365.586.522	67%	23.625.905.498	2.739.681.024

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	97.600.470.519	48.219.417.428	8.036.537.365	17%	5.122.576.674	2.913.960.691
200 Servicios No Personales		107.584.809	94.973.309	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	6.999.999	6.999.999	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.584.810	87.973.310	0	0%	0	0
500 Inversión Física		97.492.885.710	48.124.444.119	8.036.537.365	17%	5.122.576.674	2.913.960.691
520	Construcciones	90.397.791.865	44.632.197.197	8.036.537.365	18%	5.122.576.674	2.913.960.691
580	Estudios y Proyectos de Inversión	300.000.000	162.650.938	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.795.093.845	3.329.595.984	0	0%	0	0
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	184.152.462.245	92.581.007.513	18.833.105.365	20%	17.228.119.037	1.604.986.328
200 Servicios No Personales		142.720.000	142.720.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	42.720.000	42.720.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		184.009.742.245	92.438.287.513	18.833.105.365	20%	17.228.119.037	1.604.986.328
520	Construcciones	183.831.805.871	92.260.351.139	18.833.105.365	20%	17.228.119.037	1.604.986.328
580	Estudios y Proyectos de Inversión	177.936.374	177.936.374	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	13.158.656.953	13.158.656.953	593.384.862	5%	593.384.862	0
200 Servicios No Personales		777.266.405	777.266.405	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	777.266.405	777.266.405	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.381.390.548	12.381.390.548	593.384.862	5%	593.384.862	0
520	Construcciones	11.800.502.010	11.800.502.010	593.384.862	5%	593.384.862	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	80.888.538	80.888.538	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	60.046.923.288	54.933.337.144	19.779.621.274	36%	665.287.067	19.114.334.207
200 Servicios No Personales		1.705.509.180	1.031.305.189	2.494.803	0,24%	2.494.803	0
230	Pasajes y Viáticos	13.000.000	13.000.000	2.494.803	19%	2.494.803	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.692.509.180	1.018.305.189	0	0%	0	0
500 Inversión Física		58.341.414.108	53.902.031.955	19.777.126.471	37%	662.792.264	19.114.334.207
520	Construcciones	41.903.372.154	39.252.953.324	19.777.126.471	50%	662.792.264	19.114.334.207
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	16.438.041.954	14.649.078.631	0	0%	0	0
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	36.202.148.974	36.202.148.973	13.683.964.444	38%	9.958.455.122	3.725.509.322
200 Servicios No Personales		1.718.510.147	1.718.510.147	758.602.719	44%	489.526.276	269.076.443
230	Pasajes y Viáticos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.678.510.147	1.678.510.147	758.602.719	45%	489.526.276	269.076.443
500 Inversión Física		34.483.638.827	34.483.638.826	12.925.361.725	37%	9.468.928.846	3.456.432.879
520	Construcciones	34.483.638.827	34.483.638.826	12.925.361.725	37%	9.468.928.846	3.456.432.879

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	23.047.613.948	23.047.613.948	8.701.172.057	38%	1.918.768.597	6.782.403.460
500 Inversión Física		23.047.613.948	23.047.613.948	8.701.172.057	38%	1.918.768.597	6.782.403.460
520	Construcciones	22.047.613.948	22.047.613.948	8.701.172.057	39%	1.918.768.597	6.782.403.460
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	10.608.576.888	10.608.576.888	2.935.903.201	28%	2.196.246.146	739.657.055
500 Inversión Física		10.608.576.888	10.608.576.888	2.935.903.201	28%	2.196.246.146	739.657.055
520	Construcciones	10.608.576.888	10.608.576.888	2.935.903.201	28%	2.196.246.146	739.657.055
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	71.752.352.806	57.044.608.945	11.123.712.009	20%	7.392.506.501	3.731.205.508
100 Servicios Personales		699.600.000	699.600.000	174.900.000	25%	0	174.900.000
140	Personal Contratado	699.600.000	699.600.000	174.900.000	25%	0	174.900.000
200 Servicios No Personales		314.854.866	314.854.866	13.719.238	4%	0	13.719.238
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	13.719.238	23%	0	13.719.238
260	Servicios Técnicos y Profesionales	254.854.866	254.854.866	0	0%	0	0
500 Inversión Física		70.737.897.940	56.030.154.079	10.935.092.771	20%	7.392.506.501	3.542.586.270
520	Construcciones	70.737.897.940	56.030.154.079	10.935.092.771	20%	7.392.506.501	3.542.586.270
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	103.776.764.508	93.107.037.769	26.771.148.314	29%	18.451.062.375	8.320.085.939
200 Servicios No Personales		4.021.287.230	4.021.287.230	82.500.000	2%	0	82.500.000
220	Transporte Y Almacenaje	138.324.789	138.324.789	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	3.738.962.441	3.738.962.441	82.500.000	2%	0	82.500.000
290	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	
500 Inversión Física		99.675.477.278	89.085.750.539	26.688.648.314	30%	18.451.062.375	8.237.585.939
520	Construcciones	96.677.216.188	86.087.489.449	26.688.648.314	31%	18.451.062.375	8.237.585.939
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.750.103.209	2.750.103.209	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	248.157.881	248.157.881	0	0%	0	0
800 Transferencias		80.000.000	0	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.000.000	0	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	8.382.764.092	4.107.554.405	3.027.536.362	74%	2.760.992.240	266.544.122
200 Servicios No Personales		4.471.600.000	1.504.918.253	424.900.210	28%	158.356.088	266.544.122
230	Pasajes y Viáticos	4.471.600.000	1.504.918.253	424.900.210	28%	158.356.088	266.544.122
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.138.575.116	2.602.636.152	2.602.636.152	100%	2.602.636.152	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	49.868.185	0	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	3.088.706.931	2.602.636.152	2.602.636.152	100%	2.602.636.152	0
500 Inversión Física		772.588.976	0	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	772.588.976	0	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	9.308.189.972	9.308.189.972	3.846.261.572	41%	1.955.813.642	1.890.447.930
500 Inversión Física		9.308.189.972	9.308.189.972	3.846.261.572	41%	1.955.813.642	1.890.447.930
520	Construcciones	9.308.189.972	9.308.189.972	3.846.261.572	41%	1.955.813.642	1.890.447.930

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	12.166.236.680	12.166.236.680	205.670.304	2%	205.670.304	0
500 Inversión Física		12.166.236.680	12.166.236.680	205.670.304	2%	205.670.304	0
520 Construcciones		12.166.236.680	12.166.236.680	205.670.304	2%	205.670.304	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.334.450.105	1.334.450.105	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.334.450.105	1.334.450.105	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.334.450.105	1.334.450.105	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	2.429.793.550	2.429.793.550	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.429.793.550	2.429.793.550	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.429.793.550	2.429.793.550	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
500 Inversión Física		105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
520 Construcciones		105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	1.743.832.957	1.049.018.647	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		370.000.000	181.300.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		370.000.000	181.300.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.373.832.957	867.718.647	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.373.832.957	867.718.647	0	0%	0	0
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	478.053.916	478.053.916	0	0%	0	0
500 Inversión Física		478.053.916	478.053.916	0	0%	0	0
520 Construcciones		478.053.916	478.053.916	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	40.234.712.241	8.208.392.230	7.541.106.745	92%	7.541.106.745	0
500 Inversión Física		40.234.712.241	8.208.392.230	7.541.106.745	92%	7.541.106.745	0
520 Construcciones		40.234.712.241	8.208.392.230	7.541.106.745	92%	7.541.106.745	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	942.905.079	462.023.489	0	0%	0	0
500 Inversión Física		938.222.388	459.728.970	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		938.222.388	459.728.970	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.682.691	2.294.519	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		4.682.691	2.294.519	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	943.101.188.305	936.590.108.552	315.522.606.240	34%	315.482.398.160	40.208.080
200 Servicios No Personales		10.901.720.261	10.901.720.261	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.301.720.261	7.301.720.261	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.980.399.616	4.400.395.812	4.266.997.658	97%	4.266.997.658	0
520	Construcciones	444.632.451	217.869.901	92.079.414	42%	92.079.414	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.535.767.165	4.182.525.911	4.174.918.244	99%	4.174.918.244	0
600 Inversión Financiera		912.527.819.343	912.527.819.343	310.192.333.477	34%	310.192.333.477	0
630	Préstamos al Sector Privado	912.527.819.343	912.527.819.343	310.192.333.477	34%	310.192.333.477	0
800 Transferencias		10.691.249.085	8.760.173.136	1.063.275.105	12%	1.023.067.025	40.208.080
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.786.423.430	1.855.347.481	1.063.275.105	57%	1.023.067.025	40.208.080
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	6.904.825.655	6.904.825.655	0	0%	0	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	15.252.857.812	12.326.700.495	2.455.004.185	20%	0	2.455.004.185
500 Inversión Física		14.258.463.525	11.839.447.294	2.455.004.185	21%	0	2.455.004.185
520	Construcciones	8.015.324.713	8.015.324.713	1.802.201.957	22%	0	1.802.201.957
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.243.138.812	3.824.122.581	652.802.228	17%	0	652.802.228
800 Transferencias		994.394.287	487.253.201	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	994.394.287	487.253.201	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.543.640.418	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.200.702.616	2.200.702.616	705.831.288	32%	705.831.288	0
500 Inversión Física		2.200.702.616	2.200.702.616	705.831.288	32%	705.831.288	0
520	Construcciones	2.200.702.616	2.200.702.616	705.831.288	32%	705.831.288	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	9.971.551.502	9.971.551.502	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.694.313.987	2.694.313.987	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.694.313.987	2.694.313.987	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.277.237.515	7.277.237.515	0	0%	0	0
520	Construcciones	6.268.146.345	6.268.146.345	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.009.091.170	1.009.091.170	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	28.007.845.135	28.007.845.135	9.406.177.084	34%	2.488.535.005	6.917.642.079
100 Servicios Personales		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		26.725.445.135	26.725.445.135	9.406.177.084	35%	2.488.535.005	6.917.642.079
520	Construcciones	25.725.445.135	25.725.445.135	9.406.177.084	37%	2.488.535.005	6.917.642.079
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	134.146.178.541	48.556.546.964	10.718.734.641	22%	2.973.572.626	7.745.162.015
200 Servicios No Personales		2.044.382.472	1.045.886.163	984.737.782	94%	424.221.707	560.516.075
230	Pasajes y Viáticos	10.000.000	10.000.000	3.491.968	35%	0	3.491.968
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.034.382.472	1.035.886.163	981.245.814	95%	424.221.707	557.024.107
500 Inversión Física		132.101.796.069	47.510.660.801	9.733.996.859	20%	2.549.350.919	7.184.645.940
520	Construcciones	132.101.796.069	47.510.660.801	9.733.996.859	20%	2.549.350.919	7.184.645.940
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	310.952.079.771	254.468.991.962	126.620.028.188	50%	3.653.310.964	122.966.717.224
100 Servicios Personales		1.132.000.000	1.132.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.132.000.000	1.132.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		22.360.476.095	20.426.578.978	3.768.847.423	18%	2.015.163.437	1.753.683.986
260	Servicios Técnicos y Profesionales	22.360.476.095	20.426.578.978	3.768.847.423	18%	2.015.163.437	1.753.683.986
500 Inversión Física		287.459.603.676	232.910.412.984	122.851.180.765	53%	1.638.147.527	121.213.033.238
520	Construcciones	283.559.603.676	230.460.412.984	122.851.180.765	53%	1.638.147.527	121.213.033.238
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.000.000	2.450.000.000	0	0%	0	0
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	3.735.525.417	1.800.407.455	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.505.525.417	1.570.407.455	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	3.505.525.417	1.570.407.455	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	207.372.675.338	190.158.154.950	43.640.586.623	23%	247.147.587	43.393.439.036
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	158.400.000	24%	0	158.400.000
140	Personal Contratado	673.200.000	673.200.000	158.400.000	24%	0	158.400.000
200 Servicios No Personales		682.236.576	682.236.576	23.392.222	3%	10.836.830	12.555.392
220	Transporte y Almacenaje	142.350.000	142.350.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	455.911.464	455.911.464	23.392.222	5%	10.836.830	12.555.392
260	Servicios Técnicos y Profesionales	83.975.112	83.975.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		206.017.238.762	188.802.718.374	43.458.794.401	23%	236.310.757	43.222.483.644
520	Construcciones	206.017.238.762	188.802.718.374	43.458.794.401	23%	236.310.757	43.222.483.644
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	3.302.233.279	3.302.233.279	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.302.233.279	3.302.233.279	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.302.233.279	3.302.233.279	0	0%	0	0
61	Mejoramiento de Caminos Departamento San Pedro	1.048.579.850	1.048.579.850	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.048.579.850	1.048.579.850	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.048.579.850	1.048.579.850	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento de Caminos Departamento Cordillera	30	30	0	0%	0	0
500 Inversión Física		30	30	0	0%	0	0
520 Construcciones		30	30	0	0%	0	0
64	Mejoramiento de Caminos Departamento Ñeembucú	1.704.053.101	1.704.053.101	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.704.053.101	1.704.053.101	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.704.053.101	1.704.053.101	0	0%	0	0
65	Mejoramiento de Caminos Departamento Itapúa	1.977.671.350	1.977.671.350	1.924.357.267	97%	0	1.924.357.267
500 Inversión Física		1.977.671.350	1.977.671.350	1.924.357.267	97%	0	1.924.357.267
520 Construcciones		1.977.671.350	1.977.671.350	1.924.357.267	97%	0	1.924.357.267
66	Mejoramiento de Caminos Departamento Central	4.994.250.532	4.994.250.532	4.367.388.588	87%	0	4.367.388.588
500 Inversión Física		4.994.250.532	4.994.250.532	4.367.388.588	87%	0	4.367.388.588
520 Construcciones		4.994.250.532	4.994.250.532	4.367.388.588	87%	0	4.367.388.588
68	Mejoramiento de Caminos Departamento Guairá	298.818.508	298.818.508	298.818.478	100%	0	298.818.478
500 Inversión Física		298.818.508	298.818.508	298.818.478	100%	0	298.818.478
520 Construcciones		298.818.508	298.818.508	298.818.478	100%	0	298.818.478
69	Mejoramiento de Caminos Departamento Caaguazú	830.292.453	830.292.453	830.292.453	100%	0	830.292.453
500 Inversión Física		830.292.453	830.292.453	830.292.453	100%	0	830.292.453
520 Construcciones		830.292.453	830.292.453	830.292.453	100%	0	830.292.453
70	Mejoramiento de Caminos Departamento Alto Paraná	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
500 Inversión Física		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
520 Construcciones		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
71	Mejoramiento de Caminos Departamento Misiones	156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	0	53.330.580
500 Inversión Física		156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	0	53.330.580
520 Construcciones		156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	0	53.330.580
72	Mejoramiento de Caminos Departamento Canindeyú	19.988.330.376	19.988.330.376	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.988.330.376	19.988.330.376	0	0%	0	0
520 Construcciones		19.988.330.376	19.988.330.376	0	0%	0	0
73	Mejoramiento de Caminos Departamento Concepción	8.171.935.563	8.171.935.563	5.629.495.552	69%	0	5.629.495.552
500 Inversión Física		8.171.935.563	8.171.935.563	5.629.495.552	69%	0	5.629.495.552
520 Construcciones		8.171.935.563	8.171.935.563	5.629.495.552	69%	0	5.629.495.552

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	418.480.000.388	217.705.285.368	55.298.154.510	25%	35.235.189.777	20.062.964.733
200	Servicios No Personales	421.965.518	229.220.603	9.075.000	4%	0	9.075.000
230	Pasajes y Viáticos	20.000.000	0	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	50.031.201	24.515.288	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	351.934.317	204.705.315	9.075.000	4%	0	9.075.000
500	Inversión Física	417.578.034.870	217.240.864.765	55.289.079.510	25%	35.235.189.777	20.053.889.733
520	Construcciones	384.133.561.168	190.303.953.308	52.986.825.515	28%	35.235.189.777	17.751.635.738
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	44.473.702	21.792.114	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	33.400.000.000	26.915.119.343	2.302.253.995	9%	0	2.302.253.995
800	Transferencias	480.000.000	235.200.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	480.000.000	235.200.000	0	0%	0	0
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	112.722.066.570	27.827.941.132	7.940.936.146	29%	7.940.936.146	0
200	Servicios No Personales	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	111.902.066.570	27.007.941.132	7.940.936.146	29%	7.940.936.146	0
520	Construcciones	108.001.842.624	23.867.806.764	7.940.936.146	33%	7.940.936.146	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.223.946	3.140.134.368	0	0%	0	0
800	Transferencias	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	187.633.925.138	128.216.354.740	101.560.608.140	79%	84.815.530.672	16.745.077.468
200	Servicios No Personales	1.902.000.000	951.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.902.000.000	951.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	185.731.925.138	127.265.354.740	101.560.608.140	80%	84.815.530.672	16.745.077.468
520	Construcciones	179.929.924.859	123.774.754.656	100.873.413.902	81%	84.815.530.672	16.057.883.230
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.302.000.279	990.600.084	687.194.238	69%	0	687.194.238
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	264.856.324.047	91.551.980.000	33.312.280.958	36%	13.562.169.144	19.750.111.814
200	Servicios No Personales	151.980.000	151.980.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	151.980.000	151.980.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	264.704.344.047	91.400.000.000	33.312.280.958	36%	13.562.169.144	19.750.111.814
520	Construcciones	257.954.344.048	89.100.000.000	33.093.684.588	37%	13.343.572.774	19.750.111.814
580	Estudios y Proyectos de Inversión	4.149.999.999	1.000.000.000	218.596.370	22%	218.596.370	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.600.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	12.985.187.477	12.985.187.477	2.403.826.195	19%	72.334.047	2.331.492.148
500	Inversión Física	12.985.187.477	12.985.187.477	2.403.826.195	19%	72.334.047	2.331.492.148
520	Construcciones	12.985.187.477	12.985.187.477	2.403.826.195	19%	72.334.047	2.331.492.148

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
89	SP AP. Pre. Prog. de Mod. del Sec. Tra. PY ATN/OC- 11921-PR	157.656.609	157.656.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		157.656.609	157.656.609	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión		157.656.609	157.656.609	0	0%	0	0
91	SP Pav.Corred. de Integr.Rehab. y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
500 Inversión Física		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
520 Construcciones		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	218.695.895.375	61.645.857.798	9.007.505.797	15%	5.752.677.003	3.254.828.794
200 Servicios No Personales		852.765.263	852.765.263	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		41.000.000	41.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		811.765.263	811.765.263	0	0%	0	0
500 Inversión Física		216.243.130.112	60.293.092.535	9.007.505.797	15%	5.752.677.003	3.254.828.794
520 Construcciones		184.475.962.424	54.641.000.000	9.007.505.797	16%	5.752.677.003	3.254.828.794
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		31.767.167.688	5.652.092.535	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.600.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.600.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	208.884.000.000	51.334.000.000	3.865.436.335	8%	0	3.865.436.335
200 Servicios No Personales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		208.380.000.000	50.830.000.000	3.865.436.335	8%	0	3.865.436.335
520 Construcciones		206.720.000.000	50.000.000.000	3.865.436.335	8%	0	3.865.436.335
580 Estudios y Proyectos de Inversión		960.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		700.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	350.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		350.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		350.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	504.157.397.360	42.009.859.609	6.500.556.761	15%	0	6.500.556.761
100 Servicios Personales		1.220.000.000	1.220.000.000	265.567.506	22%	0	265.567.506
140 Personal Contratado		1.220.000.000	1.220.000.000	265.567.506	22%	0	265.567.506
200 Servicios No Personales		124.000.000	124.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		495.918.914.161	33.771.376.410	6.234.989.255	18%	0	6.234.989.255
520 Construcciones		495.618.914.161	33.471.376.410	6.234.989.255	19%	0	6.234.989.255
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		6.694.483.199	6.694.483.199	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Publica		6.694.483.199	6.694.483.199	0	0%	0	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	96.801.920.323	96.451.920.323	844.840.195	1%	419.530.520	425.309.675
200 Servicios No Personales		18.062.064.137	18.062.064.137	69.950.375	0,39%	34.530.620	35.419.755
230	Pasajes y Viáticos	800.000.000	800.000.000	69.950.375	9%	34.530.620	35.419.755
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.262.064.137	17.262.064.137	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.359.221.032	13.009.221.032	774.889.820	6%	384.999.900	389.889.920
360	Combustibles y Lubricantes	3.918.297.531	3.918.297.531	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	9.440.923.501	9.090.923.501	774.889.820	9%	384.999.900	389.889.920
500 Inversión Física		58.830.766.434	58.830.766.434	0	0%	0	0
520	Construcciones	58.830.766.434	58.830.766.434	0	0%	0	0
800 Transferencias		6.549.868.720	6.549.868.720	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.549.868.720	6.549.868.720	0	0%	0	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	531.320.648.746	312.490.102.328	81.402.385.180	26%	49.032.342.363	32.370.042.817
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	771.245.387	80.523.448	0	0%	0	0
500 Inversión Física		771.245.387	80.523.448	0	0%	0	0
520	Construcciones	771.245.387	80.523.448	0	0%	0	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	1.152.246.870	804.680.680	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.148.219.055	800.652.865	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.148.219.055	800.652.865	0	0%	0	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	14.196.444.229	14.170.192.098	1.489.804.211	11%	0	1.489.804.211
200 Servicios No Personales		1.807.229.388	1.807.229.388	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.807.229.388	1.807.229.388	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.389.214.841	12.362.962.710	1.489.804.211	12%	0	1.489.804.211
520	Construcciones	12.259.691.373	12.233.439.242	1.489.804.211	12%	0	1.489.804.211
580	Estudios y Proyectos de Inversión	129.523.468	129.523.468	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	60.658.640.436	42.146.460.408	20.155.746.581	48%	14.170.164.898	5.985.581.683
100 Servicios Personales		2.192.000.000	1.296.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	2.192.000.000	1.296.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.857.000.955	3.403.400.955	1.596.270.690	47%	985.132.784	611.137.906
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.857.000.955	3.403.400.955	1.596.270.690	47%	985.132.784	611.137.906
500 Inversión Física		54.609.639.481	37.447.059.453	18.559.475.891	50%	13.185.032.114	5.374.443.777
520	Construcciones	53.437.468.281	36.274.888.253	17.674.643.013	49%	12.300.199.236	5.374.443.777
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.172.171.200	1.172.171.200	884.832.878	75%	884.832.878	0
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	17.811.047.671	12.426.309.577	0	0%	0	0
500 Inversión Física		17.811.047.671	12.426.309.577	0	0%	0	0
520	Construcciones	17.811.047.671	12.426.309.577	0	0%	0	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.686.940.210	1.070.737.838	225.479.368	21%	0	225.479.368
200 Servicios No Personales		885.999.999	885.997.528	225.424.394	25%	0	225.424.394
230	Pasejes y Viáticos	286.000.000	286.000.000	225.424.394	79%	0	225.424.394
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	599.999.999	599.997.528	0	0%	0	0
500 Inversión Física		800.940.211	184.740.310	54.974	0,03%	0	54.974
520	Construcciones	800.940.211	184.740.310	54.974	0,03%	0	54.974

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	196.628.411	0	0	0%	0
200 Servicios No Personales		196.628.411	0	0	0%	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		196.628.411	0	0	0%	0
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	7.667.147.967	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336
500 Inversión Física		7.667.147.967	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336
520 Construcciones		7.667.147.967	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	210.431.851.192	137.059.691.904	35.435.616.014	26%	26.809.698.035
200 Servicios No Personales		841.926.000	841.926.000	793.306.753	94%	631.085.371
260 Servicios Técnicos y Profesionales		841.926.000	841.926.000	793.306.753	94%	631.085.371
500 Inversión Física		209.589.925.192	136.217.765.904	34.642.309.261	25%	26.178.612.664
520 Construcciones		207.072.580.056	133.700.420.768	34.413.709.261	26%	25.950.012.664
580 Estudios y Proyectos de Inversión		2.517.345.136	2.517.345.136	228.600.000	9%	228.600.000
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	152.023.733.008	79.393.167.046	12.707.391.087	16%	3.388.745.847
200 Servicios No Personales		19.289.560.000	4.154.301.959	2.327.485.891	56%	611.449.885
230 Pasejes y Viáticos		2.420.000.000	2.420.000.000	1.773.104.690	73%	66.799.684
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		16.400.000.000	1.264.741.959	554.381.201	44%	544.650.201
250 Alquileres y Derechos		469.560.000	469.560.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		79.022.803.910	61.950.000.000	6.041.412.820	10%	179.738.140
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		300.000.000	0	0	0%	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		3.600.000.000	1.500.000.000	399.880.000	27%	399.880.000
360 Combustibles y Lubricantes		57.000.000.000	57.000.000.000	5.461.794.680	10%	5.461.794.680
390 Otros Bienes de Consumo		18.122.803.910	3.450.000.000	179.738.140	5%	179.738.140
500 Inversión Física		53.711.369.098	13.288.865.087	4.338.492.376	33%	2.597.557.822
510 Adquisición de Inmuebles		700.000.000	0	0	0%	0
520 Construcciones		29.411.369.098	9.088.865.087	1.783.725.796	20%	765.530.678
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		8.000.000.000	1.200.000.000	0	0%	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.400.000.000	0	0	0%	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		13.200.000.000	3.000.000.000	2.554.766.580	85%	1.832.027.144

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Canindeyú	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	0	495.892.706
500 Inversión Física		570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	0	495.892.706
520 Construcciones		570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	0	495.892.706
14	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Caazapà	177.608	177.608	0	0%	0	0
500 Inversión Física		177.608	177.608	0	0%	0	0
520 Construcciones		177.608	177.608	0	0%	0	0
15	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0	0
500 Inversión Física		48	48	0	0%	0	0
520 Construcciones		48	48	0	0%	0	0
16	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Paraguari	349.320.566	349.320.566	88.531.266	25%	0	88.531.266
500 Inversión Física		349.320.566	349.320.566	88.531.266	25%	0	88.531.266
520 Construcciones		349.320.566	349.320.566	88.531.266	25%	0	88.531.266
17	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. San Pedro	10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	0	5.610.335.906
500 Inversión Física		10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	0	5.610.335.906
520 Construcciones		10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	0	5.610.335.906
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	53.698.653.191	12.123.513.001	4.648.713.705	38%	4.118.859.247	529.854.458
500 Inversión Física		53.698.653.191	12.123.513.001	4.648.713.705	38%	4.118.859.247	529.854.458
520 Construcciones		53.698.653.191	12.123.513.001	4.648.713.705	38%	4.118.859.247	529.854.458
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	225.199.330.151	119.929.787.573	23.207.289.930	19%	6.919.562.154	16.287.727.776
01	SP Proyecto Acueducto	4.343.252.285	3.445.169.880	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.343.252.285	3.445.169.880	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.343.252.285	3.445.169.880	0	0%	0	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	101.954.538.952	96.310.595.689	14.712.309.436	15%	6.916.501.650	7.795.807.786
100 Servicios Personales		4.348.597.291	4.278.232.881	514.046.700	12%	0	514.046.700
140 Personal Contratado		4.348.597.291	4.278.232.881	514.046.700	12%	0	514.046.700
200 Servicios No Personales		4.360.389.222	4.360.389.222	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.360.389.222	4.360.389.222	0	0%	0	0
500 Inversión Física		92.045.552.439	86.471.973.586	14.198.262.736	16%	6.916.501.650	7.281.761.086
520 Construcciones		92.045.552.439	86.471.973.586	14.198.262.736	16%	6.916.501.650	7.281.761.086
800 Transferencias		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
880 Transferencias de Capital al Sector Externo		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	1.823.970.952	1.823.970.952	60.196.500	3%	0	60.196.500
100 Servicios Personales		110.000.000	110.000.000	60.196.500	55%	0	60.196.500
140	Personal Contratado	110.000.000	110.000.000	60.196.500	55%	0	60.196.500
200 Servicios No Personales		341.487.862	341.487.862	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	341.487.862	341.487.862	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.372.483.090	1.372.483.090	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.372.483.090	1.372.483.090	0	0%	0	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	13.797.251.052	13.797.251.052	8.434.783.994	61%	3.060.504	8.431.723.490
100 Servicios Personales		110.000.000	110.000.000	56.183.400	51%	0	56.183.400
140	Personal Contratado	110.000.000	110.000.000	56.183.400	51%	0	56.183.400
200 Servicios No Personales		930.260.037	930.260.037	3.060.504	0,33%	3.060.504	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	930.260.037	930.260.037	3.060.504	0,33%	3.060.504	0
500 Inversión Física		12.756.991.015	12.756.991.015	8.375.540.090	66%	0	8.375.540.090
520	Construcciones	12.756.991.015	12.756.991.015	8.375.540.090	66%	0	8.375.540.090
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	18.015.916.910	2.288.400.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		2.096.400.000	2.096.400.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.292.000.000	192.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	192.000.000	192.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.100.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.627.516.910	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	14.627.516.910	0	0	0%	0	0
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	35.264.400.000	2.264.400.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		2.096.400.000	2.096.400.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.000.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		28.000.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	28.000.000.000	0	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.500.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.500.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.500.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.500.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.500.000.000	0	0	0%	0	0
SUBTOTAL		5.554.667.615.197	3.243.852.136.652	998.961.181.710	31%	628.916.962.266	370.044.219.444

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	60.064.498.028	60.064.498.028	15.537.491.121	26%	13.272.224.780	2.265.266.341
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	60.064.498.028	60.064.498.028	15.537.491.121	26%	13.272.224.780	2.265.266.341
800	Transferencias	60.064.498.028	60.064.498.028	15.537.491.121	26%	13.272.224.780	2.265.266.341
810	Transferencias Corrientes al Sector Público	60.064.498.028	60.064.498.028	15.537.491.121	26%	13.272.224.780	2.265.266.341
SUBTOTAL		60.064.498.028	60.064.498.028	15.537.491.121	26%	13.272.224.780	2.265.266.341
TOTAL ENTIDAD		7.269.618.688.786	4.721.519.273.038	1.437.404.894.228	30%	867.240.359.695	570.164.534.533

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
