



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL


DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera


Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	263.257.095.132	263.257.095.132	121.783.047.620	46%
200 Servicios No Personales	256.346.460.513	256.346.460.513	81.348.261.036	32%
300 Bienes de Consumo e Insumos	150.245.902.524	150.245.902.524	70.266.543.729	47%
500 Inversión Física	5.371.759.545.033	5.354.152.555.372	1.979.139.698.736	37%
600 Inversión Financiera	811.865.836.343	811.865.836.343	384.421.984.350	47%
700 Servicio de la Deuda Pública	16.126.894.000	16.126.894.000	0	0%
800 Transferencias	384.635.167.264	384.635.167.264	263.090.240.831	68%
900 Otros Gastos	19.190.648.107	19.190.648.107	18.213.585.605	95%
TOTAL ENTIDAD	7.273.427.548.916	7.255.820.559.255	2.918.263.361.907	40%

Participación Presupuestaria

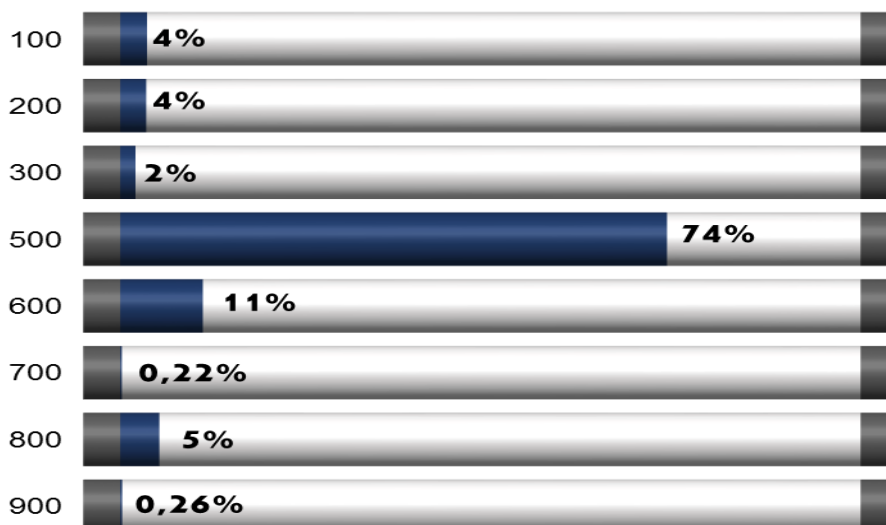


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

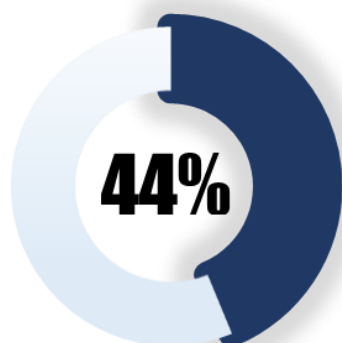


Presupuesto: \$ 251.331.290.660
Ejecutado: \$ 109.997.383.556

Recursos del Crédito Público

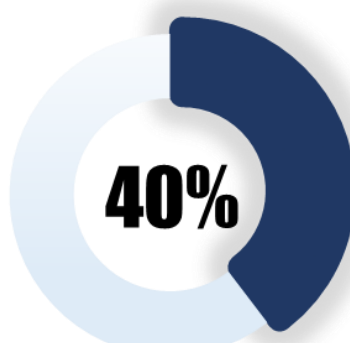

Presupuesto: \$ 6.274.019.139.334
Ejecutado: \$ 2.485.886.337.168

Recursos Institucionales

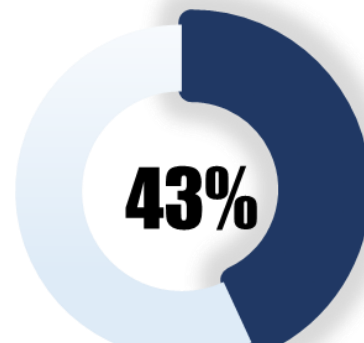

Presupuesto: \$ 748.077.118.922
Ejecutado: \$ 322.379.641.183

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.636.145.480.100	1.620.082.130.857	891.382.440.409	55%	679.970.304.841	211.412.135.568
01	Gestión Administrativa Financiera	340.539.953.078	340.539.953.078	149.078.722.601	44%	117.085.714.160	31.993.008.441
100 Servicios Personales		195.973.999.634	195.973.999.634	94.559.542.886	48%	72.215.563.727	22.343.979.159
110	Remuneraciones Básicas	146.947.557.354	146.947.557.354	67.875.818.063	46%	53.193.805.763	14.682.012.300
120	Remuneraciones Temporales	9.116.372.436	9.116.372.436	3.980.989.508	44%	3.270.902.062	710.087.446
130	Asignaciones Complementarias	19.817.259.316	19.817.259.316	10.930.513.178	55%	8.794.016.712	2.136.496.466
140	Personal Contratado	19.014.405.314	19.014.405.314	10.911.766.981	57%	6.245.951.744	4.665.815.237
190	Otros Gastos del Personal	1.078.405.214	1.078.405.214	860.455.156	80%	710.887.446	149.567.710
200 Servicios No Personales		89.691.539.256	89.691.539.256	44.705.571.467	50%	37.300.248.628	7.405.322.839
210	Servicios Básicos	3.361.666.249	3.361.666.249	3.340.845.585	99%	2.928.404.836	412.440.749
220	Transporte y Almacenaje	300.000.000	300.000.000	26.063.065	9%	26.063.065	0
230	Pasajes y Viáticos	5.628.138.378	5.628.138.378	2.106.453.007	37%	1.157.294.107	949.158.900
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.813.128.905	18.813.128.905	9.977.127.650	53%	8.469.677.084	1.507.450.566
250	Alquileres y Derechos	2.211.530.790	2.211.530.790	869.074.094	39%	603.074.094	266.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.858.073.401	12.858.073.401	5.844.469.026	45%	5.238.472.216	605.996.810
270	Servicio Social	41.982.653.533	41.982.653.533	20.644.674.477	49%	17.953.829.976	2.690.844.501
280	Otros Servicios en General	4.226.348.000	4.226.348.000	1.846.060.500	44%	923.433.250	922.627.250
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	310.000.000	310.000.000	50.804.063	16%	0	50.804.063
300 Bienes de Consumo e Insumos		32.888.095.000	32.888.095.000	4.114.694.500	13%	3.024.648.533	1.090.045.967
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.358.764.000	1.358.764.000	427.569.328	31%	270.951.180	156.618.148
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.148.000.000	2.148.000.000	76.545.680	4%	47.608.297	28.937.383
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	294.000.000	294.000.000	5.061.600	2%	0	5.061.600
360	Combustibles y Lubricantes	23.999.876.500	23.999.876.500	577.008.222	2%	64.049.586	512.958.636
390	Otros Bienes de Consumo	5.087.454.500	5.087.454.500	3.028.509.670	60%	2.642.039.470	386.470.200
500 Inversión Física		16.108.090.538	16.108.090.538	792.947.600	5%	80.947.600	712.000.000
520	Construcciones	97.167.998	97.167.998	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.787.082.917	2.787.082.917	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.511.310.423	3.511.310.423	80.947.600	2%	80.947.600	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.712.529.200	9.712.529.200	712.000.000	7%	0	712.000.000
800 Transferencias		40.000.000	40.000.000	34.800.000	87%	34.800.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.000.000	40.000.000	34.800.000	87%	34.800.000	0
900 Otros Gastos		5.838.228.650	5.838.228.650	4.871.166.148	83%	4.429.505.672	441.660.476
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	5.838.228.650	5.838.228.650	4.871.166.148	83%	4.429.505.672	441.660.476
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	262.638.850.728	262.638.850.728	194.596.892.513	74%	162.888.703.727	31.708.188.786
800 Transferencias		262.638.850.728	262.638.850.728	194.596.892.513	74%	162.888.703.727	31.708.188.786
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	262.638.850.728	262.638.850.728	194.596.892.513	74%	162.888.703.727	31.708.188.786

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	14.258.617.408	14.258.617.408	3.642.154.853	26%	2.965.210.759	676.944.094
100 Servicios Personales		5.302.052.542	5.302.052.542	2.540.683.661	48%	2.001.432.595	539.251.066
110 Remuneraciones Básicas		2.703.355.590	2.703.355.590	1.399.790.399	52%	1.199.820.342	199.970.057
120 Remuneraciones Temporales		202.624.290	202.624.290	57.316.171	28%	48.308.318	9.007.853
130 Asignaciones Complementarias		831.823.519	831.823.519	370.659.235	45%	320.953.981	49.705.254
140 Personal Contratado		1.421.249.143	1.421.249.143	682.260.256	48%	401.692.354	280.567.902
190 Otros Gastos del Personal		143.000.000	143.000.000	30.657.600	21%	30.657.600	0
200 Servicios No Personales		2.683.976.708	2.683.976.708	1.091.858.192	41%	963.778.164	128.080.028
230 Pasajes y Viáticos		363.017.194	363.017.194	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		371.959.514	371.959.514	22.858.192	6%	22.858.192	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.849.000.000	1.849.000.000	1.069.000.000	58%	940.919.972	128.080.028
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		103.987.010	103.987.010	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		27.170.000	27.170.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		61.913.010	61.913.010	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.904.000	14.904.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.008.601.148	6.008.601.148	9.613.000	0,16%	0	9.613.000
520 Construcciones		4.862.267.968	4.862.267.968	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		671.226.800	671.226.800	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		434.133.876	434.133.876	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		40.972.504	40.972.504	9.613.000	23%	0	9.613.000
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.028.730.598	7.028.730.598	2.248.240.849	32%	1.760.323.765	487.917.084
100 Servicios Personales		1.243.366.456	1.243.366.456	643.056.168	52%	515.100.863	127.955.305
120 Remuneraciones Temporales		263.767.134	263.767.134	95.933.595	36%	76.091.934	19.841.661
130 Asignaciones Complementarias		597.482.961	597.482.961	378.924.099	63%	324.896.537	54.027.562
140 Personal Contratado		219.265.361	219.265.361	105.850.444	48%	60.485.968	45.364.476
190 Otros Gastos del Personal		162.851.000	162.851.000	62.348.030	38%	53.626.424	8.721.606
200 Servicios No Personales		2.704.934.290	2.704.934.290	1.222.577.413	45%	1.176.222.902	46.354.511
230 Pasajes y Viáticos		849.516.000	849.516.000	243.931.755	29%	197.577.244	46.354.511
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		677.000.000	677.000.000	192.228.212	28%	192.228.212	0
250 Alquileres y Derechos		408.000.000	408.000.000	95.007.146	23%	95.007.146	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		770.418.290	770.418.290	691.410.300	90%	691.410.300	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		224.429.852	224.429.852	80.447.352	36%	69.000.000	11.447.352
320 Textiles y Vestuarios		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.699.852	25.699.852	11.447.352	45%	0	11.447.352
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		77.030.000	77.030.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		69.000.000	69.000.000	69.000.000	100%	69.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.700.000	23.700.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.436.000.000	2.436.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		331.000.000	331.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	0	302.159.916
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	0	302.159.916

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	58.282.655.268	58.282.655.268	21.898.112.917	38%	17.117.881.043	4.780.231.874
100 Servicios Personales		40.013.212.449	40.013.212.449	18.620.756.157	47%	15.137.880.658	3.482.875.499
110 Remuneraciones Básicas		33.896.827.367	33.896.827.367	16.080.467.538	47%	13.220.319.890	2.860.147.648
120 Remuneraciones Temporales		387.042.734	387.042.734	147.382.492	38%	119.441.149	27.941.343
130 Asignaciones Complementarias		2.935.000.000	2.935.000.000	1.517.045.678	52%	1.285.974.429	231.071.249
140 Personal Contratado		2.691.987.941	2.691.987.941	853.433.485	32%	489.718.226	363.715.259
190 Otros Gastos del Personal		102.354.407	102.354.407	22.426.964	22%	22.426.964	0
200 Servicios No Personales		6.204.128.006	6.204.128.006	630.869.623	10%	565.411.094	65.458.529
230 Pasajes y Viáticos		1.088.928.005	1.088.928.005	124.310.280	11%	63.692.771	60.617.509
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.902.275.699	3.902.275.699	283.208.333	7%	283.208.333	0
250 Alquileres y Derechos		150.000.000	150.000.000	27.871.110	19%	23.030.090	4.841.020
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.055.724.302	1.055.724.302	195.479.900	19%	195.479.900	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.676.940.454	4.676.940.454	2.285.750.925	49%	1.408.710.221	877.040.704
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		178.672.000	178.672.000	70.000.000	39%	70.000.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		66.220.412	66.220.412	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.181.249.600	1.181.249.600	1.181.246.275	100%	1.181.246.275	0
360 Combustibles y Lubricantes		3.250.798.442	3.250.798.442	1.034.504.650	32%	157.463.946	877.040.704
500 Inversión Física		7.296.100.547	7.296.100.547	360.736.212	5%	5.879.070	354.857.142
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		7.284.342.407	7.284.342.407	354.857.142	5%	0	354.857.142
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		11.758.140	11.758.140	5.879.070	50%	5.879.070	0
800 Transferencias		92.273.812	92.273.812	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
890 Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	1.758.395.960	1.758.395.960	865.199.376	49%	604.342.887	260.856.489
100 Servicios Personales		917.386.800	917.386.800	413.028.042	45%	327.413.394	85.614.648
120 Remuneraciones Temporales		248.000.000	248.000.000	62.667.607	25%	49.833.700	12.833.907
130 Asignaciones Complementarias		517.000.000	517.000.000	273.426.424	53%	233.268.202	40.158.222
140 Personal Contratado		152.386.800	152.386.800	76.934.011	50%	44.311.492	32.622.519
200 Servicios No Personales		581.000.000	581.000.000	452.171.334	78%	276.929.493	175.241.841
230 Pasajes y Viáticos		581.000.000	581.000.000	452.171.334	78%	276.929.493	175.241.841
500 Inversión Física		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.830.000.000	1.830.000.000	85.000.000	5%	85.000.000	0
200 Servicios No Personales		495.000.000	495.000.000	85.000.000	17%	85.000.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	325.000.000	325.000.000	15.000.000	5%	15.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	170.000.000	170.000.000	70.000.000	41%	70.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.035.000.000	1.035.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	255.000.000	255.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.922.420.000	1.922.420.000	591.620.814	31%	541.411.813	50.209.001
200 Servicios No Personales		1.402.420.000	1.402.420.000	591.620.814	42%	541.411.813	50.209.001
230	Pasajes y Viáticos	227.500.000	227.500.000	81.908.131	36%	45.001.555	36.906.576
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	884.720.000	884.720.000	295.212.683	33%	281.910.258	13.302.425
250	Alquileres y Derechos	290.200.000	290.200.000	214.500.000	74%	214.500.000	0
500 Inversión Física		520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	79.325.065.618	79.325.065.618	23.175.329.542	29%	18.669.860.036	4.505.469.506
200 Servicios No Personales		319.420.000	319.420.000	165.685.561	52%	151.211.583	14.473.978
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	169.020.000	169.020.000	74.352.697	44%	59.878.719	14.473.978
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	91.332.864	83%	91.332.864	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		869.531.531	869.531.531	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	50.321.531	50.321.531	0	0%	0	0
330	Produtos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	159.210.000	159.210.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		77.176.114.087	77.176.114.087	22.549.643.981	29%	18.058.648.453	4.490.995.528
520	Construcciones	77.171.074.087	77.171.074.087	22.549.643.981	29%	18.058.648.453	4.490.995.528
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.040.000	5.040.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	460.000.000	48%	460.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100%	460.000.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	13.769.129.710	13.769.129.710	1.619.043.654	12%	1.619.043.654	0
200 Servicios No Personales		1.339.121.393	1.339.121.393	1.305.420.818	97%	1.305.420.818	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.339.121.393	1.339.121.393	1.305.420.818	97%	1.305.420.818	0
500 Inversión Física		12.430.008.317	12.430.008.317	313.622.836	3%	313.622.836	0
520	Construcciones	12.011.927.889	12.011.927.889	313.622.836	3%	313.622.836	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	418.080.428	418.080.428	0	0%	0	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	4.684.251.431	4.684.251.431	3.226.526.936	69%	0	3.226.526.936
200 Servicios No Personales		101.124.991	101.124.991	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	101.124.991	101.124.991	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.583.126.440	4.583.126.440	3.226.526.936	70%	0	3.226.526.936
520	Construcciones	4.583.126.440	4.583.126.440	3.226.526.936	70%	0	3.226.526.936
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	39.633.115.403	23.569.766.160	8.277.601.060	35%	5.983.817.239	2.293.783.821
100 Servicios Personales		264.864.936	264.864.936	65.340.000	25%	40.392.000	24.948.000
140	Personal Contratado	263.981.361	263.981.361	65.340.000	25%	40.392.000	24.948.000
190	Otros Gastos de Personal	883.575	883.575	0	0%	0	0
500 Inversión Física		39.117.881.290	23.054.532.047	8.212.261.060	36%	5.943.425.239	2.268.835.821
520	Construcciones	35.576.668.345	19.513.319.102	5.943.425.239	30%	5.943.425.239	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.541.212.945	3.541.212.945	2.268.835.821	64%	0	2.268.835.821
800 Transferencias		250.369.177	250.369.177	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.369.177	250.369.177	0	0%	0	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	10.603.443.253	10.603.443.253	3.474.788.025	33%	1.027.050.969	2.447.737.056
500 Inversión Física		10.603.443.253	10.603.443.253	3.474.788.025	33%	1.027.050.969	2.447.737.056
520	Construcciones	10.603.443.253	10.603.443.253	3.474.788.025	33%	1.027.050.969	2.447.737.056
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	48.850.402.549	48.850.402.549	42.942.787.554	88%	25.867.568.371	17.075.219.183
200 Servicios No Personales		340.628.517	340.628.517	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	340.628.517	340.628.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		32.655.718.392	32.655.718.392	27.088.731.914	83%	10.013.512.731	17.075.219.183
520	Construcciones	32.655.718.391	32.655.718.391	27.088.731.914	83%	10.013.512.731	17.075.219.183
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1	1	0	0%	0	0
800 Transferencias		15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	5.601.979.826	5.601.979.826	3.012.293.409	54%	3.012.293.409	0
200 Servicios No Personales		231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.460.136.618	4.460.136.618	3.012.293.409	68%	3.012.293.409	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	4.460.136.618	4.460.136.618	3.012.293.409	68%	3.012.293.409	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	13.357.188.338	13.357.188.338	5.565.324.213	42%	5.331.679.316	233.644.897
200 Servicios No Personales		2.201.949.213	2.201.949.213	1.316.030.778	60%	1.082.385.881	233.644.897
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.201.949.213	2.201.949.213	1.316.030.778	60%	1.082.385.881	233.644.897
500 Inversión Física		11.125.733.167	11.125.733.167	4.249.293.435	38%	4.249.293.435	0
520	Construcciones	11.025.616.810	11.025.616.810	4.249.293.435	39%	4.249.293.435	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.116.357	100.116.357	0	0%	0	0
800 Transferencias		29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	114.182.696.846	114.182.696.846	98.099.704.513	86%	77.852.086.085	20.247.618.428
500 Inversión Física		114.182.696.846	114.182.696.846	98.099.704.513	86%	77.852.086.085	20.247.618.428
520	Construcciones	113.441.487.584	113.441.487.584	98.099.704.513	86%	77.852.086.085	20.247.618.428
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	741.209.262	741.209.262	0	0%	0	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	53.720.440.165	53.720.440.165	25.176.273.903	47%	5.786.162.570	19.390.111.333
500 Inversión Física		53.368.224.265	53.368.224.265	25.176.273.903	47%	5.786.162.570	19.390.111.333
520	Construcciones	40.643.182.446	40.643.182.446	25.176.273.903	62%	5.786.162.570	19.390.111.333
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	12.725.041.819	12.725.041.819	0	0%	0	0
800 Transferencias		352.215.900	352.215.900	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	352.215.900	352.215.900	0	0%	0	0
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	11.319.791.762	11.319.791.762	8.767.084.866	77%	8.084.205.788	682.879.078
500 Inversión Física		11.118.122.162	11.118.122.162	8.767.084.866	79%	8.084.205.788	682.879.078
520	Construcciones	9.637.513.338	9.637.513.338	8.084.205.788	84%	8.084.205.788	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.480.608.824	1.480.608.824	682.879.078	46%	0	682.879.078
800 Transferencias		201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	164.187.260.936	164.187.260.936	74.103.050.541	45%	55.026.176.625	19.076.873.916
500 Inversión Física		164.187.260.936	164.187.260.936	74.103.050.541	45%	55.026.176.625	19.076.873.916
510	Adquisición de Inmuebles	848.128.304	848.128.304	0	0%	0	0
520	Construcciones	160.950.664.084	160.950.664.084	72.227.113.017	45%	55.026.176.625	17.200.936.392
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.888.468.548	1.888.468.548	1.875.937.524	99%	0	1.875.937.524
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	170.008.894.258	170.008.894.258	80.681.194.395	47%	66.338.454.915	14.342.739.480
500 Inversión Física		170.008.894.258	170.008.894.258	80.681.194.395	47%	66.338.454.915	14.342.739.480
520	Construcciones	170.008.894.258	170.008.894.258	80.681.194.395	47%	66.338.454.915	14.342.739.480
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
500 Inversión Física		11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
520	Construcciones	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	34.043.679.896	34.043.679.896	4.983.777.677	15%	3.991.964.216	991.813.461
100 Servicios Personales		4.886.680.000	4.886.680.000	1.688.000.000	35%	1.236.900.000	451.100.000
140	Personal Contratado	4.865.780.000	4.865.780.000	1.667.100.000	34%	1.216.000.000	451.100.000
190	Otros Gastos del Personal	20.900.000	20.900.000	20.900.000	100%	20.900.000	0
200 Servicios No Personales		7.616.254.042	7.616.254.042	2.555.385.127	34%	2.357.056.166	198.328.961
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.616.254.042	7.616.254.042	2.555.385.127	34%	2.357.056.166	198.328.961
500 Inversión Física		18.940.510.734	18.940.510.734	0	0%	0	0
520	Construcciones	16.042.719.409	16.042.719.409	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.697.791.325	2.697.791.325	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.600.235.120	2.600.235.120	740.392.550	28%	398.008.050	342.384.500
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.305.235.120	1.305.235.120	575.392.550	44%	398.008.050	177.384.500
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	1.295.000.000	1.295.000.000	165.000.000	13%	0	165.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	56.795.915.078	56.795.915.078	50.056.672.155	88%	18.019.364.102	32.037.308.053
500 Inversión Física		56.795.915.078	56.795.915.078	50.056.672.155	88%	18.019.364.102	32.037.308.053
520	Construcciones	56.795.915.078	56.795.915.078	50.056.672.155	88%	18.019.364.102	32.037.308.053
41	Ejec de Conv de Coop con el MSPYBS bajo la Ley de Emergencia	781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
500 Inversión Física		781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
520	Construcciones	781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	86.493.426.100	86.493.426.100	79.826.295.669	92%	75.196.873.531	4.629.422.138
500 Inversión Física		86.493.426.100	86.493.426.100	79.826.295.669	92%	75.196.873.531	4.629.422.138
520	Construcciones	86.493.426.100	86.493.426.100	79.826.295.669	92%	75.196.873.531	4.629.422.138
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	694.280.715	121.632.513
500 Inversión Física		3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	694.280.715	121.632.513
520	Construcciones	3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	694.280.715	121.632.513
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	1.271.721.342	1.271.721.342	293.944.668	23%	141.944.668	152.000.000
500 Inversión Física		1.271.721.342	1.271.721.342	293.944.668	23%	141.944.668	152.000.000
520	Construcciones	1.271.721.342	1.271.721.342	293.944.668	23%	141.944.668	152.000.000
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	7.559.450.000	7.559.450.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		371.200.000	371.200.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	292.000.000	292.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.110.000.000	5.110.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.110.000.000	5.110.000.000	0	0%	0	0
700 Servicios de la Deuda Pública		1.968.750.000	1.968.750.000	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	1.968.750.000	1.968.750.000	0	0%	0	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	897.900.000	897.900.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		94.900.000	94.900.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		730.000.000	730.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	730.000.000	730.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	970.900.000	970.900.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		73.000.000	73.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		167.900.000	167.900.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		730.000.000	730.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		730.000.000	730.000.000	0	0%	0	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Sur	14.286.007.790	14.286.007.790	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.286.007.790	14.286.007.790	0	0%	0	0
520 Construcciones		14.286.007.790	14.286.007.790	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.636.145.480.100	1.620.082.130.857	891.382.440.409	55%	679.970.304.841	211.412.135.568

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.599.160.991.535	4.597.617.351.117	1.728.587.668.797	38%	1.342.489.391.824	386.098.276.973
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	3.935.754.251	3.935.754.251	144.772.770	4%	38.407.744	106.365.026
100 Servicios Personales		180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.054.582.000	1.054.582.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.054.582.000	1.054.582.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.700.772.251	2.700.772.251	144.772.770	5%	38.407.744	106.365.026
520 Construcciones		2.334.648.049	2.334.648.049	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		366.124.202	366.124.202	144.772.770	40%	38.407.744	106.365.026
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	143.855.107.233	143.855.107.233	83.032.095.802	58%	39.408.639.539	43.623.456.263
200 Servicios No Personales		1.684.349.148	1.684.349.148	25.834.798	2%	22.742.068	3.092.730
230 Pasajes y Viáticos		200.000.000	200.000.000	25.834.798	13%	22.742.068	3.092.730
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.484.349.148	1.484.349.148	0	0%	0	0
500 Inversión Física		142.170.758.085	142.170.758.085	83.006.261.004	58%	39.385.897.471	43.620.363.533
520 Construcciones		142.170.758.085	142.170.758.085	83.006.261.004	58%	39.385.897.471	43.620.363.533

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	151.961.330.429	151.961.330.429	20.628.097.535	14%	14.262.402.964	6.365.694.571
200 Servicios No Personales		1.656.084.809	1.656.084.809	120.445.253	7%	116.245.253	4.200.000
230	Pasajes y Viáticos	6.999.999	6.999.999	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.649.084.810	1.649.084.810	120.445.253	7%	116.245.253	4.200.000
500 Inversión Física		149.305.245.620	149.305.245.620	20.405.546.357	14%	14.146.157.711	6.259.388.646
520	Construcciones	147.647.595.373	147.647.595.373	20.405.546.357	14%	14.146.157.711	6.259.388.646
580	Estudios y Proyectos de Inversión	162.388.114	162.388.114	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.495.262.133	1.495.262.133	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	102.105.925	10%	0	102.105.925
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	102.105.925	10%	0	102.105.925
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	295.997.219.680	295.997.219.680	112.244.708.119	38%	73.799.123.552	38.445.584.567
200 Servicios No Personales		142.720.000	142.720.000	1.546.365	1%	0	1.546.365
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	1.546.365	2%	0	1.546.365
250	Alquileres y Derechos	42.720.000	42.720.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		295.854.499.680	295.854.499.680	112.243.161.754	38%	73.799.123.552	38.444.038.202
520	Construcciones	293.657.583.786	293.657.583.786	112.116.361.494	38%	73.672.323.292	38.444.038.202
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.196.915.894	2.196.915.894	126.800.260	6%	126.800.260	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.100.000.000	5.100.000.000	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	23.868.656.953	23.868.656.953	851.276.677	4%	781.944.816	69.331.861
200 Servicios No Personales		3.387.266.405	3.387.266.405	114.840.000	3%	114.840.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.387.266.405	3.387.266.405	114.840.000	3%	114.840.000	0
500 Inversión Física		20.481.390.548	20.481.390.548	736.436.677	4%	667.104.816	69.331.861
520	Construcciones	15.300.502.010	15.300.502.010	736.436.677	5%	667.104.816	69.331.861
580	Estudios y Proyectos de Inversión	80.888.538	80.888.538	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.100.000.000	5.100.000.000	0	0%	0	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	76.071.923.288	76.071.923.288	34.354.029.921	45%	25.870.915.055	8.483.114.866
200 Servicios No Personales		1.730.509.180	1.730.509.180	99.386.918	6%	17.067.457	82.319.461
230	Pasajes y Viáticos	38.000.000	38.000.000	24.386.918	64%	17.067.457	7.319.461
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.692.509.180	1.692.509.180	75.000.000	4%	0	75.000.000
500 Inversión Física		74.341.414.108	74.341.414.108	34.254.643.003	46%	25.853.847.598	8.400.795.405
520	Construcciones	57.903.372.154	57.903.372.154	34.254.643.003	59%	25.853.847.598	8.400.795.405
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	16.438.041.954	16.438.041.954	0	0%	0	0
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	58.622.148.974	58.622.148.974	28.422.127.647	48%	23.622.497.129	4.799.630.518
200 Servicios No Personales		3.116.510.147	3.116.510.147	1.258.507.574	40%	1.084.688.327	173.819.247
230	Pasajes y Viáticos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.076.510.147	3.076.510.147	1.258.507.574	41%	1.084.688.327	173.819.247
500 Inversión Física		55.505.638.827	55.505.638.827	27.163.620.073	49%	22.537.808.802	4.625.811.271
520	Construcciones	55.505.638.827	55.505.638.827	27.163.620.073	49%	22.537.808.802	4.625.811.271

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	23.682.613.948	23.682.613.948	18.771.360.667	79%	18.260.567.901	510.792.766
200 Servicios No Personales		35.000.000	35.000.000	16.433.685	47%	12.103.863	4.329.822
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	16.433.685	47%	12.103.863	4.329.822
500 Inversión Física		23.647.613.948	23.647.613.948	18.754.926.982	79%	18.248.464.038	506.462.944
520	Construcciones	22.647.613.948	22.647.613.948	18.754.926.982	83%	18.248.464.038	506.462.944
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	10.608.576.888	10.608.576.888	5.208.977.263	49%	4.220.900.908	988.076.355
500 Inversión Física		10.608.576.888	10.608.576.888	5.208.977.263	49%	4.220.900.908	988.076.355
520	Construcciones	10.608.576.888	10.608.576.888	5.208.977.263	49%	4.220.900.908	988.076.355
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	71.505.414.522	71.505.414.522	22.223.779.927	31%	20.154.957.046	2.068.822.881
100 Servicios Personales		760.115.000	760.115.000	349.800.000	46%	291.500.000	58.300.000
130	Asignaciones Complementarias	60.515.000	60.515.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	699.600.000	699.600.000	349.800.000	50%	291.500.000	58.300.000
200 Servicios No Personales		2.009.716.582	2.009.716.582	73.804.238	4%	13.719.238	60.085.000
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	13.719.238	23%	13.719.238	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.949.716.582	1.949.716.582	60.085.000	3%	0	60.085.000
500 Inversión Física		68.735.582.940	68.735.582.940	21.800.175.689	32%	19.849.737.808	1.950.437.881
520	Construcciones	68.735.582.940	68.735.582.940	21.800.175.689	32%	19.849.737.808	1.950.437.881
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	94.522.452.792	94.522.452.792	51.328.989.089	54%	43.857.299.082	7.471.690.007
100 Servicios Personales		61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.021.287.230	4.021.287.230	232.000.000	6%	191.000.000	41.000.000
220	Transporte Y Almacenaje	138.324.789	138.324.789	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	3.738.962.441	3.738.962.441	232.000.000	6%	191.000.000	41.000.000
290	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	0	214.187.822
320	Textiles Y Vestuarios	214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	0	214.187.822
500 Inversión Física		90.145.097.740	90.145.097.740	50.882.801.267	56%	43.666.299.082	7.216.502.185
520	Construcciones	86.531.049.740	86.531.049.740	49.573.100.251	57%	42.356.598.066	7.216.502.185
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.365.890.119	3.365.890.119	1.309.701.016	39%	1.309.701.016	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	248.157.881	248.157.881	0	0%	0	0
800 Transferencias		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	9.953.171.547	9.953.171.547	4.485.554.367	45%	3.582.486.716	903.067.651
200 Servicios No Personales		6.042.007.455	6.042.007.455	1.882.918.215	31%	979.850.564	903.067.651
230	Pasajes y Viáticos	6.042.007.455	6.042.007.455	1.882.918.215	31%	979.850.564	903.067.651
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.138.575.116	3.138.575.116	2.602.636.152	83%	2.602.636.152	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	49.868.185	49.868.185	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	3.088.706.931	3.088.706.931	2.602.636.152	84%	2.602.636.152	0
500 Inversión Física		772.588.976	772.588.976	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	772.588.976	772.588.976	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0
500 Inversión Física		33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0
520	Construcciones	33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	35.114.637.349	35.114.637.349	8.788.678.560	25%	205.670.304	8.583.008.256
500 Inversión Física		35.114.637.349	35.114.637.349	8.788.678.560	25%	205.670.304	8.583.008.256
520 Construcciones		35.114.637.349	35.114.637.349	8.788.678.560	25%	205.670.304	8.583.008.256
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.883.228.228	3.883.228.228	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
500 Inversión Física		105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
520 Construcciones		105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	4.039.288.711	4.039.288.711	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		370.000.000	370.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		370.000.000	370.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.669.288.711	3.669.288.711	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.655.523.079	3.655.523.079	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		13.765.632	13.765.632	0	0%	0	0
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
500 Inversión Física		704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
520 Construcciones		704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	21.091.231.810	21.091.231.810	8.087.840.320	38%	7.884.991.803	202.848.517
500 Inversión Física		20.747.346.752	20.747.346.752	7.743.955.262	37%	7.541.106.745	202.848.517
520 Construcciones		20.544.498.235	20.544.498.235	7.541.106.745	37%	7.541.106.745	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		202.848.517	202.848.517	202.848.517	100%	0	202.848.517
800 Transferencias		343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	942.905.079	942.905.079	0	0%	0	0
500 Inversión Física		938.222.388	938.222.388	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		938.222.388	938.222.388	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	850.741.979.650	850.741.979.650	408.078.859.302	48%	404.909.857.113	3.169.002.189
200 Servicios No Personales		10.901.720.261	10.901.720.261	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.301.720.261	7.301.720.261	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.030.399.616	9.030.399.616	6.864.519.989	76%	4.266.997.658	2.597.522.331
520	Construcciones	494.632.451	494.632.451	92.079.414	19%	92.079.414	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.535.767.165	8.535.767.165	6.772.440.575	79%	4.174.918.244	2.597.522.331
600 Inversión Financiera		811.865.836.343	811.865.836.343	384.421.984.350	47%	384.421.984.350	0
630	Préstamos al Sector Privado	811.865.836.343	811.865.836.343	384.421.984.350	47%	384.421.984.350	0
800 Transferencias		18.944.023.430	18.944.023.430	16.792.354.963	89%	16.220.875.105	571.479.858
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.786.423.430	3.786.423.430	1.634.754.963	43%	1.063.275.105	571.479.858
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.157.600.000	15.157.600.000	15.157.600.000	100%	15.157.600.000	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	13.497.560.024	13.497.560.024	4.936.860.493	37%	4.284.058.265	652.802.228
500 Inversión Física		12.704.835.337	12.704.835.337	4.936.860.493	39%	4.284.058.265	652.802.228
520	Construcciones	8.015.324.713	8.015.324.713	3.534.073.400	44%	3.534.073.400	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.689.510.624	4.689.510.624	1.402.787.093	30%	749.984.865	652.802.228
800 Transferencias		792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.543.640.418	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
500 Inversión Física		6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
520	Construcciones	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	32.471.551.502	32.471.551.502	16.119.771.113	50%	12.172.245.648	3.947.525.465
200 Servicios No Personales		2.694.313.987	2.694.313.987	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.694.313.987	2.694.313.987	0	0%	0	0
500 Inversión Física		29.777.237.515	29.777.237.515	16.119.771.113	54%	12.172.245.648	3.947.525.465
520	Construcciones	28.768.146.345	28.768.146.345	15.615.225.528	54%	12.172.245.648	3.442.979.880
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.009.091.170	1.009.091.170	504.545.585	50%	0	504.545.585
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	28.007.845.135	28.007.845.135	16.281.274.541	58%	14.298.249.572	1.983.024.969
100 Servicios Personales		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		26.725.445.135	26.725.445.135	16.281.274.541	61%	14.298.249.572	1.983.024.969
520	Construcciones	25.725.445.135	25.725.445.135	16.281.274.541	63%	14.298.249.572	1.983.024.969
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	129.311.178.541	129.311.178.541	16.295.388.136	13%	14.448.160.374	1.847.227.762
200 Servicios No Personales		6.714.382.472	6.714.382.472	3.437.321.274	51%	2.385.757.446	1.051.563.828
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	3.491.968	6%	3.491.968	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.654.382.472	6.654.382.472	3.433.829.306	52%	2.382.265.478	1.051.563.828
500 Inversión Física		122.596.796.069	122.596.796.069	12.858.066.862	10%	12.062.402.928	795.663.934
520	Construcciones	122.596.796.069	122.596.796.069	12.858.066.862	10%	12.062.402.928	795.663.934
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	321.983.592.126	321.983.592.126	244.010.097.369	76%	154.896.535.421	89.113.561.948
100 Servicios Personales		1.132.000.000	1.132.000.000	311.166.894	27%	207.444.596	103.722.298
140	Personal Contratado	1.132.000.000	1.132.000.000	311.166.894	27%	207.444.596	103.722.298
200 Servicios No Personales		20.786.389.503	20.786.389.503	7.085.571.355	34%	5.171.322.821	1.914.248.534
230	Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	6.185.460	2%	0	6.185.460
260	Servicios Técnicos y Profesionales	20.536.389.503	20.536.389.503	7.079.385.895	34%	5.171.322.821	1.908.063.074
500 Inversión Física		286.722.783.166	286.722.783.166	223.270.939.663	78%	149.517.768.004	73.753.171.659
520	Construcciones	282.822.783.166	282.822.783.166	223.270.939.663	79%	149.517.768.004	73.753.171.659
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	0	13.342.419.457
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	0	13.342.419.457
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	2.155.117.962	2.155.117.962	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.935.117.962	1.935.117.962	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.935.117.962	1.935.117.962	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	191.624.339.800	191.624.339.800	113.255.196.359	59%	84.131.526.592	29.123.669.767
100 Servicios Personales		704.000.000	704.000.000	316.800.000	45%	87.600.000	229.200.000
140	Personal Contratado	704.000.000	704.000.000	316.800.000	45%	87.600.000	229.200.000
200 Servicios No Personales		1.324.636.094	1.324.636.094	48.071.116	4%	31.639.502	16.431.614
220	Transporte y Almacenaje	174.672.505	174.672.505	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	455.911.464	455.911.464	48.071.116	11%	31.639.502	16.431.614
260	Servicios Técnicos y Profesionales	694.052.125	694.052.125	0	0%	0	0
500 Inversión Física		189.595.703.706	189.595.703.706	112.890.325.243	60%	84.012.287.090	28.878.038.153
520	Construcciones	184.528.705.964	184.528.705.964	112.890.325.243	61%	84.012.287.090	28.878.038.153
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.066.997.742	5.066.997.742	0	0%	0	0
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	4.455.641.375	4.455.641.375	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.455.641.375	4.455.641.375	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.455.641.375	4.455.641.375	0	0%	0	0
61	Mejoramiento de Caminos Departamento San Pedro	2.592.413.979	2.592.413.979	230.312.170	9%	0	230.312.170
500 Inversión Física		2.592.413.979	2.592.413.979	230.312.170	9%	0	230.312.170
520	Construcciones	2.519.619.966	2.519.619.966	157.518.157	6%	0	157.518.157
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	72.794.013	72.794.013	72.794.013	100%	0	72.794.013

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento de Caminos Departamento Cordillera	30	30	0	0%	0	0
500 Inversión Física		30	30	0	0%	0	0
520 Construcciones		30	30	0	0%	0	0
64	Mejoramiento de Caminos Departamento Ñeembucú	1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
500 Inversión Física		1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
520 Construcciones		1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
65	Mejoramiento de Caminos Departamento Itapúa	3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	1.924.357.267	922.775.210
500 Inversión Física		3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	1.924.357.267	922.775.210
520 Construcciones		3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	1.924.357.267	922.775.210
66	Mejoramiento de Caminos Departamento Central	6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
500 Inversión Física		6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
520 Construcciones		6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
68	Mejoramiento de Caminos Departamento Guairá	1.529.319.170	1.529.319.170	298.818.478	19%	298.818.478	0
500 Inversión Física		1.529.319.170	1.529.319.170	298.818.478	19%	298.818.478	0
520 Construcciones		1.529.319.170	1.529.319.170	298.818.478	19%	298.818.478	0
69	Mejoramiento de Caminos Departamento Caaguazú	17.824.843.923	17.824.843.923	830.292.453	5%	830.292.453	0
500 Inversión Física		17.824.843.923	17.824.843.923	830.292.453	5%	830.292.453	0
520 Construcciones		17.824.843.923	17.824.843.923	830.292.453	5%	830.292.453	0
70	Mejoramiento de Caminos Departamento Alto Paraná	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
500 Inversión Física		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
520 Construcciones		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
71	Mejoramiento de Caminos Departamento Misiones	726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
500 Inversión Física		726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
520 Construcciones		726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
72	Mejoramiento de Caminos Departamento Canindeyú	24.121.947.715	24.121.947.715	4.133.617.339	17%	0	4.133.617.339
500 Inversión Física		24.121.947.715	24.121.947.715	4.133.617.339	17%	0	4.133.617.339
520 Construcciones		24.121.947.715	24.121.947.715	4.133.617.339	17%	0	4.133.617.339
73	Mejoramiento de Caminos Departamento Concepción	9.857.865.966	9.857.865.966	5.629.495.552	57%	5.629.495.552	0
500 Inversión Física		9.857.865.966	9.857.865.966	5.629.495.552	57%	5.629.495.552	0
520 Construcciones		9.857.865.966	9.857.865.966	5.629.495.552	57%	5.629.495.552	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	375.076.139.240	375.076.139.240	122.303.137.162	33%	96.427.137.240	25.875.999.922
200 Servicios No Personales		421.965.518	421.965.518	60.500.000	14%	9.075.000	51.425.000
230 Pasajes y Viáticos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		50.031.201	50.031.201	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		351.934.317	351.934.317	60.500.000	17%	9.075.000	51.425.000
500 Inversión Física		373.174.173.722	373.174.173.722	121.889.691.433	33%	96.353.001.431	25.536.690.002
520 Construcciones		339.729.700.020	339.729.700.020	112.954.238.834	33%	91.946.100.939	21.008.137.895
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		44.473.702	44.473.702	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		33.400.000.000	33.400.000.000	8.935.452.599	27%	4.406.900.492	4.528.552.107
800 Transferencias		1.480.000.000	1.480.000.000	352.945.729	24%	65.060.809	287.884.920
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.480.000.000	1.480.000.000	352.945.729	24%	65.060.809	287.884.920

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	128.022.066.570	128.022.066.570	17.800.323.381	14%	14.228.128.577	3.572.194.804
200 Servicios No Personales		320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		126.902.066.570	126.902.066.570	17.392.564.396	14%	14.190.680.230	3.201.884.166
520	Construcciones	123.001.842.624	123.001.842.624	16.996.947.179	14%	14.190.680.230	2.806.266.949
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.223.946	3.900.223.946	395.617.217	10%	0	395.617.217
800 Transferencias		800.000.000	800.000.000	407.758.985	51%	37.448.347	370.310.638
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	800.000.000	800.000.000	407.758.985	51%	37.448.347	370.310.638
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	236.883.925.138	236.883.925.138	179.132.048.814	76%	137.782.677.897	41.349.370.917
200 Servicios No Personales		1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
500 Inversión Física		235.731.925.138	235.731.925.138	179.061.648.814	76%	137.712.277.897	41.349.370.917
520	Construcciones	229.929.924.859	229.929.924.859	178.116.224.604	77%	136.766.853.687	41.349.370.917
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.302.000.279	3.302.000.279	945.424.210	29%	945.424.210	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	206.906.324.047	206.906.324.047	62.004.404.939	30%	49.984.167.481	12.020.237.458
200 Servicios No Personales		1.980.000	1.980.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.980.000	1.980.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		206.904.344.047	206.904.344.047	62.004.404.939	30%	49.984.167.481	12.020.237.458
520	Construcciones	200.154.344.048	200.154.344.048	61.728.507.133	31%	49.736.920.393	11.991.586.740
580	Estudios y Proyectos de Inversión	4.149.999.999	4.149.999.999	275.897.806	7%	247.247.088	28.650.718
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0%	0	0
82	SP Pav. Asf. Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque	1.737.790.658	1.737.790.658	168.898.618	10%	0	168.898.618
500 Inversión Física		1.737.790.658	1.737.790.658	168.898.618	10%	0	168.898.618
520	Construcciones	1.568.892.040	1.568.892.040	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	168.898.618	168.898.618	168.898.618	100%	0	168.898.618
85	SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF, COMP, RN 10)	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
86	SP Mej. Gestión y Mant de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)	1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	0	1.603.442.610
500 Inversión Física		1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	0	1.603.442.610
520	Construcciones	1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	0	1.603.442.610
87	Mejoramiento Tramvesía Urbana de Coronel Oviedo	21.900.000.000	21.900.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.900.000.000	21.900.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	21.900.000.000	21.900.000.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	12.985.187.477	12.985.187.477	9.398.167.738	72%	6.057.484.123	3.340.683.615
500 Inversión Física		12.985.187.477	12.985.187.477	9.398.167.738	72%	6.057.484.123	3.340.683.615
520	Construcciones	12.985.187.477	12.985.187.477	9.398.167.738	72%	6.057.484.123	3.340.683.615

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
89	SP AP. Pre. Prog. de Mod. del Sec. Tra. PY ATN/OC- 11921-PR	1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión		1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
91	SP Pav.Corred. de Integr.Rehab. y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
500 Inversión Física		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
520 Construcciones		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	157.105.263.286	157.105.263.286	22.580.009.233	14%	14.876.975.605	7.703.033.628
200 Servicios No Personales		3.352.765.263	3.352.765.263	124.965.500	4%	0	124.965.500
230 Pasajes y Viáticos		41.000.000	41.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.311.765.263	3.311.765.263	124.965.500	4%	0	124.965.500
500 Inversión Física		152.152.498.023	152.152.498.023	22.455.043.733	15%	14.876.975.605	7.578.068.128
520 Construcciones		140.965.330.335	140.965.330.335	22.455.043.733	16%	14.876.975.605	7.578.068.128
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		11.187.167.688	11.187.167.688	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.600.000.000	1.600.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.600.000.000	1.600.000.000	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	88.614.000.000	88.614.000.000	29.310.283.374	33%	10.554.471.026	18.755.812.348
200 Servicios No Personales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		88.110.000.000	88.110.000.000	29.310.283.374	33%	10.554.471.026	18.755.812.348
520 Construcciones		87.280.000.000	87.280.000.000	29.310.283.374	34%	10.554.471.026	18.755.812.348
580 Estudios y Proyectos de Inversión		480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	100.857.993.548	100.857.993.548	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.857.993.548	100.857.993.548	0	0%	0	0
520 Construcciones		100.857.993.548	100.857.993.548	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	451.794.865.061	451.794.865.061	27.448.381.866	6%	15.305.416.899	12.142.964.967
100 Servicios Personales		1.360.670.024	1.360.670.024	669.335.012	49%	466.112.510	203.222.502
140 Personal Contratado		1.360.670.024	1.360.670.024	669.335.012	49%	466.112.510	203.222.502
200 Servicios No Personales		124.000.000	124.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		450.110.195.037	450.110.195.037	26.779.046.854	6%	14.839.304.389	11.939.742.465
520 Construcciones		449.810.195.037	449.810.195.037	26.779.046.854	6%	14.839.304.389	11.939.742.465
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	96.462.564.220	96.462.564.220	14.642.301.487	15%	12.821.666.553	1.820.634.934
200 Servicios No Personales		2.867.780.519	2.867.780.519	229.514.625	8%	83.084.168	146.430.457
230	Pasajes y Viáticos	800.000.000	800.000.000	229.514.625	29%	83.084.168	146.430.457
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.067.780.519	2.067.780.519	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.140.406.450	22.140.406.450	13.339.044.765	60%	12.738.582.385	600.462.380
360	Combustibles y Lubricantes	3.918.297.531	3.918.297.531	3.871.109.540	99%	3.660.757.040	210.352.500
390	Otros Bienes de Consumo	18.222.108.919	18.222.108.919	9.467.935.225	52%	9.077.825.345	390.109.880
500 Inversión Física		63.830.766.434	63.830.766.434	0	0%	0	0
520	Construcciones	63.830.766.434	63.830.766.434	0	0%	0	0
800 Transferencias		7.623.610.817	7.623.610.817	1.073.742.097	14%	0	1.073.742.097
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.549.868.720	6.549.868.720	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.073.742.097	1.073.742.097	1.073.742.097	100%	0	1.073.742.097
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	610.282.612.157	610.282.612.157	217.624.814.709	36%	167.466.234.164	50.158.580.545
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	2.856.245.387	2.856.245.387	319.485.030	11%	0	319.485.030
500 Inversión Física		2.856.245.387	2.856.245.387	319.485.030	11%	0	319.485.030
520	Construcciones	2.856.245.387	2.856.245.387	319.485.030	11%	0	319.485.030
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	2.732.246.870	2.732.246.870	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.728.219.055	2.728.219.055	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.728.219.055	2.728.219.055	0	0%	0	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	14.217.453.701	14.217.453.701	7.001.216.742	49%	4.873.059.365	2.128.157.377
200 Servicios No Personales		1.807.229.388	1.807.229.388	135.157.100	7%	60.940.000	74.217.100
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.807.229.388	1.807.229.388	135.157.100	7%	60.940.000	74.217.100
500 Inversión Física		12.410.224.313	12.410.224.313	6.866.059.642	55%	4.812.119.365	2.053.940.277
520	Construcciones	12.259.691.373	12.259.691.373	6.736.536.174	55%	4.682.595.897	2.053.940.277
580	Estudios y Proyectos de Inversión	129.523.468	129.523.468	129.523.468	100%	129.523.468	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	21.009.472	21.009.472	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	80.658.640.436	80.658.640.436	35.998.185.694	45%	32.496.561.222	3.501.624.472
100 Servicios Personales		2.192.000.000	2.192.000.000	411.000.000	19%	282.500.000	128.500.000
140	Personal Contratado	2.192.000.000	2.192.000.000	411.000.000	19%	282.500.000	128.500.000
200 Servicios No Personales		11.037.547.495	11.037.547.495	4.924.336.274	45%	4.058.269.274	866.067.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.037.547.495	11.037.547.495	4.924.336.274	45%	4.058.269.274	866.067.000
500 Inversión Física		67.429.092.941	67.429.092.941	30.662.849.420	45%	28.155.791.948	2.507.057.472
520	Construcciones	65.437.468.281	65.437.468.281	29.778.016.542	46%	27.270.959.070	2.507.057.472
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.991.624.660	1.991.624.660	884.832.878	44%	884.832.878	0
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	20.473.908.082	20.473.908.082	16.256.852.926	79%	0	16.256.852.926
500 Inversión Física		20.473.908.082	20.473.908.082	16.256.852.926	79%	0	16.256.852.926
520	Construcciones	20.473.908.082	20.473.908.082	16.256.852.926	79%	0	16.256.852.926
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	2.186.293.317	2.186.293.317	252.271.351	12%	233.840.429	18.430.922
200 Servicios No Personales		1.480.199.999	1.480.199.999	252.271.351	17%	233.840.429	18.430.922
230	Pasejes y Viáticos	786.000.000	786.000.000	252.271.351	32%	233.840.429	18.430.922
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	694.199.999	694.199.999	0	0%	0	0
500 Inversión Física		706.093.318	706.093.318	0	0%	0	0
520	Construcciones	706.093.318	706.093.318	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	196.628.411	196.628.411	0	0%	0
200 Servicios No Personales		196.628.411	196.628.411	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	196.628.411	196.628.411	0	0%	0
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	7.667.147.967	7.667.147.967	544.874.336	7%	544.874.336
500 Inversión Física		7.667.147.967	7.667.147.967	544.874.336	7%	544.874.336
520	Construcciones	7.667.147.967	7.667.147.967	544.874.336	7%	544.874.336
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	205.431.851.192	205.431.851.192	73.841.603.254	36%	58.590.640.888
200 Servicios No Personales		3.341.926.000	3.341.926.000	2.107.554.589	63%	414.707.484
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.341.926.000	3.341.926.000	2.107.554.589	63%	414.707.484
500 Inversión Física		202.089.925.192	202.089.925.192	71.734.048.665	35%	56.897.793.783
520	Construcciones	200.572.580.056	200.572.580.056	71.333.165.427	36%	56.669.193.783
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.517.345.136	1.517.345.136	400.883.238	26%	228.600.000
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	150.418.370.429	150.418.370.429	61.151.850.486	41%	52.608.447.569
200 Servicios No Personales		17.533.266.395	17.533.266.395	4.643.348.829	26%	2.762.752.626
230	Pasejes y Viáticos	4.420.000.000	4.420.000.000	2.245.529.160	51%	2.082.930.009
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.113.266.395	13.113.266.395	2.397.819.669	18%	679.822.617
300 Bienes de Consumo e Insumos		83.754.631.327	83.754.631.327	47.629.782.213	57%	45.161.418.853
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12.000.000.000	12.000.000.000	974.608.556	8%	974.608.556
360	Combustibles y Lubricantes	57.000.000.000	57.000.000.000	46.073.575.117	81%	44.007.072.157
390	Otros Bienes de Consumo	14.754.631.327	14.754.631.327	581.598.540	4%	179.738.140
500 Inversión Física		49.130.472.707	49.130.472.707	8.878.719.444	18%	4.684.276.090
520	Construcciones	25.411.369.098	25.411.369.098	2.989.223.281	12%	2.129.509.510
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.319.103.609	8.319.103.609	5.889.496.163	71%	2.554.766.580
13	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Canindeyú	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
500 Inversión Física		570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
520	Construcciones	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
14	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Caazapà	177.608	177.608	0	0%	0
500 Inversión Física		177.608	177.608	0	0%	0
520	Construcciones	177.608	177.608	0	0%	0
15	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0
500 Inversión Física		48	48	0	0%	0
520	Construcciones	48	48	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Paraguari	504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	266.351.915	82.968.650
500 Inversión Física		504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	266.351.915	82.968.650
520 Construcciones		504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	266.351.915	82.968.650
17	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. San Pedro	10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
500 Inversión Física		10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
520 Construcciones		10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	39.698.653.191	39.698.653.191	15.802.925.713	40%	11.746.229.828	4.056.695.885
500 Inversión Física		39.698.653.191	39.698.653.191	15.802.925.713	40%	11.746.229.828	4.056.695.885
520 Construcciones		39.698.653.191	39.698.653.191	15.802.925.713	40%	11.746.229.828	4.056.695.885
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
20	Mejoramiento de Caminos Distritales San Lorenzo	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
21	Mejoramiento de Caminos Distritales de Nemby	3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
520 Construcciones		9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
31	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0
520 Construcciones		21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	365.773.967.096	365.773.967.096	51.651.583.946	14%	42.455.537.176	9.196.046.770
01	SP Proyecto Acueducto	2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	88.180.369.839	88.180.369.839	29.187.602.525	33%	21.491.562.716	7.696.039.809
100 Servicios Personales		3.711.564.691	3.711.564.691	1.058.093.400	29%	686.403.375	371.690.025
140 Personal Contratado		3.711.564.691	3.711.564.691	1.058.093.400	29%	686.403.375	371.690.025
200 Servicios No Personales		5.813.252.709	5.813.252.709	229.770.346	4%	33.550.000	196.220.346
230 Pasejes y Viáticos		450.000.000	450.000.000	196.220.346	44%	0	196.220.346
260 Servicios Técnicos y Profesionales		5.363.252.709	5.363.252.709	33.550.000	1%	33.550.000	0
500 Inversión Física		77.455.552.439	77.455.552.439	27.899.738.779	36%	20.771.609.341	7.128.129.438
520 Construcciones		77.345.552.439	77.345.552.439	27.899.738.779	36%	20.771.609.341	7.128.129.438
580 Estudios y Proyectos de Inversión		110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
880 Transferencias de Capital al Sector Externo		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	48.204.890.578	48.204.890.578	4.792.596.390	10%	4.260.169.872	532.426.518
100 Servicios Personales		110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
140 Personal Contratado		110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
200 Servicios No Personales		3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
500 Inversión Física		44.835.545.876	44.835.545.876	4.683.228.390	10%	4.150.801.872	532.426.518
520 Construcciones		44.835.545.876	44.835.545.876	4.683.228.390	10%	4.150.801.872	532.426.518
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	47.566.754.835	47.566.754.835	17.671.385.031	37%	16.703.804.588	967.580.443
100 Servicios Personales		294.602.600	294.602.600	56.183.400	19%	56.183.400	0
140 Personal Contratado		294.602.600	294.602.600	56.183.400	19%	56.183.400	0
200 Servicios No Personales		4.926.688.360	4.926.688.360	22.464.504	0,46%	22.464.504	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.926.688.360	4.926.688.360	22.464.504	0,46%	22.464.504	0
500 Inversión Física		42.345.463.875	42.345.463.875	17.592.737.127	42%	16.625.156.684	967.580.443
520 Construcciones		42.345.463.875	42.345.463.875	17.592.737.127	42%	16.625.156.684	967.580.443
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	61.333.073.831	61.333.073.831	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		2.096.400.000	2.096.400.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.913.616.001	3.913.616.001	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		192.000.000	192.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.721.616.001	3.721.616.001	0	0%	0	0
500 Inversión Física		54.870.627.830	54.870.627.830	0	0%	0	0
520 Construcciones		54.870.627.830	54.870.627.830	0	0%	0	0
800 Transferencias		452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	48.589.351.420	48.589.351.420	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.766.616.000	7.766.616.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.598.616.000	7.598.616.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		40.226.335.420	40.226.335.420	0	0%	0	0
520 Construcciones		40.226.335.420	40.226.335.420	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	11.317.220.200	11.317.220.200	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		5.575.217.570.788	5.573.673.930.370	1.997.864.067.452	36%	1.552.411.163.164	445.452.904.288

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	62.064.498.028	62.064.498.028	29.016.854.046	47%	25.262.941.031	3.753.913.015
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	62.064.498.028	62.064.498.028	29.016.854.046	47%	25.262.941.031	3.753.913.015
800 Transferencias		62.064.498.028	62.064.498.028	29.016.854.046	47%	25.262.941.031	3.753.913.015
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		61.564.498.028	61.564.498.028	29.016.854.046	47%	25.262.941.031	3.753.913.015
860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		62.064.498.028	62.064.498.028	29.016.854.046	47%	25.262.941.031	3.753.913.015
TOTAL ENTIDAD		7.273.427.548.916	7.255.820.559.255	2.918.263.361.907	40%	2.257.644.409.036	660.618.952.871



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
