



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL


DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera


Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	263.111.095.132	263.111.095.132	157.685.810.529	60%
200 Servicios No Personales	257.038.275.034	257.038.275.034	105.368.629.698	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	171.312.919.699	171.312.919.699	83.000.084.462	48%
500 Inversión Física	5.340.563.009.889	5.322.956.020.228	2.684.099.621.574	50%
600 Inversión Financiera	811.865.836.343	811.865.836.343	621.330.460.772	77%
700 Servicio de la Deuda Pública	23.179.394.000	23.179.394.000	1.912.727.250	8%
800 Transferencias	387.938.837.501	387.938.837.501	340.872.810.705	88%
900 Otros Gastos	19.333.877.148	19.333.877.148	18.605.614.646	96%
TOTAL ENTIDAD	7.274.343.244.746	7.256.736.255.085	4.012.875.759.636	55%

Participación Presupuestaria

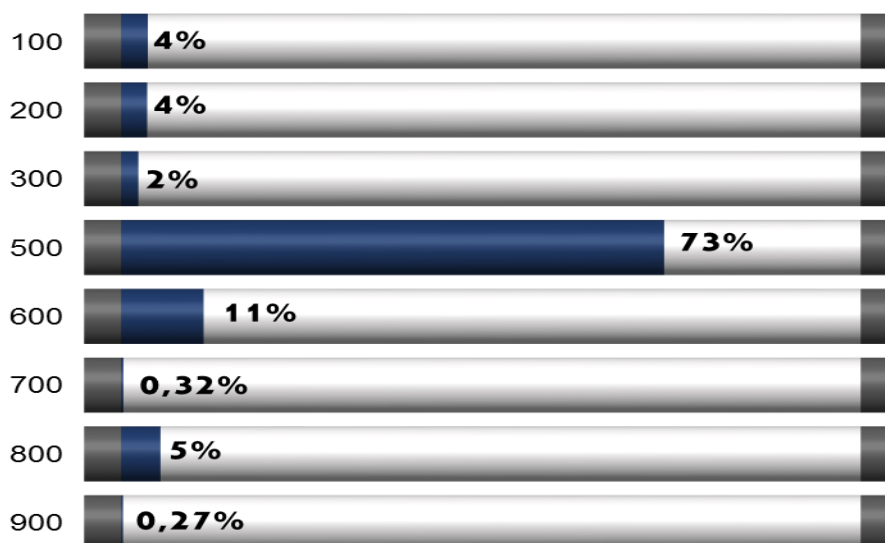


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro




Presupuesto: ¢ 253.348.713.085
Ejecutado: ¢ 143.255.278.263

Recursos del Crédito Público

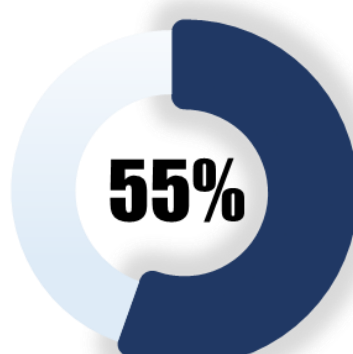

Presupuesto: ¢ 6.274.019.139.334
Ejecutado: ¢ 3.478.850.709.931

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 746.975.392.327
Ejecutado: ¢ 390.769.771.442

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.646.012.881.714	1.629.949.532.471	1.085.324.190.607	67%	1.006.353.884.718	78.970.305.889
01	Gestión Administrativa Financiera	338.539.953.078	338.539.953.078	187.234.630.646	55%	157.947.858.083	29.286.772.563
100 Servicios Personales		195.973.999.634	195.973.999.634	121.083.579.097	62%	99.461.511.207	21.622.067.890
110 Remuneraciones Básicas		149.741.734.946	149.741.734.946	87.170.215.843	58%	70.740.481.504	16.429.734.339
120 Remuneraciones Temporales		9.116.372.436	9.116.372.436	5.498.635.359	60%	5.265.598.864	233.036.495
130 Asignaciones Complementarias		19.817.259.316	19.817.259.316	13.905.450.069	70%	11.587.013.492	2.318.436.577
140 Personal Contratado		16.220.227.722	16.220.227.722	13.432.939.028	83%	10.925.626.632	2.507.312.396
190 Otros Gastos del Personal		1.078.405.214	1.078.405.214	1.076.338.798	99%	942.790.715	133.548.083
200 Servicios No Personales		88.081.539.256	88.081.539.256	55.281.200.374	63%	48.598.666.592	6.682.533.782
210 Servicios Básicos		4.345.666.249	4.345.666.249	4.241.339.802	98%	3.347.711.910	893.627.892
220 Transporte y Almacenaje		160.000.000	160.000.000	26.063.065	16%	26.063.065	0
230 Pasajes y Viáticos		6.078.138.378	6.078.138.378	3.071.851.674	51%	2.634.828.301	437.023.373
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		18.278.828.905	18.278.828.905	12.013.756.738	66%	10.684.322.729	1.329.434.009
250 Alquileres y Derechos		1.988.530.790	1.988.530.790	1.097.219.414	55%	907.082.094	190.137.320
260 Servicios Técnicos y Profesionales		12.929.373.401	12.929.373.401	6.896.762.341	53%	5.771.986.195	1.124.776.146
270 Servicio Social		39.982.653.533	39.982.653.533	26.006.160.777	65%	23.328.525.735	2.677.635.042
280 Otros Servicios en General		4.008.348.000	4.008.348.000	1.847.342.500	46%	1.847.342.500	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		310.000.000	310.000.000	80.704.063	26%	50.804.063	29.900.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		32.498.095.000	32.498.095.000	4.922.137.427	15%	4.232.162.327	689.975.100
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.458.764.000	1.458.764.000	431.044.378	30%	431.044.378	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		1.858.000.000	1.858.000.000	262.646.060	14%	173.242.660	89.403.400
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		294.000.000	294.000.000	9.957.500	3%	9.957.500	0
360 Combustibles y Lubricantes		23.999.876.500	23.999.876.500	580.201.299	2%	580.201.299	0
390 Otros Bienes de Consumo		4.887.454.500	4.887.454.500	3.638.288.190	74%	3.037.716.490	600.571.700
500 Inversión Física		16.108.090.538	16.108.090.538	792.947.600	5%	792.947.600	0
520 Construcciones		97.167.998	97.167.998	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.787.082.917	2.787.082.917	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		3.666.310.423	3.666.310.423	80.947.600	2%	80.947.600	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		9.557.529.200	9.557.529.200	712.000.000	7%	712.000.000	0
800 Transferencias		40.000.000	40.000.000	34.800.000	87%	34.800.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		40.000.000	40.000.000	34.800.000	87%	34.800.000	0
900 Otros Gastos		5.838.228.650	5.838.228.650	5.119.966.148	88%	4.827.770.357	292.195.791
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		5.838.228.650	5.838.228.650	5.119.966.148	88%	4.827.770.357	292.195.791
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	262.638.850.728	262.638.850.728	262.622.819.296	99%	236.621.606.896	26.001.212.400
800 Transferencias		262.638.850.728	262.638.850.728	262.622.819.296	99%	236.621.606.896	26.001.212.400
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		262.638.850.728	262.638.850.728	262.622.819.296	99%	236.621.606.896	26.001.212.400

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	13.898.617.408	13.898.617.408	4.433.824.556	32%	3.965.074.963	468.749.593
100 Servicios Personales		5.302.052.542	5.302.052.542	3.204.273.336	60%	2.799.563.757	404.709.579
110 Remuneraciones Básicas		2.703.355.590	2.703.355.590	1.799.730.513	67%	1.599.760.456	199.970.057
120 Remuneraciones Temporales		202.624.290	202.624.290	76.988.444	38%	76.988.444	0
130 Asignaciones Complementarias		831.823.519	831.823.519	475.473.408	57%	424.871.525	50.601.883
140 Personal Contratado		1.421.249.143	1.421.249.143	821.423.371	58%	667.285.732	154.137.639
190 Otros Gastos del Personal		143.000.000	143.000.000	30.657.600	21%	30.657.600	0
200 Servicios No Personales		2.323.976.708	2.323.976.708	1.219.938.220	52%	1.155.898.206	64.040.014
230 Pasajes y Viáticos		3.017.194	3.017.194	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		371.959.514	371.959.514	22.858.192	6%	22.858.192	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.849.000.000	1.849.000.000	1.197.080.028	65%	1.133.040.014	64.040.014
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		103.987.010	103.987.010	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		27.170.000	27.170.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		61.913.010	61.913.010	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.904.000	14.904.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.008.601.148	6.008.601.148	9.613.000	0,16%	9.613.000	0
520 Construcciones		4.862.267.968	4.862.267.968	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		671.226.800	671.226.800	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		434.133.876	434.133.876	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		40.972.504	40.972.504	9.613.000	23%	9.613.000	0
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.028.730.598	7.028.730.598	2.602.543.076	37%	2.398.930.091	203.612.985
100 Servicios Personales		1.243.366.456	1.243.366.456	837.294.104	67%	738.848.264	98.445.840
120 Remuneraciones Temporales		263.767.134	263.767.134	129.589.211	49%	125.986.523	3.602.688
130 Asignaciones Complementarias		597.482.961	597.482.961	485.820.223	81%	432.951.661	52.868.562
140 Personal Contratado		219.265.361	219.265.361	136.093.428	62%	105.840.444	30.252.984
190 Otros Gastos del Personal		162.851.000	162.851.000	85.791.242	53%	74.069.636	11.721.606
200 Servicios No Personales		2.704.934.290	2.704.934.290	1.382.641.704	51%	1.277.474.559	105.167.145
230 Pasajes y Viáticos		1.049.516.000	1.049.516.000	283.094.206	27%	253.027.061	30.067.145
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		777.000.000	777.000.000	313.130.052	40%	238.030.052	75.100.000
250 Alquileres y Derechos		108.000.000	108.000.000	95.007.146	88%	95.007.146	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		770.418.290	770.418.290	691.410.300	90%	691.410.300	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		224.429.852	224.429.852	80.447.352	36%	80.447.352	0
320 Textiles y Vestuarios		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.699.852	25.699.852	11.447.352	45%	11.447.352	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		77.030.000	77.030.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		69.000.000	69.000.000	69.000.000	100%	69.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.700.000	23.700.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.436.000.000	2.436.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		331.000.000	331.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	302.159.916	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	302.159.916	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	58.282.655.268	58.282.655.268	28.801.704.838	49%	23.481.852.389	5.319.852.449
100 Servicios Personales		40.013.212.449	40.013.212.449	25.236.019.721	63%	20.012.294.955	5.223.724.766
110 Remuneraciones Básicas		33.896.827.367	33.896.827.367	21.947.176.384	65%	17.215.867.119	4.731.309.265
120 Remuneraciones Temporales		387.042.734	387.042.734	202.544.069	52%	171.697.547	30.846.522
130 Asignaciones Complementarias		2.935.000.000	2.935.000.000	1.980.174.733	67%	1.747.331.120	232.843.613
140 Personal Contratado		2.691.987.941	2.691.987.941	1.066.128.028	40%	848.407.775	217.720.253
190 Otros Gastos del Personal		102.354.407	102.354.407	39.996.507	39%	28.991.394	11.005.113
200 Servicios No Personales		6.204.128.006	6.204.128.006	766.580.167	12%	670.877.484	95.702.683
230 Pasajes y Viáticos		948.928.005	948.928.005	153.835.543	16%	132.145.196	21.690.347
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.902.275.699	3.902.275.699	353.086.669	9%	283.208.333	69.878.336
250 Alquileres y Derechos		150.000.000	150.000.000	36.593.055	24%	32.459.055	4.134.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.195.724.302	1.195.724.302	217.864.900	18%	217.864.900	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.676.940.454	4.676.940.454	2.438.368.738	52%	2.437.943.738	425.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		178.672.000	178.672.000	70.000.000	39%	70.000.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		66.220.412	66.220.412	425.000	1%	0	425.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		1.181.249.600	1.181.249.600	1.181.246.275	99%	1.181.246.275	0
360 Combustibles y Lubricantes		3.250.798.442	3.250.798.442	1.186.697.463	37%	1.186.697.463	0
500 Inversión Física		7.296.100.547	7.296.100.547	360.736.212	5%	360.736.212	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		7.284.342.407	7.284.342.407	354.857.142	5%	354.857.142	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		11.758.140	11.758.140	5.879.070	50%	5.879.070	0
800 Transferencias		92.273.812	92.273.812	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
890 Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.238.348.301	2.238.348.301	1.189.419.243	53%	1.045.157.946	144.261.297
100 Servicios Personales		917.386.800	917.386.800	537.046.463	59%	482.371.245	54.675.218
120 Remuneraciones Temporales		248.000.000	248.000.000	92.608.838	37%	91.852.588	756.250
130 Asignaciones Complementarias		517.000.000	517.000.000	353.742.868	68%	313.584.646	40.158.222
140 Personal Contratado		152.386.800	152.386.800	90.694.757	60%	76.934.011	13.760.746
200 Servicios No Personales		1.060.952.341	1.060.952.341	652.372.780	61%	562.786.701	89.586.079
230 Pasajes y Viáticos		1.060.952.341	1.060.952.341	652.372.780	61%	562.786.701	89.586.079
500 Inversión Física		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.710.047.659	1.710.047.659	133.086.158	8%	133.086.158	0
200 Servicios No Personales		495.000.000	495.000.000	133.086.158	27%	133.086.158	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	325.000.000	325.000.000	63.086.158	19%	63.086.158	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	170.000.000	170.000.000	70.000.000	41%	70.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		180.047.659	180.047.659	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.047.659	10.047.659	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.035.000.000	1.035.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	255.000.000	255.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.922.420.000	1.922.420.000	636.197.360	33%	612.713.231	23.484.129
200 Servicios No Personales		1.402.420.000	1.402.420.000	636.197.360	45%	612.713.231	23.484.129
230	Pasajes y Viáticos	227.500.000	227.500.000	126.484.677	56%	103.000.548	23.484.129
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	917.520.000	917.520.000	295.212.683	32%	295.212.683	0
250	Alquileres y Derechos	257.400.000	257.400.000	214.500.000	83%	214.500.000	0
500 Inversión Física		520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	79.325.065.618	79.325.065.618	32.528.651.069	41%	32.514.094.619	14.556.450
200 Servicios No Personales		319.420.000	319.420.000	195.293.293	61%	180.736.843	14.556.450
220	Transporte y Almacenaje	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	169.020.000	169.020.000	103.960.429	62%	89.403.979	14.556.450
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	91.332.864	83%	91.332.864	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		869.531.531	869.531.531	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	50.321.531	50.321.531	0	0%	0	0
330	Produtos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	159.210.000	159.210.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		77.176.114.087	77.176.114.087	31.873.357.776	41%	31.873.357.776	0
520	Construcciones	77.171.074.087	77.171.074.087	31.873.357.776	41%	31.873.357.776	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.040.000	5.040.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	460.000.000	48%	460.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100%	460.000.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	13.769.129.710	13.769.129.710	1.619.043.654	12%	1.619.043.654	0
200 Servicios No Personales		1.339.121.393	1.339.121.393	1.305.420.818	97%	1.305.420.818	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.339.121.393	1.339.121.393	1.305.420.818	97%	1.305.420.818	0
500 Inversión Física		12.430.008.317	12.430.008.317	313.622.836	3%	313.622.836	0
520	Construcciones	12.011.927.889	12.011.927.889	313.622.836	3%	313.622.836	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	418.080.428	418.080.428	0	0%	0	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	4.684.251.431	4.684.251.431	3.226.526.936	69%	3.226.526.936	0
200 Servicios No Personales		101.124.991	101.124.991	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	101.124.991	101.124.991	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.583.126.440	4.583.126.440	3.226.526.936	70%	3.226.526.936	0
520	Construcciones	4.583.126.440	4.583.126.440	3.226.526.936	70%	3.226.526.936	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	39.633.115.403	23.569.766.160	19.577.156.774	83%	19.564.039.274	13.117.500
100 Servicios Personales		264.864.936	264.864.936	65.340.000	25%	52.222.500	13.117.500
140	Personal Contratado	263.981.361	263.981.361	65.340.000	25%	52.222.500	13.117.500
190	Otros Gastos de Personal	883.575	883.575	0	0%	0	0
500 Inversión Física		39.117.881.290	23.054.532.047	19.345.656.597	84%	19.345.656.597	0
520	Construcciones	35.576.668.345	19.513.319.102	17.076.820.776	88%	17.076.820.776	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.541.212.945	3.541.212.945	2.268.835.821	64%	2.268.835.821	0
800 Transferencias		250.369.177	250.369.177	166.160.177	66%	166.160.177	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.369.177	250.369.177	166.160.177	66%	166.160.177	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	10.603.443.253	10.603.443.253	3.820.461.629	36%	3.820.461.629	0
500 Inversión Física		10.603.443.253	10.603.443.253	3.820.461.629	36%	3.820.461.629	0
520	Construcciones	10.603.443.253	10.603.443.253	3.820.461.629	36%	3.820.461.629	0
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	48.850.402.549	48.850.402.549	47.434.091.312	97%	46.968.472.670	465.618.642
200 Servicios No Personales		340.628.517	340.628.517	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	340.628.517	340.628.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		32.655.718.392	32.655.718.392	31.580.035.672	97%	31.114.417.030	465.618.642
520	Construcciones	32.655.718.391	32.655.718.391	31.580.035.672	97%	31.114.417.030	465.618.642
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1	1	0	0%	0	0
800 Transferencias		15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	5.601.979.826	5.601.979.826	3.012.293.409	54%	3.012.293.409	0
200 Servicios No Personales		231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.460.136.618	4.460.136.618	3.012.293.409	68%	3.012.293.409	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	4.460.136.618	4.460.136.618	3.012.293.409	68%	3.012.293.409	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	13.357.188.338	13.357.188.338	7.605.620.348	57%	5.820.786.354	1.784.833.994
200 Servicios No Personales		2.201.949.213	2.201.949.213	1.740.401.270	79%	1.316.030.778	424.370.492
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.201.949.213	2.201.949.213	1.740.401.270	79%	1.316.030.778	424.370.492
500 Inversión Física		11.125.733.167	11.125.733.167	5.865.219.078	53%	4.504.755.576	1.360.463.502
520	Construcciones	11.025.616.810	11.025.616.810	5.865.219.078	53%	4.504.755.576	1.360.463.502
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.116.357	100.116.357	0	0%	0	0
800 Transferencias		29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	99.942.550.658	99.942.550.658	98.099.704.513	98%	98.099.704.513	0
500 Inversión Física		99.942.550.658	99.942.550.658	98.099.704.513	98%	98.099.704.513	0
520	Construcciones	99.646.066.953	99.646.066.953	98.099.704.513	98%	98.099.704.513	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	296.483.705	296.483.705	0	0%	0	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	43.373.738.395	43.373.738.395	28.047.477.764	65%	26.740.554.585	1.306.923.179
500 Inversión Física		43.171.564.295	43.171.564.295	28.009.703.764	65%	26.740.554.585	1.269.149.179
520	Construcciones	38.173.326.517	38.173.326.517	26.740.554.585	70%	26.740.554.585	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.998.237.778	4.998.237.778	1.269.149.179	25%	0	1.269.149.179
800 Transferencias		202.174.100	202.174.100	37.774.000	19%	0	37.774.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	202.174.100	202.174.100	37.774.000	19%	0	37.774.000
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	18.113.087.485	18.113.087.485	9.011.490.422	50%	8.767.084.866	244.405.556
500 Inversión Física		17.911.417.885	17.911.417.885	9.011.490.422	50%	8.767.084.866	244.405.556
520	Construcciones	16.430.809.061	16.430.809.061	8.150.116.461	50%	8.084.205.788	65.910.673
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.480.608.824	1.480.608.824	861.373.961	58%	682.879.078	178.494.883
800 Transferencias		201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	164.187.260.936	164.187.260.936	76.335.580.763	46%	76.229.697.794	105.882.969
500 Inversión Física		164.187.260.936	164.187.260.936	76.335.580.763	46%	76.229.697.794	105.882.969
510	Adquisición de Inmuebles	848.128.304	848.128.304	0	0%	0	0
520	Construcciones	160.950.664.084	160.950.664.084	74.459.643.239	46%	74.358.725.577	100.917.662
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.888.468.548	1.888.468.548	1.875.937.524	99%	1.870.972.217	4.965.307
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	172.008.894.258	172.008.894.258	115.085.718.675	67%	104.971.331.295	10.114.387.380
500 Inversión Física		170.008.894.258	170.008.894.258	115.085.718.675	68%	104.971.331.295	10.114.387.380
520	Construcciones	170.008.894.258	170.008.894.258	115.085.718.675	68%	104.971.331.295	10.114.387.380
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
500 Inversión Física		11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
520	Construcciones	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	34.043.679.896	34.043.679.896	7.614.544.132	22%	7.451.626.882	162.917.250
100 Servicios Personales		4.886.680.000	4.886.680.000	2.211.552.000	45%	2.119.700.000	91.852.000
140	Personal Contratado	4.865.780.000	4.865.780.000	2.190.652.000	45%	2.098.800.000	91.852.000
190	Otros Gastos del Personal	20.900.000	20.900.000	20.900.000	100%	20.900.000	0
200 Servicios No Personales		7.616.254.042	7.616.254.042	2.926.356.088	38%	2.908.356.088	18.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.616.254.042	7.616.254.042	2.926.356.088	38%	2.908.356.088	18.000.000
500 Inversión Física		18.940.510.734	18.940.510.734	1.685.843.494	9%	1.685.843.494	0
520	Construcciones	16.042.719.409	16.042.719.409	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.697.791.325	2.697.791.325	1.685.843.494	62%	1.685.843.494	0
800 Transferencias		2.600.235.120	2.600.235.120	790.792.550	30%	737.727.300	53.065.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.305.235.120	1.305.235.120	625.792.550	48%	572.727.300	53.065.250
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	1.295.000.000	1.295.000.000	165.000.000	13%	165.000.000	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	59.870.020.969	59.870.020.969	56.466.968.963	94%	53.157.251.410	3.309.717.553
500 Inversión Física		59.870.020.969	59.870.020.969	56.466.968.963	94%	53.157.251.410	3.309.717.553
520	Construcciones	59.870.020.969	59.870.020.969	56.466.968.963	94%	53.157.251.410	3.309.717.553
41	Ejec de Conv de Coop con el MSPYBS bajo la Ley de Emergencia	781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
500 Inversión Física		781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
520	Construcciones	781.453.098	781.453.098	491.643.875	63%	491.643.875	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	86.493.426.100	86.493.426.100	80.827.159.447	93%	80.827.159.447	0
500 Inversión Física		86.493.426.100	86.493.426.100	80.827.159.447	93%	80.827.159.447	0
520	Construcciones	86.493.426.100	86.493.426.100	80.827.159.447	93%	80.827.159.447	0
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	815.913.228	0
500 Inversión Física		3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	815.913.228	0
520	Construcciones	3.597.384.483	3.597.384.483	815.913.228	23%	815.913.228	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	1.271.721.342	1.271.721.342	349.944.668	28%	349.944.668	0
500 Inversión Física		1.271.721.342	1.271.721.342	349.944.668	28%	349.944.668	0
520	Construcciones	1.271.721.342	1.271.721.342	349.944.668	28%	349.944.668	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	9.479.350.000	9.479.350.000	1.912.727.250	20%	1.912.727.250	0
100 Servicios Personales		109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		584.000.000	584.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	584.000.000	584.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.764.600.000	6.764.600.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	6.764.600.000	6.764.600.000	0	0%	0	0
700 Servicios de la Deuda Pública		2.021.250.000	2.021.250.000	1.912.727.250	95%	1.912.727.250	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	2.021.250.000	2.021.250.000	1.912.727.250	95%	1.912.727.250	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Sur	37.549.769.882	37.549.769.882	0	0%	0	0
500 Inversión Física		37.549.769.882	37.549.769.882	0	0%	0	0
520 Construcciones		37.549.769.882	37.549.769.882	0	0%	0	0
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Rio Paraguay	1.323.085.866	1.323.085.866	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.323.085.866	1.323.085.866	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.323.085.866	1.323.085.866	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.646.012.881.714	1.629.949.532.471	1.085.324.190.607	67%	1.006.353.884.718	78.970.305.889

0

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.592.367.695.812	4.590.824.055.394	2.537.840.409.785	55%	2.146.973.165.924	390.867.243.861
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	3.935.754.251	3.935.754.251	144.772.770	4%	38.407.744	106.365.026
100 Servicios Personales		180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.054.582.000	1.054.582.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.054.582.000	1.054.582.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.700.772.251	2.700.772.251	144.772.770	5%	38.407.744	106.365.026
520 Construcciones		2.334.648.049	2.334.648.049	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		366.124.202	366.124.202	144.772.770	40%	38.407.744	106.365.026
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	153.792.314.714	153.792.314.714	127.784.077.485	83%	117.127.541.825	10.656.535.660
200 Servicios No Personales		1.684.349.148	1.684.349.148	32.556.331	2%	32.556.331	0
230 Pasajes y Viáticos		200.000.000	200.000.000	32.556.331	16%	32.556.331	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.484.349.148	1.484.349.148	0	0%	0	0
500 Inversión Física		152.107.965.566	152.107.965.566	127.751.521.154	84%	117.094.985.494	10.656.535.660
520 Construcciones		151.507.965.566	151.507.965.566	127.751.521.154	84%	117.094.985.494	10.656.535.660
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	151.961.330.429	151.961.330.429	25.441.085.640	17%	22.465.904.729	2.975.180.911
200 Servicios No Personales		1.656.084.809	1.656.084.809	127.869.778	8%	120.445.253	7.424.525
230	Pasajes y Viáticos	6.999.999	6.999.999	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.649.084.810	1.649.084.810	127.869.778	8%	120.445.253	7.424.525
500 Inversión Física		149.305.245.620	149.305.245.620	25.211.109.937	17%	22.243.353.551	2.967.756.386
520	Construcciones	147.647.595.373	147.647.595.373	24.713.430.272	17%	22.243.353.551	2.470.076.721
580	Estudios y Proyectos de Inversión	162.388.114	162.388.114	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.495.262.133	1.495.262.133	497.679.665	33%	0	497.679.665
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	102.105.925	10%	102.105.925	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	102.105.925	10%	102.105.925	0
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	231.495.187.424	231.495.187.424	130.254.135.783	56%	106.538.023.115	23.716.112.668
200 Servicios No Personales		142.720.000	142.720.000	7.731.825	5%	7.731.825	0
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	7.731.825	8%	7.731.825	0
250	Alquileres y Derechos	42.720.000	42.720.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		231.352.467.424	231.352.467.424	130.246.403.958	56%	106.530.291.290	23.716.112.668
520	Construcciones	227.977.727.305	227.977.727.305	128.743.349.169	56%	105.307.760.726	23.435.588.443
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.374.740.119	3.374.740.119	1.503.054.789	45%	1.222.530.564	280.524.225
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	26.368.656.953	26.368.656.953	1.179.178.697	4%	909.726.069	269.452.628
200 Servicios No Personales		3.387.266.405	3.387.266.405	172.260.000	5%	114.840.000	57.420.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.387.266.405	3.387.266.405	172.260.000	5%	114.840.000	57.420.000
500 Inversión Física		22.981.390.548	22.981.390.548	1.006.918.697	4%	794.886.069	212.032.628
520	Construcciones	17.800.502.010	17.800.502.010	1.006.918.697	6%	794.886.069	212.032.628
580	Estudios y Proyectos de Inversión	80.888.538	80.888.538	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.100.000.000	5.100.000.000	0	0%	0	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	66.058.310.206	66.058.310.206	42.804.450.388	65%	41.190.888.648	1.613.561.740
200 Servicios No Personales		1.716.896.098	1.716.896.098	99.386.918	6%	99.386.918	0
230	Pasajes y Viáticos	24.386.918	24.386.918	24.386.918	100%	24.386.918	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.692.509.180	1.692.509.180	75.000.000	4%	75.000.000	0
500 Inversión Física		64.341.414.108	64.341.414.108	42.705.063.470	66%	41.091.501.730	1.613.561.740
520	Construcciones	57.903.372.154	57.903.372.154	40.468.859.320	70%	39.749.779.240	719.080.080
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.438.041.954	6.438.041.954	2.236.204.150	35%	1.341.722.490	894.481.660
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	58.622.148.974	58.622.148.974	33.703.206.680	57%	29.187.503.813	4.515.702.867
200 Servicios No Personales		3.116.510.147	3.116.510.147	1.526.842.200	49%	1.258.507.574	268.334.626
230	Pasajes y Viáticos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.076.510.147	3.076.510.147	1.526.842.200	50%	1.258.507.574	268.334.626
500 Inversión Física		55.505.638.827	55.505.638.827	32.176.364.480	58%	27.928.996.239	4.247.368.241
520	Construcciones	55.505.638.827	55.505.638.827	32.176.364.480	58%	27.928.996.239	4.247.368.241

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	29.716.227.030	29.716.227.030	19.693.921.676	66%	19.282.212.172	411.709.504
200 Servicios No Personales		68.613.082	68.613.082	23.031.509	34%	23.031.509	0
230	Pasajes y Viáticos	68.613.082	68.613.082	23.031.509	34%	23.031.509	0
500 Inversión Física		29.647.613.948	29.647.613.948	19.670.890.167	66%	19.259.180.663	411.709.504
520	Construcciones	28.647.613.948	28.647.613.948	19.670.890.167	69%	19.259.180.663	411.709.504
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	10.608.576.888	10.608.576.888	6.670.512.266	63%	5.628.021.630	1.042.490.636
500 Inversión Física		10.608.576.888	10.608.576.888	6.670.512.266	63%	5.628.021.630	1.042.490.636
520	Construcciones	10.608.576.888	10.608.576.888	6.670.512.266	63%	5.628.021.630	1.042.490.636
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	71.505.414.522	71.505.414.522	25.005.899.711	35%	23.320.108.719	1.685.790.992
100 Servicios Personales		760.115.000	760.115.000	466.400.000	61%	455.400.000	11.000.000
130	Asignaciones Complementarias	60.515.000	60.515.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	699.600.000	699.600.000	466.400.000	67%	455.400.000	11.000.000
200 Servicios No Personales		2.009.716.582	2.009.716.582	73.804.238	4%	73.804.238	0
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	13.719.238	23%	13.719.238	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.949.716.582	1.949.716.582	60.085.000	3%	60.085.000	0
500 Inversión Física		68.735.582.940	68.735.582.940	24.465.695.473	36%	22.790.904.481	1.674.790.992
520	Construcciones	68.735.582.940	68.735.582.940	24.465.695.473	36%	22.790.904.481	1.674.790.992
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	94.522.452.792	94.522.452.792	69.652.285.847	74%	60.265.534.584	9.386.751.263
100 Servicios Personales		61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.021.287.230	4.021.287.230	393.500.000	10%	319.500.000	74.000.000
220	Transporte Y Almacenaje	138.324.789	138.324.789	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	3.738.962.441	3.738.962.441	393.500.000	11%	319.500.000	74.000.000
290	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	214.187.822	0
320	Textiles Y Vestuarios	214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	214.187.822	0
500 Inversión Física		90.145.097.740	90.145.097.740	69.044.598.025	77%	59.731.846.762	9.312.751.263
520	Construcciones	86.531.049.740	86.531.049.740	67.734.897.009	78%	58.422.145.746	9.312.751.263
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.365.890.119	3.365.890.119	1.309.701.016	39%	1.309.701.016	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	248.157.881	248.157.881	0	0%	0	0
800 Transferencias		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	9.953.171.547	9.953.171.547	4.821.212.363	48%	4.820.284.544	927.819
200 Servicios No Personales		6.042.007.455	6.042.007.455	2.218.576.211	37%	2.217.648.392	927.819
230	Pasajes y Viáticos	6.042.007.455	6.042.007.455	2.218.576.211	37%	2.217.648.392	927.819
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.138.575.116	3.138.575.116	2.602.636.152	83%	2.602.636.152	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	49.868.185	49.868.185	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	3.088.706.931	3.088.706.931	2.602.636.152	84%	2.602.636.152	0
500 Inversión Física		772.588.976	772.588.976	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	772.588.976	772.588.976	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0
500 Inversión Física		33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0
520	Construcciones	33.005.350.720	33.005.350.720	3.846.261.572	12%	3.846.261.572	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	35.114.637.349	35.114.637.349	25.652.434.888	73%	8.788.678.560	16.863.756.328
500 Inversión Física		35.114.637.349	35.114.637.349	25.652.434.888	73%	8.788.678.560	16.863.756.328
520	Construcciones	35.114.637.349	35.114.637.349	25.652.434.888	73%	8.788.678.560	16.863.756.328
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.180.254.770	3.180.254.770	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	1.313.261.030	1.313.261.030	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.313.261.030	1.313.261.030	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.313.261.030	1.313.261.030	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
500 Inversión Física		105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
520	Construcciones	105.755.141	105.755.141	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	4.657.334.918	4.657.334.918	1.880.115.777	40%	0	1.880.115.777
200 Servicios No Personales		350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.669.318.711	3.669.318.711	1.858.395.365	51%	0	1.858.395.365
520	Construcciones	3.655.523.079	3.655.523.079	1.858.395.365	51%	0	1.858.395.365
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.795.632	13.795.632	0	0%	0	0
800 Transferencias		638.016.207	638.016.207	21.720.412	3%	0	21.720.412
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	638.016.207	638.016.207	21.720.412	3%	0	21.720.412
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
500 Inversión Física		704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
520	Construcciones	704.596.698	704.596.698	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	9.411.831.973	9.411.831.973	8.087.840.320	86%	7.884.991.803	202.848.517
500 Inversión Física		9.067.946.915	9.067.946.915	7.743.955.262	85%	7.541.106.745	202.848.517
520	Construcciones	8.865.098.398	8.865.098.398	7.541.106.745	85%	7.541.106.745	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	202.848.517	202.848.517	202.848.517	100%	0	202.848.517
800 Transferencias		343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	942.905.079	942.905.079	316.653.500	34%	0	316.653.500
500 Inversión Física		938.222.388	938.222.388	316.653.500	34%	0	316.653.500
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	938.222.388	938.222.388	316.653.500	34%	0	316.653.500
800 Transferencias		4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	843.948.683.927	843.948.683.927	645.917.015.629	77%	644.529.059.701	1.387.955.928
200 Servicios No Personales		4.108.424.538	4.108.424.538	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	806.704.277	806.704.277	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.301.720.261	3.301.720.261	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.030.399.616	9.030.399.616	7.574.047.283	84%	6.287.145.000	1.286.902.283
520	Construcciones	494.632.451	494.632.451	92.079.414	19%	92.079.414	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.535.767.165	8.535.767.165	7.481.967.869	88%	6.195.065.586	1.286.902.283
600 Inversión Financiera		811.865.836.343	811.865.836.343	621.330.460.772	77%	621.330.460.772	0
630	Préstamos al Sector Privado	811.865.836.343	811.865.836.343	621.330.460.772	77%	621.330.460.772	0
800 Transferencias		18.944.023.430	18.944.023.430	17.012.507.574	90%	16.911.453.929	101.053.645
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.786.423.430	3.786.423.430	1.854.907.574	49%	1.753.853.929	101.053.645
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.157.600.000	15.157.600.000	15.157.600.000	100%	15.157.600.000	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	13.497.560.024	13.497.560.024	5.959.002.159	44%	4.284.058.265	1.674.943.894
500 Inversión Física		12.704.835.337	12.704.835.337	5.959.002.159	47%	4.284.058.265	1.674.943.894
520	Construcciones	8.015.324.713	8.015.324.713	3.926.138.011	49%	3.534.073.400	392.064.611
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.689.510.624	4.689.510.624	2.032.864.148	43%	749.984.865	1.282.879.283
800 Transferencias		792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.543.640.418	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
500 Inversión Física		6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
520	Construcciones	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	32.721.551.502	32.721.551.502	19.823.653.425	61%	18.256.476.112	1.567.177.313
200 Servicios No Personales		2.944.313.987	2.944.313.987	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.944.313.987	2.944.313.987	0	0%	0	0
500 Inversión Física		29.777.237.515	29.777.237.515	19.823.653.425	67%	18.256.476.112	1.567.177.313
520	Construcciones	28.768.146.345	28.768.146.345	19.319.107.840	67%	17.751.930.527	1.567.177.313
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.009.091.170	1.009.091.170	504.545.585	50%	504.545.585	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	58.007.845.135	58.007.845.135	18.358.131.329	32%	16.970.813.058	1.387.318.271
100 Servicios Personales		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		56.725.445.135	56.725.445.135	18.358.131.329	32%	16.970.813.058	1.387.318.271
520	Construcciones	55.725.445.135	55.725.445.135	18.358.131.329	33%	16.970.813.058	1.387.318.271
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	129.311.178.541	129.311.178.541	35.936.618.398	28%	17.745.911.824	18.190.706.574
200 Servicios No Personales		6.714.382.472	6.714.382.472	4.296.642.990	64%	3.896.347.375	400.295.615
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	3.491.968	6%	3.491.968	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.654.382.472	6.654.382.472	4.293.151.022	65%	3.892.855.407	400.295.615
500 Inversión Física		122.596.796.069	122.596.796.069	31.639.975.408	26%	13.849.564.449	17.790.410.959
520	Construcciones	122.596.796.069	122.596.796.069	31.639.975.408	26%	13.849.564.449	17.790.410.959
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	341.483.592.126	341.483.592.126	260.290.821.139	76%	248.988.849.434	11.301.971.705
100 Servicios Personales		1.132.000.000	1.132.000.000	414.889.192	37%	363.028.043	51.861.149
140	Personal Contratado	1.132.000.000	1.132.000.000	414.889.192	37%	363.028.043	51.861.149
200 Servicios No Personales		20.786.389.503	20.786.389.503	8.245.039.645	40%	7.372.749.014	872.290.631
230	Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	13.401.830	5%	13.401.830	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	20.536.389.503	20.536.389.503	8.231.637.815	40%	7.359.347.184	872.290.631
500 Inversión Física		306.222.783.166	306.222.783.166	238.288.472.845	78%	227.910.652.920	10.377.819.925
520	Construcciones	302.322.783.166	302.322.783.166	238.288.472.845	79%	227.910.652.920	10.377.819.925
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	13.342.419.457	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	13.342.419.457	0
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	2.155.117.962	2.155.117.962	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.935.117.962	1.935.117.962	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.935.117.962	1.935.117.962	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	191.624.339.800	191.624.339.800	149.740.063.741	78%	129.323.808.295	20.416.255.446
100 Servicios Personales		704.000.000	704.000.000	457.600.000	65%	323.973.333	133.626.667
140	Personal Contratado	704.000.000	704.000.000	457.600.000	65%	323.973.333	133.626.667
200 Servicios No Personales		1.324.636.094	1.324.636.094	57.349.306	4%	48.917.554	8.431.752
220	Transporte y Almacenaje	174.672.505	174.672.505	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	455.911.464	455.911.464	57.349.306	13%	48.917.554	8.431.752
260	Servicios Técnicos y Profesionales	694.052.125	694.052.125	0	0%	0	0
500 Inversión Física		189.595.703.706	189.595.703.706	149.225.114.435	79%	128.950.917.408	20.274.197.027
520	Construcciones	184.528.705.964	184.528.705.964	149.225.114.435	81%	128.950.917.408	20.274.197.027
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.066.997.742	5.066.997.742	0	0%	0	0
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	4.455.641.375	4.455.641.375	1.153.408.096	26%	1.010.179.055	143.229.041
500 Inversión Física		4.312.412.334	4.312.412.334	1.010.179.055	23%	1.010.179.055	0
520	Construcciones	4.312.412.334	4.312.412.334	1.010.179.055	23%	1.010.179.055	0
900 Otros Gastos		143.229.041	143.229.041	143.229.041	100%	0	143.229.041
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	143.229.041	143.229.041	143.229.041	100%	0	143.229.041
61	Mejoramiento de Caminos Departamento San Pedro	2.592.413.979	2.592.413.979	684.123.406	26%	611.329.393	72.794.013
500 Inversión Física		2.592.413.979	2.592.413.979	684.123.406	26%	611.329.393	72.794.013
520	Construcciones	2.519.619.966	2.519.619.966	611.329.393	24%	611.329.393	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	72.794.013	72.794.013	72.794.013	100%	0	72.794.013

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento de Caminos Departamento Cordillera	30	30	0	0%	0	0
500 Inversión Física		30	30	0	0%	0	0
520 Construcciones		30	30	0	0%	0	0
64	Mejoramiento de Caminos Departamento Ñeembucú	1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
500 Inversión Física		1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
520 Construcciones		1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
65	Mejoramiento de Caminos Departamento Itapúa	3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
500 Inversión Física		3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
520 Construcciones		3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
66	Mejoramiento de Caminos Departamento Central	6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
500 Inversión Física		6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
520 Construcciones		6.250.847.228	6.250.847.228	4.367.388.588	70%	4.367.388.588	0
68	Mejoramiento de Caminos Departamento Guairá	1.529.319.170	1.529.319.170	913.045.576	60%	913.045.576	0
500 Inversión Física		1.529.319.170	1.529.319.170	913.045.576	60%	913.045.576	0
520 Construcciones		1.529.319.170	1.529.319.170	913.045.576	60%	913.045.576	0
69	Mejoramiento de Caminos Departamento Caaguazú	17.824.843.923	17.824.843.923	9.058.190.968	51%	7.987.528.331	1.070.662.637
500 Inversión Física		17.824.843.923	17.824.843.923	9.058.190.968	51%	7.987.528.331	1.070.662.637
520 Construcciones		17.824.843.923	17.824.843.923	9.058.190.968	51%	7.987.528.331	1.070.662.637
70	Mejoramiento de Caminos Departamento Alto Paraná	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
500 Inversión Física		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
520 Construcciones		59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
71	Mejoramiento de Caminos Departamento Misiones	726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
500 Inversión Física		726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
520 Construcciones		726.597.532	726.597.532	53.330.580	7%	53.330.580	0
72	Mejoramiento de Caminos Departamento Canindeyú	26.621.947.715	26.621.947.715	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
500 Inversión Física		26.621.947.715	26.621.947.715	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
520 Construcciones		26.621.947.715	26.621.947.715	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
73	Mejoramiento de Caminos Departamento Concepción	9.857.865.966	9.857.865.966	6.276.758.118	64%	5.629.495.552	647.262.566
500 Inversión Física		9.857.865.966	9.857.865.966	6.276.758.118	64%	5.629.495.552	647.262.566
520 Construcciones		9.857.865.966	9.857.865.966	6.276.758.118	64%	5.629.495.552	647.262.566
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	375.076.139.240	375.076.139.240	179.441.290.104	48%	149.475.756.584	29.965.533.520
200 Servicios No Personales		421.965.518	421.965.518	60.500.000	14%	60.500.000	0
230 Pasajes y Viáticos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		50.031.201	50.031.201	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		351.934.317	351.934.317	60.500.000	17%	60.500.000	0
500 Inversión Física		373.174.173.722	373.174.173.722	179.002.032.519	48%	149.062.310.855	29.939.721.664
520 Construcciones		338.229.700.020	338.229.700.020	165.878.014.237	49%	138.365.593.104	27.512.421.133
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		44.473.702	44.473.702	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		34.900.000.000	34.900.000.000	13.124.018.282	38%	10.696.717.751	2.427.300.531
800 Transferencias		1.480.000.000	1.480.000.000	378.757.585	26%	352.945.729	25.811.856
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.480.000.000	1.480.000.000	378.757.585	26%	352.945.729	25.811.856

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	130.818.564.114	130.818.564.114	23.901.458.554	18%	17.834.195.524	6.067.263.030
200 Servicios No Personales		320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		127.798.564.114	127.798.564.114	23.215.055.970	18%	17.421.259.939	5.793.796.031
520	Construcciones	122.898.340.168	122.898.340.168	21.384.867.479	17%	16.996.947.179	4.387.920.300
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.900.223.946	4.900.223.946	1.830.188.491	37%	424.312.760	1.405.875.731
800 Transferencias		2.700.000.000	2.700.000.000	686.402.584	25%	412.935.585	273.466.999
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.700.000.000	2.700.000.000	686.402.584	25%	412.935.585	273.466.999
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	261.883.925.138	261.883.925.138	219.425.772.537	84%	182.833.120.886	36.592.651.651
200 Servicios No Personales		1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
500 Inversión Física		260.731.925.138	260.731.925.138	219.355.372.537	84%	182.762.720.886	36.592.651.651
520	Construcciones	254.929.924.859	254.929.924.859	218.409.948.327	86%	181.817.296.676	36.592.651.651
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.302.000.279	3.302.000.279	945.424.210	29%	945.424.210	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	172.156.324.047	172.156.324.047	79.604.246.324	46%	70.304.869.729	9.299.376.595
200 Servicios No Personales		501.980.000	501.980.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	501.980.000	501.980.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		171.654.344.047	171.654.344.047	79.604.246.324	46%	70.304.869.729	9.299.376.595
520	Construcciones	164.904.344.048	164.904.344.048	79.328.348.518	48%	70.028.971.923	9.299.376.595
580	Estudios y Proyectos de Inversión	4.149.999.999	4.149.999.999	275.897.806	7%	275.897.806	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0%	0	0
80	Construcción Pav s/ Empedrados en Región Centro Este	3.096.524.657	3.096.524.657	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.096.524.657	3.096.524.657	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.096.524.657	3.096.524.657	0	0%	0	0
82	SP Pav. Asf. Tram. San Bernardino - Yukry - Luque	1.737.790.658	1.737.790.658	1.172.653.368	67%	1.003.754.750	168.898.618
500 Inversión Física		1.737.790.658	1.737.790.658	1.172.653.368	67%	1.003.754.750	168.898.618
520	Construcciones	1.568.892.040	1.568.892.040	1.003.754.750	64%	1.003.754.750	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	168.898.618	168.898.618	168.898.618	100%	0	168.898.618
85	SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF, COMP, RN 10)	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
86	SP Mej. Gestión y Mant de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)	1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	1.603.442.610	0
500 Inversión Física		1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	1.603.442.610	0
520	Construcciones	1.867.149.691	1.867.149.691	1.603.442.610	86%	1.603.442.610	0
87	Mejoramiento Tramvesía Urbana de Coronel Oviedo	15.446.151.456	15.446.151.456	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.446.151.456	15.446.151.456	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.446.151.456	15.446.151.456	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	12.985.187.477	12.985.187.477	12.425.187.477	96%	12.425.187.477	0
500 Inversión Física		12.985.187.477	12.985.187.477	12.425.187.477	96%	12.425.187.477	0
520	Construcciones	12.985.187.477	12.985.187.477	12.425.187.477	96%	12.425.187.477	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
89	SP AP. Pre. Prog. de Mod. del Sec. Tra. PY ATN/OC- 11921-PR	1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.228.537.001	1.228.537.001	0	0%	0	0
91	SP Pav.Corred. de Integr.Rehab. y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
500 Inversión Física		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
520	Construcciones	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	157.105.263.286	157.105.263.286	38.085.098.054	24%	30.143.549.398	7.941.548.656
200 Servicios No Personales		3.352.765.263	3.352.765.263	124.965.500	4%	124.965.500	0
230	Pasajes y Viáticos	41.000.000	41.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.311.765.263	3.311.765.263	124.965.500	4%	124.965.500	0
500 Inversión Física		152.152.498.023	152.152.498.023	37.934.038.711	25%	30.018.583.898	7.915.454.813
520	Construcciones	140.965.330.335	140.965.330.335	36.399.703.333	26%	29.201.962.184	7.197.741.149
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	11.187.167.688	11.187.167.688	1.534.335.378	14%	816.621.714	717.713.664
800 Transferencias		1.600.000.000	1.600.000.000	26.093.843	2%	0	26.093.843
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.600.000.000	1.600.000.000	26.093.843	2%	0	26.093.843
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'í - Gral. Bruguez	138.614.000.000	138.614.000.000	83.375.638.107	60%	68.999.171.122	14.376.466.985
200 Servicios No Personales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		138.110.000.000	138.110.000.000	83.375.638.107	60%	68.999.171.122	14.376.466.985
520	Construcciones	137.280.000.000	137.280.000.000	83.375.638.107	61%	68.999.171.122	14.376.466.985
580	Estudios y Proyectos de Inversión	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	108.057.993.548	108.057.993.548	31.780.031.055	29%	0	31.780.031.055
200 Servicios No Personales		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.857.993.548	100.857.993.548	31.780.031.055	32%	0	31.780.031.055
520	Construcciones	100.857.993.548	100.857.993.548	31.780.031.055	32%	0	31.780.031.055
700 Servicio de la Deuda Pública		7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Publica	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	418.594.865.061	418.594.865.061	148.170.273.414	35%	35.486.766.687	112.683.506.727
100 Servicios Personales		1.360.670.024	1.360.670.024	899.780.016	66%	866.980.016	32.800.000
140	Personal Contratado	1.360.670.024	1.360.670.024	899.780.016	66%	866.980.016	32.800.000
200 Servicios No Personales		424.000.000	424.000.000	12.474.011	3%	0	12.474.011
230	Pasajes y Viáticos	74.000.000	74.000.000	12.474.011	17%	0	12.474.011
250	Alquileres y Derechos	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		416.610.195.037	416.610.195.037	147.258.019.387	35%	34.619.786.671	112.638.232.716
520	Construcciones	406.310.195.037	406.310.195.037	147.258.019.387	36%	34.619.786.671	112.638.232.716
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	10.300.000.000	10.300.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
96	SP. Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari- Carapegúa - Quiindy - Caap	530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
500 Inversión Física		530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
590	Gastos de Inversión y Reparac Mayores	530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	94.668.712.726	94.668.712.726	23.508.092.264	25%	15.507.353.661	8.000.738.603
200 Servicios No Personales		1.794.038.422	1.794.038.422	324.566.999	18%	324.566.999	0
230	Pasajes y Viáticos	800.000.000	800.000.000	324.566.999	41%	324.566.999	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	994.038.422	994.038.422	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		45.217.375.966	45.217.375.966	20.915.608.208	46%	14.109.044.565	6.806.563.643
360	Combustibles y Lubricantes	3.918.297.531	3.918.297.531	3.871.109.540	99%	3.871.109.540	0
390	Otros Bienes de Consumo	41.299.078.435	41.299.078.435	17.044.498.668	41%	10.237.935.025	6.806.563.643
500 Inversión Física		40.033.687.521	40.033.687.521	0	0%	0	0
520	Construcciones	39.327.539.015	39.327.539.015	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	389.858.489	389.858.489	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	316.290.017	316.290.017	0	0%	0	0
800 Transferencias		7.623.610.817	7.623.610.817	2.267.917.057	30%	1.073.742.097	1.194.174.960
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.549.868.720	6.549.868.720	1.194.174.960	18%	0	1.194.174.960
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.073.742.097	1.073.742.097	1.073.742.097	100%	1.073.742.097	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	607.208.506.266	607.208.506.266	291.570.032.032	48%	245.697.055.093	45.872.976.939
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	2.856.245.387	2.856.245.387	364.816.640	13%	364.816.640	0
500 Inversión Física		2.856.245.387	2.856.245.387	364.816.640	13%	364.816.640	0
520	Construcciones	2.856.245.387	2.856.245.387	364.816.640	13%	364.816.640	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	2.732.246.870	2.732.246.870	651.590.565	24%	645.432.555	6.158.010
200 Servicios No Personales		4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.728.219.055	2.728.219.055	651.590.565	24%	645.432.555	6.158.010
520	Construcciones	2.728.219.055	2.728.219.055	651.590.565	24%	645.432.555	6.158.010
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	17.517.453.701	17.517.453.701	9.601.225.204	55%	6.712.371.347	2.888.853.857
200 Servicios No Personales		5.107.229.388	5.107.229.388	1.187.350.089	23%	735.157.100	452.192.989
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.107.229.388	5.107.229.388	1.187.350.089	23%	735.157.100	452.192.989
500 Inversión Física		12.410.224.313	12.410.224.313	8.413.875.115	68%	5.977.214.247	2.436.660.868
520	Construcciones	12.259.691.373	12.259.691.373	8.284.351.647	68%	5.847.690.779	2.436.660.868
580	Estudios y Proyectos de Inversión	129.523.468	129.523.468	129.523.468	100%	129.523.468	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	21.009.472	21.009.472	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	77.358.640.436	77.358.640.436	54.533.876.315	70%	41.247.109.702	13.286.766.613
100 Servicios Personales		2.192.000.000	2.192.000.000	614.400.000	28%	517.500.000	96.900.000
140	Personal Contratado	2.192.000.000	2.192.000.000	614.400.000	28%	517.500.000	96.900.000
200 Servicios No Personales		14.037.547.495	14.037.547.495	8.506.800.293	61%	6.835.757.337	1.671.042.956
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.037.547.495	14.037.547.495	8.506.800.293	61%	6.835.757.337	1.671.042.956
500 Inversión Física		61.129.092.941	61.129.092.941	45.412.676.022	74%	33.893.852.365	11.518.823.657
520	Construcciones	59.137.468.281	59.137.468.281	44.527.843.144	75%	33.009.019.487	11.518.823.657
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.991.624.660	1.991.624.660	884.832.878	44%	884.832.878	0
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	20.473.908.082	20.473.908.082	17.984.986.913	88%	16.298.803.838	1.686.183.075
500 Inversión Física		20.473.908.082	20.473.908.082	17.984.986.913	88%	16.298.803.838	1.686.183.075
520	Construcciones	20.473.908.082	20.473.908.082	17.984.986.913	88%	16.298.803.838	1.686.183.075
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	2.686.293.317	2.686.293.317	1.077.573.199	40%	1.077.573.199	0
200 Servicios No Personales		1.980.199.999	1.980.199.999	963.174.179	49%	963.174.179	0
230	Pasejes y Viáticos	1.286.000.000	1.286.000.000	363.176.651	28%	363.176.651	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	694.199.999	694.199.999	599.997.528	86%	599.997.528	0
500 Inversión Física		706.093.318	706.093.318	114.399.020	16%	114.399.020	0
520	Construcciones	706.093.318	706.093.318	114.399.020	16%	114.399.020	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	196.628.411	196.628.411	0	0%	0
200	Servicios No Personales	196.628.411	196.628.411	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	196.628.411	196.628.411	0	0%	0
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	2.193.042.076	2.193.042.076	544.874.336	25%	544.874.336
500	Inversión Física	2.193.042.076	2.193.042.076	544.874.336	25%	544.874.336
520	Construcciones	2.193.042.076	2.193.042.076	544.874.336	25%	544.874.336
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	206.731.851.192	206.731.851.192	100.528.797.006	49%	83.154.273.372
200	Servicios No Personales	3.341.926.000	3.341.926.000	2.751.756.737	82%	2.044.276.157
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.341.926.000	3.341.926.000	2.751.756.737	82%	2.044.276.157
500	Inversión Física	203.389.925.192	203.389.925.192	97.777.040.269	48%	81.109.997.215
520	Construcciones	201.872.580.056	201.872.580.056	96.723.581.607	48%	80.255.977.630
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.517.345.136	1.517.345.136	1.053.458.662	69%	854.019.585
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	149.568.370.429	149.568.370.429	70.190.997.140	47%	66.237.169.301
200	Servicios No Personales	19.633.266.395	19.633.266.395	6.825.565.086	35%	6.582.430.474
230	Pasejes y Viáticos	6.520.000.000	6.520.000.000	3.500.986.729	54%	3.497.997.090
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.113.266.395	13.113.266.395	3.324.578.357	25%	3.084.433.384
300	Bienes de Consumo e Insumos	82.254.631.327	82.254.631.327	51.826.698.763	63%	50.251.038.213
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.500.000.000	9.500.000.000	974.608.556	10%	974.608.556
360	Combustibles y Lubricantes	57.000.000.000	57.000.000.000	50.270.491.667	88%	48.694.831.117
390	Otros Bienes de Consumo	15.754.631.327	15.754.631.327	581.598.540	4%	581.598.540
500	Inversión Física	47.680.472.707	47.680.472.707	11.538.733.291	24%	9.403.700.614
520	Construcciones	23.961.369.098	23.961.369.098	5.649.237.128	24%	3.514.204.451
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.319.103.609	8.319.103.609	5.889.496.163	71%	5.889.496.163
13	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Canindeyú	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
500	Inversión Física	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
520	Construcciones	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706
14	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Caazapà	177.608	177.608	0	0%	0
500	Inversión Física	177.608	177.608	0	0%	0
520	Construcciones	177.608	177.608	0	0%	0
15	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0
500	Inversión Física	48	48	0	0%	0
520	Construcciones	48	48	0	0%	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Paraguari	504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	349.320.565	0
500 Inversión Física		504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	349.320.565	0
520	Construcciones	504.320.566	504.320.566	349.320.565	69%	349.320.565	0
17	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. San Pedro	10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
500 Inversión Física		10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
520	Construcciones	10.106.162.644	10.106.162.644	5.610.335.906	56%	5.610.335.906	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	41.148.653.191	41.148.653.191	29.635.745.537	72%	22.959.081.626	6.676.663.911
500 Inversión Física		41.148.653.191	41.148.653.191	29.635.745.537	72%	22.959.081.626	6.676.663.911
520	Construcciones	41.148.653.191	41.148.653.191	29.635.745.537	72%	22.959.081.626	6.676.663.911
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.980.000.000	5.980.000.000	0	0%	0	0
20	Mejoramiento de Caminos Distritales San Lorenzo	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
21	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ñemby	3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.330.000.000	3.330.000.000	0	0%	0	0
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.350.000.000	4.350.000.000	0	0%	0	0
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guaramaré	850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.165.000.000	15.165.000.000	0	0%	0	0
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.986.283.750	9.986.283.750	0	0%	0	0
31	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0
520	Construcciones	21.452.819.250	21.452.819.250	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	365.773.967.096	365.773.967.096	61.388.561.533	17%	56.233.607.220	5.154.954.313
01	SP Proyecto Acueducto	2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.582.306.393	2.582.306.393	0	0%	0	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	88.180.369.839	88.180.369.839	33.906.269.247	38%	31.697.008.401	2.209.260.846
100 Servicios Personales		3.711.564.691	3.711.564.691	1.395.791.200	38%	1.243.937.300	151.853.900
140	Personal Contratado	3.711.564.691	3.711.564.691	1.395.791.200	38%	1.243.937.300	151.853.900
200 Servicios No Personales		5.813.252.709	5.813.252.709	267.501.652	5%	267.501.652	0
230	Pasejes y Viáticos	450.000.000	450.000.000	233.951.652	52%	233.951.652	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.363.252.709	5.363.252.709	33.550.000	1%	33.550.000	0
500 Inversión Física		77.455.552.439	77.455.552.439	32.242.976.395	42%	30.185.569.449	2.057.406.946
520	Construcciones	77.345.552.439	77.345.552.439	32.242.976.395	42%	30.185.569.449	2.057.406.946
580	Estudios y Proyectos de Inversión	110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	48.204.890.578	48.204.890.578	5.837.706.914	12%	4.792.596.390	1.045.110.524
100 Servicios Personales		110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
140	Personal Contratado	110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
200 Servicios No Personales		3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
500 Inversión Física		44.835.545.876	44.835.545.876	5.728.338.914	13%	4.683.228.390	1.045.110.524
520	Construcciones	44.835.545.876	44.835.545.876	5.728.338.914	13%	4.683.228.390	1.045.110.524
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	47.566.754.835	47.566.754.835	21.519.185.372	45%	19.681.302.429	1.837.882.943
100 Servicios Personales		294.602.600	294.602.600	56.183.400	19%	56.183.400	0
140	Personal Contratado	294.602.600	294.602.600	56.183.400	19%	56.183.400	0
200 Servicios No Personales		4.926.688.360	4.926.688.360	730.389.969	15%	730.389.969	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.926.688.360	4.926.688.360	730.389.969	15%	730.389.969	0
500 Inversión Física		42.345.463.875	42.345.463.875	20.732.612.003	49%	18.894.729.060	1.837.882.943
520	Construcciones	42.345.463.875	42.345.463.875	20.732.612.003	49%	18.894.729.060	1.837.882.943
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	61.333.073.831	61.333.073.831	125.400.000	0,20%	62.700.000	62.700.000
100 Servicios Personales		2.096.400.000	2.096.400.000	125.400.000	6%	62.700.000	62.700.000
130	Asignaciones Complementarias	596.400.000	596.400.000	125.400.000	21%	62.700.000	62.700.000
140	Personal Contratado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.913.616.001	3.913.616.001	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	192.000.000	192.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.721.616.001	3.721.616.001	0	0%	0	0
500 Inversión Física		54.870.627.830	54.870.627.830	0	0%	0	0
520	Construcciones	54.870.627.830	54.870.627.830	0	0%	0	0
800 Transferencias		452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	48.589.351.420	48.589.351.420	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.766.616.000	7.766.616.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.598.616.000	7.598.616.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		40.226.335.420	40.226.335.420	0	0%	0	0
520 Construcciones		40.226.335.420	40.226.335.420	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	11.317.220.200	11.317.220.200	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		5.565.350.169.174	5.563.806.528.756	2.890.799.003.350	52%	2.448.903.828.237	441.895.175.113

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	62.980.193.858	62.980.193.858	36.752.565.679	58%	32.250.381.585	4.502.184.094
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	62.980.193.858	62.980.193.858	36.752.565.679	58%	32.250.381.585	4.502.184.094
800 Transferencias		62.980.193.858	62.980.193.858	36.752.565.679	58%	32.250.381.585	4.502.184.094
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		62.480.193.858	62.480.193.858	36.752.565.679	59%	32.250.381.585	4.502.184.094
860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		62.980.193.858	62.980.193.858	36.752.565.679	58%	32.250.381.585	4.502.184.094
TOTAL ENTIDAD		7.274.343.244.746	7.256.736.255.085	4.012.875.759.636	55%	3.487.508.094.540	525.367.665.096

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
