



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL


DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera


Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	271.255.443.267	271.255.443.267	194.101.175.858	72%
200 Servicios No Personales	303.291.579.787	303.291.579.787	174.740.591.471	58%
300 Bienes de Consumo e Insumos	180.563.501.151	180.563.501.151	108.577.540.527	60%
500 Inversión Física	5.183.171.075.283	5.165.564.085.622	3.378.561.581.784	65%
600 Inversión Financiera	791.098.140.919	791.098.140.919	697.204.582.633	88%
700 Servicio de la Deuda Pública	23.070.871.250	23.070.871.250	1.912.727.250	8%
800 Transferencias	509.265.822.171	509.265.822.171	429.088.124.113	84%
900 Otros Gastos	21.621.810.918	21.621.810.918	18.933.411.395	88%
TOTAL ENTIDAD	7.283.338.244.746	7.265.731.255.085	5.003.119.735.031	69%

Participación Presupuestaria

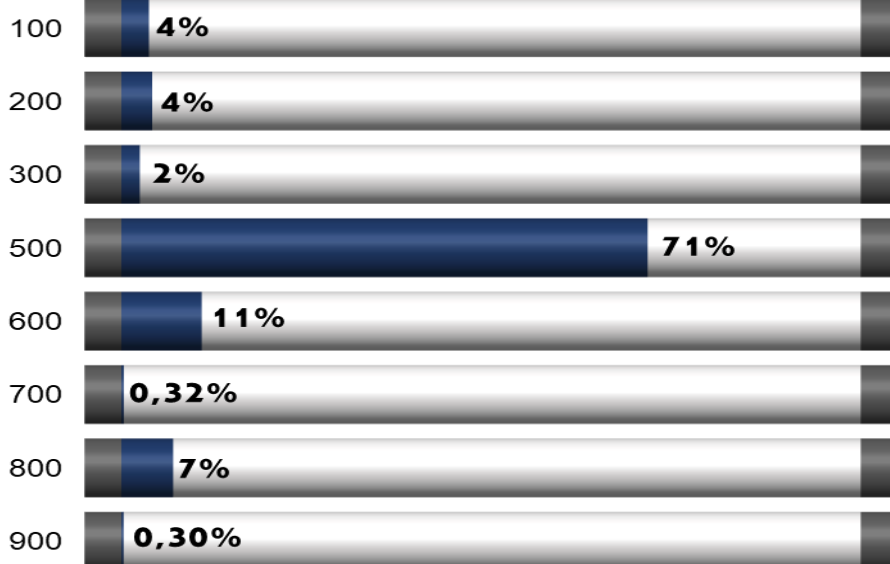


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

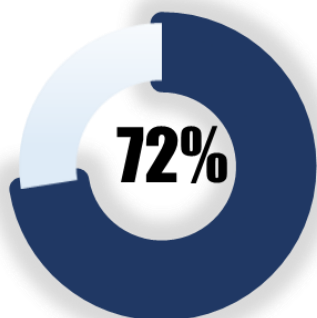


Presupuesto: ¢ 260.441.611.989
Ejecutado: ¢ 188.731.883.703

Recursos del Crédito Público

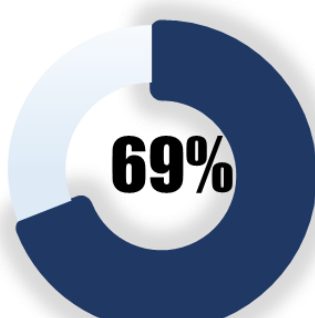

Presupuesto: ¢ 6.258.921.240.430
Ejecutado: ¢ 4.321.091.708.518

Recursos Institucionales

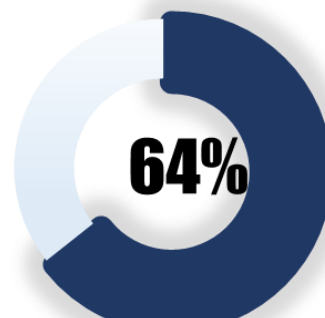

Presupuesto: ¢ 763.975.392.327
Ejecutado: ¢ 491.496.142.810

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.745.902.523.973	1.729.839.174.730	1.312.352.635.212	76%	1.140.954.781.655	171.397.853.557
01	Gestión Administrativa Financiera	348.582.215.286	348.582.215.286	245.081.169.688	70%	187.710.179.311	57.370.990.377
100 Servicios Personales		206.291.968.546	206.291.968.546	149.001.266.876	72%	111.808.069.887	37.193.196.989
110	Remuneraciones Básicas	149.741.734.946	149.741.734.946	108.266.922.870	72%	79.590.589.004	28.676.333.866
120	Remuneraciones Temporales	9.550.970.878	9.550.970.878	7.076.834.484	74%	5.495.356.736	1.581.477.748
130	Asignaciones Complementarias	26.757.283.483	26.757.283.483	17.040.244.685	64%	13.057.025.631	3.983.219.054
140	Personal Contratado	18.051.200.092	18.051.200.092	15.251.868.226	84%	12.630.164.260	2.621.703.966
190	Otros Gastos del Personal	2.190.779.147	2.190.779.147	1.365.396.611	62%	1.034.934.256	330.462.355
200 Servicios No Personales		85.003.588.584	85.003.588.584	70.231.326.621	83%	59.400.970.439	10.830.356.182
210	Servicios Básicos	6.499.626.952	6.499.626.952	5.312.970.141	82%	4.297.389.878	1.015.580.263
220	Transporte y Almacenaje	144.296.507	144.296.507	54.028.314	37%	26.063.065	27.965.249
230	Pasajes y Viáticos	4.899.978.839	4.899.978.839	4.203.645.685	86%	3.705.129.329	498.516.356
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.008.714.875	18.008.714.875	13.245.865.881	74%	12.326.371.828	919.494.053
250	Alquileres y Derechos	1.624.635.908	1.624.635.908	1.203.702.898	74%	1.097.219.414	106.483.484
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.519.800.170	15.519.800.170	12.880.782.771	83%	7.335.077.624	5.545.705.147
270	Servicio Social	34.207.652.833	34.207.652.833	31.349.775.456	92%	28.681.464.738	2.668.310.718
280	Otros Servicios en General	3.858.482.500	3.858.482.500	1.851.550.500	48%	1.851.550.500	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	240.400.000	240.400.000	129.004.975	54%	80.704.063	48.300.912
300 Bienes de Consumo e Insumos		31.796.533.773	31.796.533.773	19.636.025.072	62%	10.845.621.028	8.790.404.044
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.421.272.378	1.421.272.378	432.320.378	30%	432.320.378	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.217.966.075	1.217.966.075	294.259.211	24%	285.338.311	8.920.900
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	294.000.000	294.000.000	12.364.250	4%	12.364.250	0
360	Combustibles y Lubricantes	23.999.876.500	23.999.876.500	15.256.670.543	64%	6.475.187.399	8.781.483.144
390	Otros Bienes de Consumo	4.863.418.820	4.863.418.820	3.640.410.690	75%	3.640.410.690	0
500 Inversión Física		16.108.090.538	16.108.090.538	792.947.600	5%	792.947.600	0
520	Construcciones	97.167.998	97.167.998	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.787.082.917	2.787.082.917	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.666.310.423	3.666.310.423	80.947.600	2%	80.947.600	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.557.529.200	9.557.529.200	712.000.000	7%	712.000.000	0
800 Transferencias		1.609.600.000	1.609.600.000	34.800.000	2%	34.800.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.609.600.000	1.609.600.000	34.800.000	2%	34.800.000	0
900 Otros Gastos		7.772.433.845	7.772.433.845	5.384.803.519	69%	4.827.770.357	557.033.162
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.772.433.845	7.772.433.845	5.384.803.519	69%	4.827.770.357	557.033.162
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	369.596.892.513	369.596.892.513	330.059.984.134	99%	298.833.513.269	31.226.470.865
800 Transferencias		369.596.892.513	369.596.892.513	330.059.984.134	99%	298.833.513.269	31.226.470.865
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	369.596.892.513	369.596.892.513	330.059.984.134	99%	298.833.513.269	31.226.470.865

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	8.809.866.888	8.809.866.888	5.193.172.730	59%	4.393.022.682	800.150.048
100 Servicios Personales		4.743.978.148	4.743.978.148	3.941.660.400	83%	3.163.471.462	778.188.938
110 Remuneraciones Básicas		2.703.355.590	2.703.355.590	2.199.670.627	81%	1.799.730.513	399.940.114
120 Remuneraciones Temporales		157.361.524	157.361.524	102.368.382	65%	76.988.444	25.379.938
130 Asignaciones Complementarias		673.179.731	673.179.731	569.986.721	85%	475.473.408	94.513.313
140 Personal Contratado		1.070.927.082	1.070.927.082	933.859.409	87%	780.621.497	153.237.912
190 Otros Gastos del Personal		139.154.221	139.154.221	135.775.261	98%	30.657.600	105.117.661
200 Servicios No Personales		1.881.858.192	1.881.858.192	1.241.899.330	66%	1.219.938.220	21.961.110
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		102.858.192	102.858.192	44.819.302	44%	22.858.192	21.961.110
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.779.000.000	1.779.000.000	1.197.080.028	67%	1.197.080.028	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		15.429.400	15.429.400	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		525.400	525.400	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.904.000	14.904.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.008.601.148	2.008.601.148	9.613.000	0,48%	9.613.000	0
520 Construcciones		862.267.968	862.267.968	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		671.226.800	671.226.800	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		434.133.876	434.133.876	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		40.972.504	40.972.504	9.613.000	23%	9.613.000	0
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	5.905.490.576	5.905.490.576	2.863.124.075	48%	2.627.159.300	235.964.775
100 Servicios Personales		1.265.866.346	1.265.866.346	1.029.063.347	81%	826.562.612	202.500.735
120 Remuneraciones Temporales		226.302.024	226.302.024	165.257.134	73%	129.589.211	35.667.923
130 Asignaciones Complementarias		703.150.401	703.150.401	588.235.347	84%	485.820.223	102.415.124
140 Personal Contratado		204.649.023	204.649.023	166.336.412	81%	125.361.936	40.974.476
190 Otros Gastos del Personal		131.764.898	131.764.898	109.234.454	83%	85.791.242	23.443.212
200 Servicios No Personales		1.610.054.378	1.610.054.378	1.451.453.460	90%	1.417.989.420	33.464.040
230 Pasajes y Viáticos		483.504.186	483.504.186	338.913.111	70%	318.441.922	20.471.189
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		327.139.892	327.139.892	313.130.052	96%	313.130.052	0
250 Alquileres y Derechos		108.000.000	108.000.000	107.999.997	99%	95.007.146	12.992.851
260 Servicios Técnicos y Profesionales		691.410.300	691.410.300	691.410.300	100%	691.410.300	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		173.569.852	173.569.852	80.447.352	46%	80.447.352	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		24.199.852	24.199.852	11.447.352	47%	11.447.352	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		54.330.000	54.330.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		69.000.000	69.000.000	69.000.000	100%	69.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		21.040.000	21.040.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.436.000.000	2.436.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		331.000.000	331.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	302.159.916	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		420.000.000	420.000.000	302.159.916	72%	302.159.916	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	57.036.775.472	57.036.775.472	36.174.565.289	63%	26.245.755.414	9.928.809.875
100 Servicios Personales		38.850.107.365	38.850.107.365	30.803.413.502	79%	22.420.803.846	8.382.609.656
110	Remuneraciones Básicas	33.896.827.367	33.896.827.367	26.786.435.702	79%	19.203.991.587	7.582.444.115
120	Remuneraciones Temporales	375.076.907	375.076.907	266.511.802	71%	202.544.069	63.967.733
130	Asignaciones Complementarias	2.925.667.942	2.925.667.942	2.457.256.501	84%	1.977.276.719	479.979.782
140	Personal Contratado	1.487.893.556	1.487.893.556	1.233.409.306	83%	996.994.964	236.414.342
190	Otros Gastos del Personal	164.641.593	164.641.593	59.800.191	36%	39.996.507	19.803.684
200 Servicios No Personales		6.121.353.294	6.121.353.294	1.394.243.903	23%	870.724.168	523.519.735
230	Pasajes y Viáticos	948.928.005	948.928.005	665.002.014	70%	163.732.279	501.269.735
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.819.500.987	3.819.500.987	353.086.669	9%	353.086.669	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	41.840.320	28%	41.840.320	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.195.724.302	1.195.724.302	329.114.900	28%	306.864.900	22.250.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	7.200.000	7.200.000	5.200.000	72%	5.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.676.940.454	4.676.940.454	2.906.457.388	62%	2.593.491.188	312.966.200
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	178.672.000	178.672.000	70.000.000	39%	70.000.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	66.220.412	66.220.412	425.000	1%	425.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.181.249.600	1.181.249.600	1.181.246.275	99%	1.181.246.275	0
360	Combustibles y Lubricantes	3.250.798.442	3.250.798.442	1.654.786.113	51%	1.341.819.913	312.966.200
500 Inversión Física		7.296.100.547	7.296.100.547	1.070.450.496	15%	360.736.212	709.714.284
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.284.342.407	7.284.342.407	1.064.571.426	15%	354.857.142	709.714.284
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	11.758.140	11.758.140	5.879.070	50%	5.879.070	0
800 Transferencias		92.273.812	92.273.812	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
890	Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.122.107.622	2.122.107.622	1.502.882.479	71%	1.274.672.570	228.209.909
100 Servicios Personales		801.146.121	801.146.121	659.877.648	82%	534.366.090	125.511.558
120	Remuneraciones Temporales	186.524.583	186.524.583	125.596.833	67%	92.608.838	32.987.995
130	Asignaciones Complementarias	513.735.662	513.735.662	438.225.312	85%	353.742.868	84.482.444
140	Personal Contratado	100.885.876	100.885.876	96.055.503	95%	88.014.384	8.041.119
200 Servicios No Personales		1.060.952.341	1.060.952.341	843.004.831	79%	740.306.480	102.698.351
230	Pasajes y Viáticos	1.060.952.341	1.060.952.341	843.004.831	79%	740.306.480	102.698.351
500 Inversión Física		260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	260.009.160	260.009.160	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.440.047.659	1.440.047.659	167.948.011	12%	144.477.378	23.470.633
200 Servicios No Personales		245.000.000	245.000.000	167.948.011	69%	144.477.378	23.470.633
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	175.000.000	175.000.000	97.948.011	56%	74.477.378	23.470.633
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%	70.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		160.047.659	160.047.659	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.047.659	10.047.659	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.035.000.000	1.035.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	255.000.000	255.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.792.420.000	2.792.420.000	806.511.703	29%	659.115.944	147.395.759
200 Servicios No Personales		2.272.420.000	2.272.420.000	806.511.703	35%	659.115.944	147.395.759
230	Pasajes y Viáticos	227.500.000	227.500.000	167.659.222	74%	144.669.929	22.989.293
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.144.020.000	1.144.020.000	424.352.481	37%	299.946.015	124.406.466
250	Alquileres y Derechos	900.900.000	900.900.000	214.500.000	24%	214.500.000	0
500 Inversión Física		520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	67.511.973.103	67.511.973.103	59.651.475.428	88%	40.264.272.923	19.387.202.505
200 Servicios No Personales		279.420.000	279.420.000	230.509.183	82%	202.344.717	28.164.466
230	Pasajes y Viáticos	182.670.000	182.670.000	139.176.319	76%	111.011.853	28.164.466
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	96.750.000	96.750.000	91.332.864	94%	91.332.864	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		706.546.837	706.546.837	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	150	150	0	0%	0	0
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	46.546.687	46.546.687	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		64.763.021.572	64.763.021.572	58.757.981.551	91%	39.601.928.206	19.156.053.345
520	Construcciones	64.757.981.572	64.757.981.572	58.757.981.551	91%	39.601.928.206	19.156.053.345
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.040.000	5.040.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.762.984.694	1.762.984.694	662.984.694	38%	460.000.000	202.984.694
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.262.984.694	1.262.984.694	662.984.694	52%	460.000.000	202.984.694

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	7.825.374.381	7.825.374.381	1.821.043.654	23%	1.619.043.654	202.000.000
200 Servicios No Personales		1.670.970.202	1.670.970.202	1.305.420.818	78%	1.305.420.818	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.670.970.202	1.670.970.202	1.305.420.818	78%	1.305.420.818	0
500 Inversión Física		6.154.404.179	6.154.404.179	515.622.836	8%	313.622.836	202.000.000
520	Construcciones	5.496.323.751	5.496.323.751	313.622.836	6%	313.622.836	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	658.080.428	658.080.428	202.000.000	31%	0	202.000.000
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	4.679.781.487	4.679.781.487	3.226.526.936	69%	3.226.526.936	0
500 Inversión Física		4.679.781.487	4.679.781.487	3.226.526.936	69%	3.226.526.936	0
520	Construcciones	4.679.781.487	4.679.781.487	3.226.526.936	69%	3.226.526.936	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	37.816.904.617	21.753.555.374	19.578.040.349	90%	19.564.880.774	13.159.575
100 Servicios Personales		264.864.936	264.864.936	66.223.575	25%	53.064.000	13.159.575
140	Personal Contratado	263.981.361	263.981.361	65.340.000	25%	52.222.500	13.117.500
190	Otros Gastos de Personal	883.575	883.575	883.575	100%	841.500	42.075
500 Inversión Física		37.301.679.504	21.238.330.261	19.345.656.597	91%	19.345.656.597	0
520	Construcciones	35.032.843.683	18.969.494.440	17.076.820.776	90%	17.076.820.776	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.268.835.821	2.268.835.821	2.268.835.821	100%	2.268.835.821	0
800 Transferencias		250.360.177	250.360.177	166.160.177	66%	166.160.177	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.360.177	250.360.177	166.160.177	66%	166.160.177	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	8.838.872.131	8.838.872.131	3.820.461.629	43%	3.820.461.629	0
500 Inversión Física		8.838.872.131	8.838.872.131	3.820.461.629	43%	3.820.461.629	0
520	Construcciones	8.838.872.131	8.838.872.131	3.820.461.629	43%	3.820.461.629	0
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	50.509.774.032	50.509.774.032	47.434.091.312	94%	47.020.005.510	414.085.802
500 Inversión Física		34.655.718.392	34.655.718.392	31.580.035.672	91%	31.165.949.870	414.085.802
520	Construcciones	34.655.718.391	34.655.718.391	31.580.035.672	91%	31.165.949.870	414.085.802
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1	1	0	0%	0	0
800 Transferencias		15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	15.854.055.640	15.854.055.640	15.854.055.640	100%	15.854.055.640	0
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	11.699.878.730	11.699.878.730	3.012.293.409	26%	3.012.293.409	0
200 Servicios No Personales		231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	231.471.249	231.471.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	910.371.959	910.371.959	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.558.035.522	10.558.035.522	3.012.293.409	29%	3.012.293.409	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	10.558.035.522	10.558.035.522	3.012.293.409	29%	3.012.293.409	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	13.357.188.338	13.357.188.338	7.839.265.245	59%	7.605.620.348	233.644.897
200 Servicios No Personales		2.201.949.213	2.201.949.213	1.974.046.167	90%	1.740.401.270	233.644.897
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.201.949.213	2.201.949.213	1.974.046.167	90%	1.740.401.270	233.644.897
500 Inversión Física		11.125.733.167	11.125.733.167	5.865.219.078	53%	5.865.219.078	0
520	Construcciones	11.025.616.810	11.025.616.810	5.865.219.078	53%	5.865.219.078	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.116.357	100.116.357	0	0%	0	0
800 Transferencias		29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.505.958	29.505.958	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	98.977.047.807	98.977.047.807	98.099.704.513	99%	98.099.704.513	0
500 Inversión Física		98.977.047.807	98.977.047.807	98.099.704.513	99%	98.099.704.513	0
520	Construcciones	98.542.884.415	98.542.884.415	98.099.704.513	99%	98.099.704.513	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	434.163.392	434.163.392	0	0%	0	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	33.477.363.435	33.477.363.435	30.287.384.144	90%	27.773.950.427	2.513.433.717
500 Inversión Física		33.275.189.335	33.275.189.335	30.132.882.544	91%	27.724.809.027	2.408.073.517
520	Construcciones	30.315.325.442	30.315.325.442	28.359.506.958	94%	27.724.809.027	634.697.931
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.959.863.893	2.959.863.893	1.773.375.586	60%	0	1.773.375.586
800 Transferencias		202.174.100	202.174.100	154.501.600	76%	49.141.400	105.360.200
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	202.174.100	202.174.100	154.501.600	76%	49.141.400	105.360.200
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	18.113.087.485	18.113.087.485	13.611.490.422	75%	8.832.995.539	4.778.494.883
500 Inversión Física		17.911.417.885	17.911.417.885	13.611.490.422	76%	8.832.995.539	4.778.494.883
520	Construcciones	16.430.809.061	16.430.809.061	12.750.116.461	78%	8.150.116.461	4.600.000.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.480.608.824	1.480.608.824	861.373.961	58%	682.879.078	178.494.883
800 Transferencias		201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	201.669.600	201.669.600	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	168.932.163.760	168.932.163.760	98.807.421.848	58%	87.928.037.983	10.879.383.865
500 Inversión Física		168.932.163.760	168.932.163.760	98.807.421.848	58%	87.928.037.983	10.879.383.865
520	Construcciones	165.802.123.030	165.802.123.030	96.931.484.324	58%	86.057.065.766	10.874.418.558
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.130.040.730	3.130.040.730	1.875.937.524	60%	1.870.972.217	4.965.307
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	161.382.580.758	161.382.580.758	140.869.853.671	87%	117.391.663.215	23.478.190.456
500 Inversión Física		159.382.580.758	159.382.580.758	140.869.853.671	88%	117.391.663.215	23.478.190.456
520	Construcciones	159.382.580.758	159.382.580.758	140.869.853.671	88%	117.391.663.215	23.478.190.456
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
500 Inversión Física		11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0
520	Construcciones	11.871.359.178	11.871.359.178	3.787.246.603	32%	3.787.246.603	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	34.043.679.896	34.043.679.896	10.069.843.202	30%	8.255.824.893	1.814.018.309
100 Servicios Personales		4.886.680.000	4.886.680.000	2.769.928.000	57%	2.552.340.000	217.588.000
140	Personal Contratado	4.865.780.000	4.865.780.000	2.749.028.000	56%	2.531.440.000	217.588.000
190	Otros Gastos del Personal	20.900.000	20.900.000	20.900.000	100%	20.900.000	0
200 Servicios No Personales		7.616.254.042	7.616.254.042	4.771.679.158	63%	3.229.514.099	1.542.165.059
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.616.254.042	7.616.254.042	4.771.679.158	63%	3.229.514.099	1.542.165.059
500 Inversión Física		18.940.510.734	18.940.510.734	1.685.843.494	9%	1.685.843.494	0
520	Construcciones	16.042.719.409	16.042.719.409	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.697.791.325	2.697.791.325	1.685.843.494	62%	1.685.843.494	0
800 Transferencias		2.600.235.120	2.600.235.120	842.392.550	32%	788.127.300	54.265.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.305.235.120	1.305.235.120	677.392.550	52%	623.127.300	54.265.250
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	1.295.000.000	1.295.000.000	165.000.000	13%	165.000.000	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	69.548.338.261	69.548.338.261	62.499.774.054	90%	56.466.968.963	6.032.805.091
500 Inversión Física		69.548.338.261	69.548.338.261	62.499.774.054	90%	56.466.968.963	6.032.805.091
520	Construcciones	69.548.338.261	69.548.338.261	62.499.774.054	90%	56.466.968.963	6.032.805.091
41	Ejec de Conv de Coop con el MSPYBS bajo la Ley de Emergencia	491.643.875	491.643.875	491.643.875	100%	491.643.875	0
500 Inversión Física		491.643.875	491.643.875	491.643.875	100%	491.643.875	0
520	Construcciones	491.643.875	491.643.875	491.643.875	100%	491.643.875	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	92.881.774.272	92.881.774.272	82.517.131.663	89%	80.827.159.447	1.689.972.216
500 Inversión Física		92.881.774.272	92.881.774.272	82.517.131.663	89%	80.827.159.447	1.689.972.216
520	Construcciones	92.881.774.272	92.881.774.272	82.517.131.663	89%	80.827.159.447	1.689.972.216
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	815.913.228	815.913.228	815.913.228	100%	815.913.228	0
500 Inversión Física		815.913.228	815.913.228	815.913.228	100%	815.913.228	0
520	Construcciones	815.913.228	815.913.228	815.913.228	100%	815.913.228	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	349.944.668	349.944.668	349.944.668	100%	349.944.668	0
500 Inversión Física		349.944.668	349.944.668	349.944.668	100%	349.944.668	0
520	Construcciones	349.944.668	349.944.668	349.944.668	100%	349.944.668	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	17.579.350.000	17.579.350.000	1.912.727.250	11%	1.912.727.250	0
100 Servicios Personales		109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		692.522.750	692.522.750	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	692.522.750	692.522.750	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.864.600.000	14.864.600.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	14.864.600.000	14.864.600.000	0	0%	0	0
700 Servicios de la Deuda Pública		1.912.727.250	1.912.727.250	1.912.727.250	100%	1.912.727.250	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	1.912.727.250	1.912.727.250	1.912.727.250	100%	1.912.727.250	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	21.900.000	21.900.000	0	0%	0	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Sur	38.890.814.515	38.890.814.515	0	0%	0	0
500 Inversión Física		38.890.814.515	38.890.814.515	0	0%	0	0
520	Construcciones	38.890.814.515	38.890.814.515	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.745.902.523.973	1.729.839.174.730	1.312.352.635.212	76%	1.140.954.781.655	171.397.853.557

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.549.239.655.381	4.547.696.014.963	3.217.821.280.292	71%	2.797.984.845.041	419.836.435.251
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	3.809.204.251	3.809.204.251	310.102.711	8%	307.613.015	2.489.696
100 Servicios Personales		180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		928.032.000	928.032.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	928.032.000	928.032.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.700.772.251	2.700.772.251	310.102.711	11%	307.613.015	2.489.696
520	Construcciones	2.334.648.049	2.334.648.049	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	366.124.202	366.124.202	310.102.711	85%	307.613.015	2.489.696
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	176.671.128.839	176.671.128.839	130.617.603.948	74%	127.900.595.280	2.717.008.668
200 Servicios No Personales		336.691.080	336.691.080	32.556.331	10%	32.556.331	0
230	Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	32.556.331	16%	32.556.331	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	136.691.080	136.691.080	0	0%	0	0
500 Inversión Física		176.311.437.759	176.311.437.759	130.585.047.617	74%	127.868.038.949	2.717.008.668
520	Construcciones	175.711.437.759	175.711.437.759	130.264.350.291	74%	127.868.038.949	2.396.311.342
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	600.000.000	600.000.000	320.697.326	53%	0	320.697.326
800 Transferencias		23.000.000	23.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23.000.000	23.000.000	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	142.927.469.172	142.927.469.172	30.727.740.205	21%	26.183.452.839	4.544.287.366
200 Servicios No Personales		1.656.084.809	1.656.084.809	127.869.778	8%	127.869.778	0
230	Pasajes y Viáticos	6.999.999	6.999.999	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.649.084.810	1.649.084.810	127.869.778	8%	127.869.778	0
500 Inversión Física		140.271.384.363	140.271.384.363	30.435.221.102	22%	25.953.477.136	4.481.743.966
520	Construcciones	138.778.873.812	138.778.873.812	29.937.541.437	22%	25.953.477.136	3.984.064.301
580	Estudios y Proyectos de Inversión	162.388.114	162.388.114	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.330.122.437	1.330.122.437	497.679.665	37%	0	497.679.665
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	164.649.325	16%	102.105.925	62.543.400
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	164.649.325	16%	102.105.925	62.543.400
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	178.600.501.807	178.600.501.807	155.164.962.070	87%	152.474.550.383	2.690.411.687
200 Servicios No Personales		80.451.825	80.451.825	7.731.825	10%	7.731.825	0
230	Pasajes y Viáticos	37.731.825	37.731.825	7.731.825	20%	7.731.825	0
250	Alquileres y Derechos	42.720.000	42.720.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		178.520.049.982	178.520.049.982	155.157.230.245	87%	152.466.818.558	2.690.411.687
520	Construcciones	175.240.917.509	175.240.917.509	152.756.875.456	87%	150.066.463.769	2.690.411.687
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.279.132.473	3.279.132.473	2.400.354.789	73%	2.400.354.789	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	27.459.426.150	27.459.426.150	4.830.429.975	18%	3.821.061.058	1.009.368.917
200 Servicios No Personales		3.387.266.405	3.387.266.405	172.260.000	5%	172.260.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.387.266.405	3.387.266.405	172.260.000	5%	172.260.000	0
500 Inversión Física		23.781.390.548	23.781.390.548	4.658.169.975	20%	3.648.801.058	1.009.368.917
520	Construcciones	17.800.502.010	17.800.502.010	4.577.281.437	26%	3.648.801.058	928.480.379
580	Estudios y Proyectos de Inversión	80.888.538	80.888.538	80.888.538	100%	0	80.888.538
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.900.000.000	5.900.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.769.197	290.769.197	0	0%	0	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	63.863.987.642	63.863.987.642	42.804.450.388	67%	42.804.450.388	0
200 Servicios No Personales		1.720.396.098	1.720.396.098	99.386.918	6%	99.386.918	0
230	Pasajes y Viáticos	27.886.918	27.886.918	24.386.918	87%	24.386.918	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.692.509.180	1.692.509.180	75.000.000	4%	75.000.000	0
500 Inversión Física		62.143.591.544	62.143.591.544	42.705.063.470	69%	42.705.063.470	0
520	Construcciones	55.705.549.590	55.705.549.590	40.468.859.320	73%	40.468.859.320	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.438.041.954	6.438.041.954	2.236.204.150	35%	2.236.204.150	0
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	48.622.148.974	48.622.148.974	38.623.682.016	79%	34.619.801.145	4.003.880.871
200 Servicios No Personales		3.116.510.147	3.116.510.147	2.430.991.988	78%	1.539.725.689	891.266.299
230	Pasajes y Viáticos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.076.510.147	3.076.510.147	2.430.991.988	79%	1.539.725.689	891.266.299
500 Inversión Física		45.505.638.827	45.505.638.827	36.192.690.028	80%	33.080.075.456	3.112.614.572
520	Construcciones	45.505.638.827	45.505.638.827	36.192.690.028	80%	33.080.075.456	3.112.614.572

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	29.118.415.947	29.118.415.947	21.496.027.225	74%	19.696.602.042	1.799.425.183
200 Servicios No Personales		68.613.082	68.613.082	26.330.421	38%	25.711.875	618.546
230	Pasajes y Viáticos	68.613.082	68.613.082	26.330.421	38%	25.711.875	618.546
500	Inversión Física	29.049.802.865	29.049.802.865	21.469.696.804	74%	19.670.890.167	1.798.806.637
520	Construcciones	28.049.802.865	28.049.802.865	21.469.696.804	77%	19.670.890.167	1.798.806.637
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	10.608.576.888	10.608.576.888	8.120.613.326	77%	7.277.555.917	843.057.409
500	Inversión Física	10.608.576.888	10.608.576.888	8.120.613.326	77%	7.277.555.917	843.057.409
520	Construcciones	10.608.576.888	10.608.576.888	8.120.613.326	77%	7.277.555.917	843.057.409
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	71.505.414.522	71.505.414.522	29.888.137.007	42%	27.033.450.702	2.854.686.305
100	Servicios Personales	760.115.000	760.115.000	583.000.000	77%	524.700.000	58.300.000
130	Asignaciones Complementarias	60.515.000	60.515.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	699.600.000	699.600.000	583.000.000	83%	524.700.000	58.300.000
200	Servicios No Personales	2.009.716.582	2.009.716.582	73.804.238	4%	73.804.238	0
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	13.719.238	23%	13.719.238	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.949.716.582	1.949.716.582	60.085.000	3%	60.085.000	0
500	Inversión Física	68.735.582.940	68.735.582.940	29.231.332.769	43%	26.434.946.464	2.796.386.305
520	Construcciones	68.735.582.940	68.735.582.940	29.231.332.769	43%	26.434.946.464	2.796.386.305
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	119.522.452.792	119.522.452.792	92.477.841.740	77%	76.895.296.513	15.582.545.227
100	Servicios Personales	61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	61.880.000	61.880.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	4.021.287.230	4.021.287.230	549.000.000	14%	427.500.000	121.500.000
220	Transporte Y Almacenaje	138.324.789	138.324.789	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	3.738.962.441	3.738.962.441	549.000.000	15%	427.500.000	121.500.000
290	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	214.187.822	0
320	Textiles Y Vestuarios	214.187.822	214.187.822	214.187.822	100%	214.187.822	0
500	Inversión Física	115.145.097.740	115.145.097.740	91.714.653.918	80%	76.253.608.691	15.461.045.227
520	Construcciones	111.531.049.740	111.531.049.740	90.404.952.902	81%	74.943.907.675	15.461.045.227
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.365.890.119	3.365.890.119	1.309.701.016	39%	1.309.701.016	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	248.157.881	248.157.881	0	0%	0	0
800	Transferencias	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	8.694.511.792	8.694.511.792	5.835.772.130	67%	5.163.165.209	672.606.921
200	Servicios No Personales	6.042.007.455	6.042.007.455	3.233.135.978	54%	2.560.529.057	672.606.921
230	Pasajes y Viáticos	6.042.007.455	6.042.007.455	3.233.135.978	54%	2.560.529.057	672.606.921
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.652.504.337	2.652.504.337	2.602.636.152	98%	2.602.636.152	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	49.868.185	49.868.185	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	2.602.636.152	2.602.636.152	2.602.636.152	100%	2.602.636.152	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	12.014.769.391	12.014.769.391	5.358.370.204	45%	3.846.261.572	1.512.108.632
500	Inversión Física	12.014.769.391	12.014.769.391	5.358.370.204	45%	3.846.261.572	1.512.108.632
520	Construcciones	12.014.769.391	12.014.769.391	5.358.370.204	45%	3.846.261.572	1.512.108.632

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	29.358.651.741	29.358.651.741	25.652.434.888	87%	25.652.434.888	0
500 Inversión Física		29.358.651.741	29.358.651.741	25.652.434.888	87%	25.652.434.888	0
520	Construcciones	29.358.651.741	29.358.651.741	25.652.434.888	87%	25.652.434.888	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	989.387.695	989.387.695	0	0%	0	0
500 Inversión Física		989.387.695	989.387.695	0	0%	0	0
520	Construcciones	989.387.695	989.387.695	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	3.124.615.513	3.124.615.513	2.496.411.572	80%	2.361.322.019	135.089.553
500 Inversión Física		2.486.599.306	2.486.599.306	1.858.395.365	75%	1.858.395.365	0
520	Construcciones	2.472.803.674	2.472.803.674	1.858.395.365	75%	1.858.395.365	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.795.632	13.795.632	0	0%	0	0
800 Transferencias		638.016.207	638.016.207	638.016.207	100%	502.926.654	135.089.553
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	638.016.207	638.016.207	638.016.207	100%	502.926.654	135.089.553
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	8.799.264.836	8.799.264.836	8.131.979.351	92%	7.884.991.803	246.987.548
500 Inversión Física		8.455.379.778	8.455.379.778	7.788.094.293	92%	7.541.106.745	246.987.548
520	Construcciones	8.208.392.230	8.208.392.230	7.541.106.745	92%	7.541.106.745	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	246.987.548	246.987.548	246.987.548	100%	0	246.987.548
800 Transferencias		343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	343.885.058	343.885.058	343.885.058	100%	343.885.058	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	942.905.079	942.905.079	316.653.500	34%	316.653.500	0
500 Inversión Física		938.222.388	938.222.388	316.653.500	34%	316.653.500	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	938.222.388	938.222.388	316.653.500	34%	316.653.500	0
800 Transferencias		4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.682.691	4.682.691	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	829.827.424.548	829.827.424.548	732.649.786.683	88%	691.551.875.422	41.097.911.261
200	Servicios No Personales	2.315.424.538	2.315.424.538	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	806.704.277	806.704.277	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.508.720.261	1.508.720.261	0	0%	0	0
500	Inversión Física	13.292.598.614	13.292.598.614	12.577.060.858	95%	7.091.789.194	5.485.271.664
520	Construcciones	524.632.451	524.632.451	92.079.414	18%	92.079.414	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	12.767.966.163	12.767.966.163	12.484.981.444	98%	6.999.709.780	5.485.271.664
600	Inversión Financiera	791.098.140.919	791.098.140.919	697.204.582.633	88%	665.612.226.764	31.592.355.869
630	Préstamos al Sector Privado	791.098.140.919	791.098.140.919	697.204.582.633	88%	665.612.226.764	31.592.355.869
800	Transferencias	23.121.260.477	23.121.260.477	22.868.143.192	99%	18.847.859.464	4.020.283.728
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.270.360.477	2.270.360.477	2.017.243.192	89%	1.897.259.464	119.983.728
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	20.850.900.000	20.850.900.000	20.850.900.000	100%	16.950.600.000	3.900.300.000
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	13.497.560.024	13.497.560.024	9.540.067.933	71%	8.257.188.650	1.282.879.283
500	Inversión Física	12.704.835.337	12.704.835.337	9.540.067.933	75%	8.257.188.650	1.282.879.283
520	Construcciones	8.015.324.713	8.015.324.713	7.507.203.785	94%	7.507.203.785	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.689.510.624	4.689.510.624	2.032.864.148	43%	749.984.865	1.282.879.283
800	Transferencias	792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	792.724.687	792.724.687	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.543.640.418	0	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
500	Inversión Física	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
520	Construcciones	6.570.702.616	6.570.702.616	705.831.288	11%	705.831.288	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumí - San Juan N. EMP. RN 6	37.721.551.502	37.721.551.502	24.290.320.068	64%	24.133.867.365	156.452.703
200	Servicios No Personales	2.944.313.987	2.944.313.987	72.441.600	2%	72.441.600	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.944.313.987	2.944.313.987	72.441.600	2%	72.441.600	0
500	Inversión Física	34.777.237.515	34.777.237.515	24.217.878.468	70%	24.061.425.765	156.452.703
520	Construcciones	33.768.146.345	33.768.146.345	23.713.332.883	70%	23.556.880.180	156.452.703
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.009.091.170	1.009.091.170	504.545.585	50%	504.545.585	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	58.007.845.135	58.007.845.135	18.605.893.906	32%	18.520.725.520	85.168.386
100	Servicios Personales	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.400.000	82.400.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	56.725.445.135	56.725.445.135	18.605.893.906	33%	18.520.725.520	85.168.386
520	Construcciones	55.725.445.135	55.725.445.135	18.605.893.906	33%	18.520.725.520	85.168.386
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	124.311.178.541	124.311.178.541	44.234.411.718	36%	41.127.863.706	3.106.548.012
200 Servicios No Personales		6.714.382.472	6.714.382.472	4.720.687.768	70%	4.332.596.121	388.091.647
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	3.491.968	6%	3.491.968	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.654.382.472	6.654.382.472	4.717.195.800	71%	4.329.104.153	388.091.647
500 Inversión Física		117.596.796.069	117.596.796.069	39.513.723.950	34%	36.795.267.585	2.718.456.365
520	Construcciones	117.596.796.069	117.596.796.069	39.513.723.950	34%	36.795.267.585	2.718.456.365
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	385.580.651.479	385.580.651.479	287.859.623.447	75%	271.706.236.135	16.153.387.312
100 Servicios Personales		1.132.000.000	1.132.000.000	518.611.490	46%	441.013.308	77.598.182
140	Personal Contratado	1.132.000.000	1.132.000.000	518.611.490	46%	441.013.308	77.598.182
200 Servicios No Personales		20.786.389.503	20.786.389.503	12.363.056.415	59%	7.665.999.014	4.697.057.401
230	Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	13.401.830	5%	13.401.830	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	20.536.389.503	20.536.389.503	12.349.654.585	60%	7.652.597.184	4.697.057.401
500 Inversión Física		350.319.842.519	350.319.842.519	261.635.536.085	75%	250.256.804.356	11.378.731.729
520	Construcciones	346.419.842.519	346.419.842.519	261.635.536.085	76%	250.256.804.356	11.378.731.729
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	13.342.419.457	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	13.342.419.457	13.342.419.457	13.342.419.457	100%	13.342.419.457	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	193.567.100.586	193.567.100.586	169.653.821.674	88%	152.683.219.260	16.970.602.414
100 Servicios Personales		704.000.000	704.000.000	580.800.000	83%	411.426.666	169.373.334
140	Personal Contratado	704.000.000	704.000.000	580.800.000	83%	411.426.666	169.373.334
200 Servicios No Personales		682.236.576	682.236.576	69.720.226	10%	61.288.474	8.431.752
220	Transporte y Almacenaje	142.350.000	142.350.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	455.911.464	455.911.464	69.720.226	15%	61.288.474	8.431.752
260	Servicios Técnicos y Profesionales	83.975.112	83.975.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		192.180.864.010	192.180.864.010	169.003.301.448	88%	152.210.504.120	16.792.797.328
520	Construcciones	192.180.864.010	192.180.864.010	169.003.301.448	88%	152.210.504.120	16.792.797.328
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	4.231.095.535	4.231.095.535	1.153.408.096	27%	1.153.408.096	0
500 Inversión Física		4.087.866.494	4.087.866.494	1.010.179.055	25%	1.010.179.055	0
520	Construcciones	4.087.866.494	4.087.866.494	1.010.179.055	25%	1.010.179.055	0
900 Otros Gastos		143.229.041	143.229.041	143.229.041	100%	143.229.041	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	143.229.041	143.229.041	143.229.041	100%	143.229.041	0
61	Mejoramiento de Caminos Departamento San Pedro	1.877.991.816	1.877.991.816	684.123.406	36%	611.329.393	72.794.013
500 Inversión Física		1.877.991.816	1.877.991.816	684.123.406	36%	611.329.393	72.794.013
520	Construcciones	1.805.197.803	1.805.197.803	611.329.393	34%	611.329.393	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	72.794.013	72.794.013	72.794.013	100%	0	72.794.013

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento de Caminos Departamento Cordillera	30	30	0	0%	0	0
500	Inversión Física	30	30	0	0%	0	0
520	Construcciones	30	30	0	0%	0	0
64	Mejoramiento de Caminos Departamento Ñeembucú	1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
500	Inversión Física	1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
520	Construcciones	1.704.053.101	1.704.053.101	1.704.053.101	100%	1.704.053.101	0
65	Mejoramiento de Caminos Departamento Itapúa	3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
500	Inversión Física	3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
520	Construcciones	3.052.708.183	3.052.708.183	2.847.132.477	93%	2.847.132.477	0
66	Mejoramiento de Caminos Departamento Central	5.441.302.217	5.441.302.217	4.367.388.588	80%	4.367.388.588	0
500	Inversión Física	5.441.302.217	5.441.302.217	4.367.388.588	80%	4.367.388.588	0
520	Construcciones	5.441.302.217	5.441.302.217	4.367.388.588	80%	4.367.388.588	0
68	Mejoramiento de Caminos Departamento Guairá	913.045.606	913.045.606	913.045.576	100%	913.045.576	0
500	Inversión Física	913.045.606	913.045.606	913.045.576	100%	913.045.576	0
520	Construcciones	913.045.606	913.045.606	913.045.576	100%	913.045.576	0
69	Mejoramiento de Caminos Departamento Caaguazú	17.824.843.923	17.824.843.923	16.772.731.098	94%	9.058.190.968	7.714.540.130
500	Inversión Física	17.824.843.923	17.824.843.923	16.772.731.098	94%	9.058.190.968	7.714.540.130
520	Construcciones	17.824.843.923	17.824.843.923	16.772.731.098	94%	9.058.190.968	7.714.540.130
70	Mejoramiento de Caminos Departamento Alto Paraná	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
500	Inversión Física	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
520	Construcciones	59.819.669	59.819.669	0	0%	0	0
71	Mejoramiento de Caminos Departamento Misiones	156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	53.330.580	0
500	Inversión Física	156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	53.330.580	0
520	Construcciones	156.773.872	156.773.872	53.330.580	34%	53.330.580	0
72	Mejoramiento de Caminos Departamento Canindeyú	25.602.124.769	25.602.124.769	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
500	Inversión Física	25.602.124.769	25.602.124.769	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
520	Construcciones	25.602.124.769	25.602.124.769	4.133.617.339	16%	4.133.617.339	0
73	Mejoramiento de Caminos Departamento Concepción	8.919.198.129	8.919.198.129	6.276.758.118	70%	6.276.758.118	0
500	Inversión Física	8.919.198.129	8.919.198.129	6.276.758.118	70%	6.276.758.118	0
520	Construcciones	8.919.198.129	8.919.198.129	6.276.758.118	70%	6.276.758.118	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	340.076.139.240	340.076.139.240	252.196.019.513	74%	193.641.155.705	58.554.863.808
200	Servicios No Personales	421.965.518	421.965.518	60.500.000	14%	60.500.000	0
230	Pasajes y Viáticos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	50.031.201	50.031.201	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	351.934.317	351.934.317	60.500.000	17%	60.500.000	0
500	Inversión Física	338.174.173.722	338.174.173.722	251.662.052.868	74%	193.202.668.120	58.459.384.748
520	Construcciones	303.229.700.020	303.229.700.020	229.591.671.552	76%	180.542.880.994	49.048.790.558
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	44.473.702	44.473.702	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	34.900.000.000	34.900.000.000	22.070.381.316	63%	12.659.787.126	9.410.594.190
800	Transferencias	1.480.000.000	1.480.000.000	473.466.645	32%	377.987.585	95.479.060
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.480.000.000	1.480.000.000	473.466.645	32%	377.987.585	95.479.060

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	114.424.167.666	114.424.167.666	26.235.867.620	23%	23.062.385.389	3.173.482.231
200 Servicios No Personales		320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		111.404.167.666	111.404.167.666	24.685.163.790	22%	22.434.059.068	2.251.104.722
520	Construcciones	106.503.943.720	106.503.943.720	22.580.841.924	21%	21.384.867.479	1.195.974.445
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.900.223.946	4.900.223.946	2.104.321.866	43%	1.049.191.589	1.055.130.277
800 Transferencias		2.700.000.000	2.700.000.000	1.550.703.830	57%	628.326.321	922.377.509
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.700.000.000	2.700.000.000	1.550.703.830	57%	628.326.321	922.377.509
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	266.883.925.138	266.883.925.138	229.135.410.643	86%	219.020.592.214	10.114.818.429
200 Servicios No Personales		1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.152.000.000	1.152.000.000	70.400.000	6%	70.400.000	0
500 Inversión Física		265.731.925.138	265.731.925.138	229.065.010.643	86%	218.950.192.214	10.114.818.429
520	Construcciones	259.929.924.859	259.929.924.859	227.933.471.327	88%	217.818.652.898	10.114.818.429
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.302.000.279	3.302.000.279	1.131.539.316	34%	1.131.539.316	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	134.542.554.850	134.542.554.850	106.956.397.725	79%	92.136.149.452	14.820.248.273
200 Servicios No Personales		501.980.000	501.980.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	501.980.000	501.980.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		134.040.574.850	134.040.574.850	106.956.397.725	80%	92.136.149.452	14.820.248.273
520	Construcciones	127.290.574.851	127.290.574.851	106.680.499.919	84%	91.860.251.646	14.820.248.273
580	Estudios y Proyectos de Inversión	4.149.999.999	4.149.999.999	275.897.806	7%	275.897.806	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0%	0	0
80	Construcción Pav s/ Empedrados en Región Centro Este	3.096.524.657	3.096.524.657	482.759.213	16%	0	482.759.213
500 Inversión Física		3.096.524.657	3.096.524.657	482.759.213	16%	0	482.759.213
520	Construcciones	3.096.524.657	3.096.524.657	482.759.213	16%	0	482.759.213
82	SP Pav. Asf. Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque	1.737.790.658	1.737.790.658	1.172.653.368	67%	1.003.754.750	168.898.618
500 Inversión Física		1.737.790.658	1.737.790.658	1.172.653.368	67%	1.003.754.750	168.898.618
520	Construcciones	1.568.892.040	1.568.892.040	1.003.754.750	64%	1.003.754.750	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	168.898.618	168.898.618	168.898.618	100%	0	168.898.618
85	SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF, COMP, RN 10)	380.000.000	380.000.000	152.689.302	40%	0	152.689.302
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	152.689.302	40%	0	152.689.302
520	Construcciones	380.000.000	380.000.000	152.689.302	40%	0	152.689.302
86	SP Mej. Gestión y Mant de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)	2.703.442.610	2.703.442.610	1.603.442.610	59%	1.603.442.610	0
500 Inversión Física		2.703.442.610	2.703.442.610	1.603.442.610	59%	1.603.442.610	0
520	Construcciones	2.703.442.610	2.703.442.610	1.603.442.610	59%	1.603.442.610	0
87	Mejoramiento Tramvesía Urbana de Coronel Oviedo	8.554.587.743	8.554.587.743	7.879.098.588	92%	0	7.879.098.588
500 Inversión Física		8.554.587.743	8.554.587.743	7.879.098.588	92%	0	7.879.098.588
520	Construcciones	8.554.587.743	8.554.587.743	7.879.098.588	92%	0	7.879.098.588
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	49.546.707.192	49.546.707.192	35.152.424.183	71%	16.248.349.491	18.904.074.692
500 Inversión Física		49.546.707.192	49.546.707.192	35.152.424.183	71%	16.248.349.491	18.904.074.692
520	Construcciones	49.546.707.192	49.546.707.192	35.152.424.183	71%	16.248.349.491	18.904.074.692

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
89	SP AP. Pre. Prog. de Mod. del Sec. Tra. PY ATN/OC- 11921-PR	477.656.609	477.656.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		477.656.609	477.656.609	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	477.656.609	477.656.609	0	0%	0	0
91	SP Pav.Corred. de Integr.Rehab. y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
500 Inversión Física		604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
520	Construcciones	604.000.942	604.000.942	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	96.047.221.501	96.047.221.501	59.186.094.721	62%	38.497.982.552	20.688.112.169
200 Servicios No Personales		3.352.765.263	3.352.765.263	124.965.500	4%	124.965.500	0
230	Pasajes y Viáticos	41.000.000	41.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.311.765.263	3.311.765.263	124.965.500	4%	124.965.500	0
500 Inversión Física		91.094.456.238	91.094.456.238	58.911.214.765	65%	38.346.923.209	20.564.291.556
520	Construcciones	83.907.288.550	83.907.288.550	56.561.588.507	67%	36.812.587.831	19.749.000.676
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.187.167.688	7.187.167.688	2.349.626.258	33%	1.534.335.378	815.290.880
800 Transferencias		1.600.000.000	1.600.000.000	149.914.456	9%	26.093.843	123.820.613
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.600.000.000	1.600.000.000	149.914.456	9%	26.093.843	123.820.613
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	180.614.000.000	180.614.000.000	176.153.623.074	98%	120.073.750.863	56.079.872.211
200 Servicios No Personales		504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	504.000.000	504.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		180.110.000.000	180.110.000.000	176.153.623.074	98%	120.073.750.863	56.079.872.211
520	Construcciones	179.280.000.000	179.280.000.000	176.153.623.074	98%	120.073.750.863	56.079.872.211
580	Estudios y Proyectos de Inversión	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	108.057.993.548	108.057.993.548	62.663.966.461	58%	62.663.966.461	0
200 Servicios No Personales		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.857.993.548	100.857.993.548	62.663.966.461	62%	62.663.966.461	0
520	Construcciones	100.857.993.548	100.857.993.548	62.663.966.461	62%	62.663.966.461	0
700 Servicio de la Deuda Pública		7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Publica	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	418.594.865.061	418.594.865.061	247.344.514.539	59%	189.874.636.319	57.469.878.220
100 Servicios Personales		1.360.670.024	1.360.670.024	1.130.225.020	83%	1.010.402.518	119.822.502
140	Personal Contratado	1.360.670.024	1.360.670.024	1.130.225.020	83%	1.010.402.518	119.822.502
200 Servicios No Personales		424.000.000	424.000.000	106.921.957	25%	94.798.453	12.123.504
230	Pasajes y Viáticos	74.000.000	74.000.000	30.081.957	41%	17.958.453	12.123.504
250	Alquileres y Derechos	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	280.000.000	280.000.000	76.840.000	27%	76.840.000	0
500 Inversión Física		416.610.195.037	416.610.195.037	246.107.367.562	59%	188.769.435.348	57.337.932.214
520	Construcciones	406.310.195.037	406.310.195.037	246.107.367.562	61%	188.769.435.348	57.337.932.214
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	10.300.000.000	10.300.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
96	SP. Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari- Carapegúa - Quiindy - Caap	530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
500 Inversión Física		530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
590	Gastos de Inversión y Reparac Mayores	530.823.440	530.823.440	486.995.197	92%	0	486.995.197
97	Mejoramiento de 151 KM Cptan. Bado - Santa Rosa	1.825.446.900	1.825.446.900	1.757.271.400	96%	0	1.757.271.400
200 Servicios No Personales		63.500.000	63.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	63.500.000	63.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.761.946.900	1.761.946.900	1.757.271.400	99%	0	1.757.271.400
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.761.946.900	1.761.946.900	1.757.271.400	99%	0	1.757.271.400
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	14.000.000.000	14.000.000.000	8.464.464.813	60%	4.834.590.806	3.629.874.007
500 Inversión Física		14.000.000.000	14.000.000.000	8.464.464.813	60%	4.834.590.806	3.629.874.007
520	Construcciones	14.000.000.000	14.000.000.000	8.464.464.813	60%	4.834.590.806	3.629.874.007

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	149.498.362.896	149.498.362.896	71.499.029.970	48%	31.279.768.574	40.219.261.396
200	Servicios No Personales	47.447.740.471	47.447.740.471	34.965.131.881	74%	324.566.999	34.640.564.882
230	Pasajes y Viáticos	800.000.000	800.000.000	324.566.999	41%	324.566.999	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	46.647.740.471	46.647.740.471	34.640.564.882	74%	0	34.640.564.882
300	Bienes de Consumo e Insumos	61.016.863.947	61.016.863.947	30.898.113.258	51%	28.463.343.624	2.434.769.634
360	Combustibles y Lubricantes	18.918.297.531	18.918.297.531	3.871.109.540	20%	3.871.109.540	0
390	Otros Bienes de Consumo	42.098.566.416	42.098.566.416	27.027.003.718	64%	24.592.234.084	2.434.769.634
500	Inversión Física	32.706.916.421	32.706.916.421	472.898.174	1%	223.940.894	248.957.280
520	Construcciones	32.000.767.915	32.000.767.915	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	389.858.489	389.858.489	223.940.894	57%	223.940.894	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	316.290.017	316.290.017	248.957.280	79%	0	248.957.280
800	Transferencias	8.326.842.057	8.326.842.057	5.162.886.657	62%	2.267.917.057	2.894.969.600
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.551.174.960	6.551.174.960	4.089.144.560	62%	1.194.174.960	2.894.969.600
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.775.667.097	1.775.667.097	1.073.742.097	60%	1.073.742.097	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	582.964.506.570	582.964.506.570	355.071.429.984	61%	308.321.237.631	46.750.192.353
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	527.309.361	527.309.361	427.776.018	81%	364.816.640	62.959.378
500	Inversión Física	464.349.983	464.349.983	364.816.640	79%	364.816.640	0
520	Construcciones	464.349.983	464.349.983	364.816.640	79%	364.816.640	0
900	Otros Gastos	62.959.378	62.959.378	62.959.378	100%	0	62.959.378
980	Deuda Pendiente de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	62.959.378	62.959.378	62.959.378	100%	0	62.959.378
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	2.542.326.519	2.542.326.519	651.590.565	26%	651.590.565	0
200	Servicios No Personales	4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.027.815	4.027.815	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.538.298.704	2.538.298.704	651.590.565	26%	651.590.565	0
520	Construcciones	2.538.298.704	2.538.298.704	651.590.565	26%	651.590.565	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	17.717.453.701	17.717.453.701	9.721.167.266	55%	8.802.985.287	918.181.979
200	Servicios No Personales	5.107.229.388	5.107.229.388	1.187.350.089	23%	1.187.350.089	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.107.229.388	5.107.229.388	1.187.350.089	23%	1.187.350.089	0
500	Inversión Física	12.610.224.313	12.610.224.313	8.533.817.177	68%	7.615.635.198	918.181.979
520	Construcciones	12.459.691.373	12.459.691.373	8.383.284.237	67%	7.486.111.730	897.172.507
580	Estudios y Proyectos de Inversión	129.523.468	129.523.468	129.523.468	100%	129.523.468	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	21.009.472	21.009.472	21.009.472	100%	0	21.009.472
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	85.158.640.436	85.158.640.436	67.789.073.491	80%	54.038.756.285	13.750.317.206
100	Servicios Personales	2.192.000.000	2.192.000.000	784.600.000	36%	686.000.000	98.600.000
140	Personal Contratado	2.192.000.000	2.192.000.000	784.600.000	36%	686.000.000	98.600.000
200	Servicios No Personales	14.037.547.495	14.037.547.495	10.427.559.045	74%	8.506.800.293	1.920.758.752
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.037.547.495	14.037.547.495	10.427.559.045	74%	8.506.800.293	1.920.758.752
500	Inversión Física	68.929.092.941	68.929.092.941	56.576.914.446	82%	44.845.955.992	11.730.958.454
520	Construcciones	66.937.468.281	66.937.468.281	55.692.081.568	83%	43.961.123.114	11.730.958.454
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.991.624.660	1.991.624.660	884.832.878	44%	884.832.878	0
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	19.954.867.717	19.954.867.717	18.249.514.212	91%	18.249.514.212	0
500	Inversión Física	19.954.867.717	19.954.867.717	18.249.514.212	91%	18.249.514.212	0
520	Construcciones	19.954.867.717	19.954.867.717	18.249.514.212	91%	18.249.514.212	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	2.685.481.020	2.685.481.020	1.992.876.921	74%	1.355.753.953	637.122.968
200	Servicios No Personales	2.388.082.000	2.388.082.000	1.878.477.901	79%	1.241.354.933	637.122.968
230	Pasejes y Viáticos	1.786.000.000	1.786.000.000	1.278.480.373	72%	641.357.405	637.122.968
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	602.082.000	602.082.000	599.997.528	100%	599.997.528	0
500	Inversión Física	297.399.020	297.399.020	114.399.020	38%	114.399.020	0
520	Construcciones	297.399.020	297.399.020	114.399.020	38%	114.399.020	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	2.188.756.154	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336	0
500 Inversión Física		2.188.756.154	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336	0
520	Construcciones	2.188.756.154	2.188.756.154	544.874.336	25%	544.874.336	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	199.076.378.905	199.076.378.905	123.157.409.427	62%	110.376.222.022	12.781.187.405
200 Servicios No Personales		4.891.926.000	4.891.926.000	3.577.039.165	73%	2.734.483.445	842.555.720
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.891.926.000	4.891.926.000	3.577.039.165	73%	2.734.483.445	842.555.720
500 Inversión Física		194.184.452.905	194.184.452.905	119.580.370.262	62%	107.641.738.577	11.938.631.685
520	Construcciones	192.037.107.769	192.037.107.769	118.526.911.600	62%	106.588.279.915	11.938.631.685
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.147.345.136	2.147.345.136	1.053.458.662	49%	1.053.458.662	0
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	129.446.374.515	129.446.374.515	81.391.209.315	63%	73.162.078.412	8.229.130.903
200 Servicios No Personales		25.570.326.613	25.570.326.613	12.429.553.489	49%	8.232.392.132	4.197.161.357
230	Pasejes y Viáticos	11.000.986.729	11.000.986.729	7.998.584.136	73%	4.921.828.126	3.076.756.010
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.569.339.884	14.569.339.884	4.430.969.353	30%	3.310.564.006	1.120.405.347
300 Bienes de Consumo e Insumos		79.150.877.070	79.150.877.070	52.239.673.483	66%	52.239.673.483	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	8.500.000.000	8.500.000.000	974.608.556	11%	974.608.556	0
360	Combustibles y Lubricantes	57.000.000.000	57.000.000.000	50.270.491.667	88%	50.270.491.667	0
390	Otros Bienes de Consumo	13.650.877.070	13.650.877.070	994.573.260	7%	994.573.260	0
500 Inversión Física		24.725.170.832	24.725.170.832	16.721.982.343	68%	12.690.012.797	4.031.969.546
520	Construcciones	16.580.507.475	16.580.507.475	10.161.595.164	61%	6.800.516.634	3.361.078.530
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.144.663.357	8.144.663.357	6.560.387.179	81%	5.889.496.163	670.891.016
13	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Canindeyú	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706	0
500 Inversión Física		570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706	0
520	Construcciones	570.409.308	570.409.308	495.892.706	87%	495.892.706	0
14	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Caazapà	177.608	177.608	0	0%	0	0
500 Inversión Física		177.608	177.608	0	0%	0	0
520	Construcciones	177.608	177.608	0	0%	0	0
15	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0	0
500 Inversión Física		48	48	0	0%	0	0
520	Construcciones	48	48	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Paraguari	586.320.566	586.320.566	349.320.565	60%	349.320.565	0
500 Inversión Física		586.320.566	586.320.566	349.320.565	60%	349.320.565	0
520 Construcciones		586.320.566	586.320.566	349.320.565	60%	349.320.565	0
17	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. San Pedro	9.839.828.858	9.839.828.858	5.610.335.906	57%	5.610.335.906	0
500 Inversión Física		9.839.828.858	9.839.828.858	5.610.335.906	57%	5.610.335.906	0
520 Construcciones		9.839.828.858	9.839.828.858	5.610.335.906	57%	5.610.335.906	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	59.909.081.626	59.909.081.626	44.690.389.256	75%	34.319.096.742	10.371.292.514
500 Inversión Física		59.909.081.626	59.909.081.626	44.690.389.256	75%	34.319.096.742	10.371.292.514
520 Construcciones		59.909.081.626	59.909.081.626	44.690.389.256	75%	34.319.096.742	10.371.292.514
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	7.941.920.500	7.941.920.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.941.920.500	7.941.920.500	0	0%	0	0
520 Construcciones		7.941.920.500	7.941.920.500	0	0%	0	0
20	Mejoramiento de Caminos Distritales San Lorenzo	6.938.039.500	6.938.039.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.938.039.500	6.938.039.500	0	0%	0	0
520 Construcciones		6.938.039.500	6.938.039.500	0	0%	0	0
21	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ñemby	3.367.360.000	3.367.360.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.367.360.000	3.367.360.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.367.360.000	3.367.360.000	0	0%	0	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	841.840.000	841.840.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		841.840.000	841.840.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		841.840.000	841.840.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	2.522.942.300	2.522.942.300	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.522.942.300	2.522.942.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.522.942.300	2.522.942.300	0	0%	0	0
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.913.368.356	9.913.368.356	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.913.368.356	9.913.368.356	0	0%	0	0
520 Construcciones		9.913.368.356	9.913.368.356	0	0%	0	0
31	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	21.235.629.572	21.235.629.572	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.235.629.572	21.235.629.572	0	0%	0	0
520 Construcciones		21.235.629.572	21.235.629.572	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	341.256.364.964	341.256.364.964	69.427.262.920	20%	64.166.717.976	5.260.544.944
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	92.164.902.646	92.164.902.646	40.861.532.054	44%	36.684.425.690	4.177.106.364
100 Servicios Personales		3.336.811.781	3.336.811.781	1.763.489.000	53%	1.541.186.200	222.302.800
140	Personal Contratado	3.336.811.781	3.336.811.781	1.763.489.000	53%	1.541.186.200	222.302.800
200 Servicios No Personales		4.808.523.127	4.808.523.127	398.179.804	8%	356.324.858	41.854.946
230	Pasejes y Viáticos	450.000.000	450.000.000	364.629.804	81%	322.774.858	41.854.946
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.358.523.127	4.358.523.127	33.550.000	1%	33.550.000	0
500 Inversión Física		82.819.567.738	82.819.567.738	38.699.863.250	47%	34.786.914.632	3.912.948.618
520	Construcciones	82.709.567.738	82.709.567.738	38.699.863.250	47%	34.786.914.632	3.912.948.618
580	Estudios y Proyectos de Inversión	110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	45.283.870.839	45.283.870.839	5.837.706.914	13%	5.837.706.914	0
100 Servicios Personales		110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
140	Personal Contratado	110.000.000	110.000.000	80.262.000	73%	80.262.000	0
200 Servicios No Personales		3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.259.344.702	3.259.344.702	29.106.000	1%	29.106.000	0
500 Inversión Física		41.914.526.137	41.914.526.137	5.728.338.914	14%	5.728.338.914	0
520	Construcciones	41.914.526.137	41.914.526.137	5.728.338.914	14%	5.728.338.914	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	38.567.946.028	38.567.946.028	22.181.923.952	58%	21.519.185.372	662.738.580
100 Servicios Personales		310.655.000	310.655.000	200.655.000	65%	56.183.400	144.471.600
140	Personal Contratado	310.655.000	310.655.000	200.655.000	65%	56.183.400	144.471.600
200 Servicios No Personales		4.926.688.360	4.926.688.360	730.389.969	15%	730.389.969	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.926.688.360	4.926.688.360	730.389.969	15%	730.389.969	0
500 Inversión Física		33.330.602.668	33.330.602.668	21.250.878.983	64%	20.732.612.003	518.266.980
520	Construcciones	33.330.602.668	33.330.602.668	21.250.878.983	64%	20.732.612.003	518.266.980
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	36.236.032.742	36.236.032.742	546.100.000	2%	125.400.000	420.700.000
100 Servicios Personales		2.096.400.000	2.096.400.000	188.100.000	9%	125.400.000	62.700.000
130	Asignaciones Complementarias	596.400.000	596.400.000	188.100.000	32%	125.400.000	62.700.000
140	Personal Contratado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		6.413.616.001	6.413.616.001	358.000.000	6%	0	358.000.000
230	Pasajes y Viáticos	192.000.000	192.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.221.616.001	6.221.616.001	358.000.000	6%	0	358.000.000
500 Inversión Física		27.273.586.741	27.273.586.741	0	0%	0	0
520	Construcciones	27.273.586.741	27.273.586.741	0	0%	0	0
800 Transferencias		452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	452.430.000	452.430.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	39.686.392.509	39.686.392.509	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		596.400.000	596.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.766.616.000	7.766.616.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.598.616.000	7.598.616.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		31.323.376.509	31.323.376.509	0	0%	0	0
520 Construcciones		31.323.376.509	31.323.376.509	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	31.317.220.200	31.317.220.200	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		832.460.200	832.460.200	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		10.484.760.000	10.484.760.000	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	12.500.000.000	12.500.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		273.830.700	273.830.700	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
520 Construcciones		11.307.823.300	11.307.823.300	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		918.346.000	918.346.000	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		5.473.460.526.915	5.471.916.886.497	3.642.319.973.196	67%	3.170.472.800.648	471.847.172.548

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	63.975.193.858	63.975.193.858	46.647.126.623	73%	40.596.601.617	6.050.525.006
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	63.975.193.858	63.975.193.858	46.647.126.623	73%	40.596.601.617	6.050.525.006
800 Transferencias		63.975.193.858	63.975.193.858	46.647.126.623	73%	40.596.601.617	6.050.525.006
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		63.475.193.858	63.475.193.858	46.378.030.623	73%	40.596.601.617	5.781.429.006
860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público		500.000.000	500.000.000	269.096.000	54%	0	269.096.000
SUBTOTAL		63.975.193.858	63.975.193.858	46.647.126.623	73%	40.596.601.617	6.050.525.006
TOTAL ENTIDAD		7.283.338.244.746	7.265.731.255.085	5.001.319.735.031	69%	4.352.024.183.920	649.295.551.111

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
