



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL


DEL 01/01/2024 AL 28/02/2025

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera


Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	269.503.830.309	269.503.830.309	32.612.597.468	12%
200 Servicios No Personales	257.564.646.439	257.564.646.439	22.230.263.120	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	131.176.750.615	131.176.750.615	4.713.729.279	4%
500 Inversión Física	5.118.001.408.464	5.118.001.408.464	668.788.603.545	13%
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	918.443.079.476	0	0%
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	6.869.325.120	0	0%
800 Transferencias	435.590.446.175	435.590.446.175	89.099.201.851	20%
900 Otros Gastos	4.259.443.009	4.259.443.009	2.640.559.300	62%
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	7.141.408.929.607	820.084.954.563	11%

Participación Presupuestaria

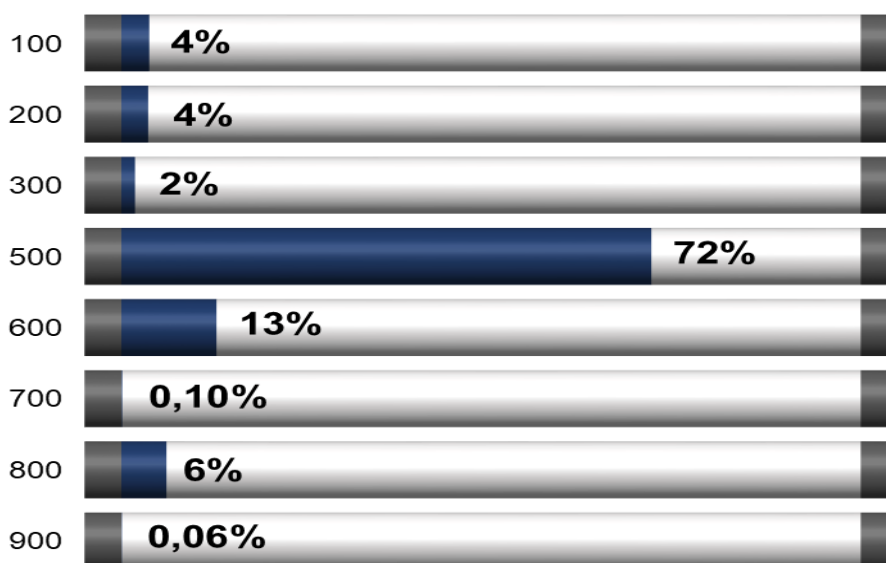


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

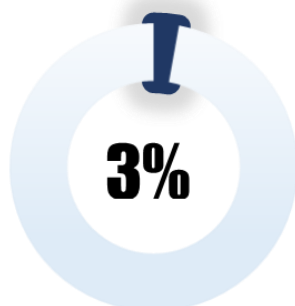


Presupuesto: \$ 1.422.295.666.815
Ejecutado: \$ 40.108.761.048

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: \$ 5.018.829.010.652
Ejecutado: \$ 723.920.433.702

Recursos Institucionales

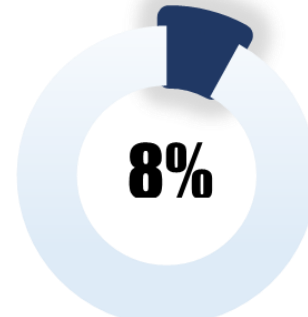

Presupuesto: \$ 700.284.252.140
Ejecutado: \$ 56.145.759.813

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.074.856.909.139	2.074.856.909.139	210.114.563.439	10%	92.888.514.141	117.226.049.298
01	Gestión Administrativa Financiera	386.302.535.087	386.302.535.087	47.653.368.497	12%	11.718.501.037	35.934.867.460
100 Servicios Personales		198.464.701.063	198.464.701.063	26.055.957.903	13%	0	26.055.957.903
110	Remuneraciones Básicas	158.309.331.895	158.309.331.895	20.652.396.086	13%	0	20.652.396.086
120	Remuneraciones Temporales	9.091.049.773	9.091.049.773	503.098.603	6%	0	503.098.603
130	Asignaciones Complementarias	19.192.531.261	19.192.531.261	2.877.149.540	15%	0	2.877.149.540
140	Personal Contratado	10.506.407.920	10.506.407.920	1.806.616.159	17%	0	1.806.616.159
190	Otros Gastos del Personal	1.365.380.214	1.365.380.214	216.697.515	16%	0	216.697.515
200 Servicios No Personales		108.036.081.026	108.036.081.026	14.308.716.609	13%	8.934.533.327	5.374.183.282
210	Servicios Básicos	4.518.200.000	4.518.200.000	2.514.380.866	56%	1.937.965.237	576.415.629
220	Transporte y Almacenaje	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	7.380.169.446	7.380.169.446	96.183.904	1%	0	96.183.904
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	24.583.629.998	24.583.629.998	1.805.903.458	7%	1.052.631.294	753.272.164
250	Alquileres y Derechos	3.895.701.910	3.895.701.910	225.553.360	6%	75.268.825	150.284.535
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.038.620.772	17.038.620.772	1.699.060.163	10%	550.695.183	1.148.364.980
270	Servicio Social	44.262.078.900	44.262.078.900	7.967.634.858	18%	5.317.972.788	2.649.662.070
280	Otros Servicios en General	5.627.680.000	5.627.680.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	430.000.000	430.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.450.978.640	25.450.978.640	4.492.753.882	18%	2.318.588.710	2.174.165.172
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.405.502.000	1.405.502.000	44.999.002	3%	0	44.999.002
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.615.000.000	2.615.000.000	26.105.000	1%	0	26.105.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	112.500.000	112.500.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.812.976.640	20.812.976.640	4.421.649.880	21%	2.318.588.710	2.103.061.170
390	Otros Bienes de Consumo	505.000.000	505.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		50.424.374.358	50.424.374.358	446.150.000	1%	446.150.000	0
520	Construcciones	22.986.374.358	22.986.374.358	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.105.000.000	7.105.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.833.000.000	4.833.000.000	446.150.000	9%	446.150.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.926.400.000	3.926.400.000	2.349.790.103	60%	19.229.000	2.330.561.103
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.926.400.000	3.926.400.000	2.349.790.103	60%	19.229.000	2.330.561.103
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	302.760.000.000	302.760.000.000	56.629.735.484	19%	29.207.738.390	27.421.997.094
800 Transferencias		302.760.000.000	302.760.000.000	56.629.735.484	19%	29.207.738.390	27.421.997.094
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	302.760.000.000	302.760.000.000	56.629.735.484	19%	29.207.738.390	27.421.997.094

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	7.122.027.452	7.122.027.452	641.945.084	9%	0	641.945.084
100 Servicios Personales		6.001.554.943	6.001.554.943	641.945.084	11%	0	641.945.084
110 Remuneraciones Básicas		2.769.857.987	2.769.857.987	409.935.380	15%	0	409.935.380
120 Remuneraciones Temporales		135.624.294	135.624.294	8.279.419	6%	0	8.279.419
130 Asignaciones Complementarias		831.823.519	831.823.519	122.942.736	15%	0	122.942.736
140 Personal Contratado		2.121.249.143	2.121.249.143	95.953.867	5%	0	95.953.867
190 Otros Gastos del Personal		143.000.000	143.000.000	4.833.682	3%	0	4.833.682
200 Servicios No Personales		617.533.438	617.533.438	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		196.383.438	196.383.438	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		196.150.000	196.150.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		125.000.000	125.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.419.000	118.419.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.170.000	42.170.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		61.336.000	61.336.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.913.000	14.913.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		374.520.071	374.520.071	0	0%	0	0
520 Construcciones		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		120.520.000	120.520.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		44.000.071	44.000.071	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	9.035.867.128	9.035.867.128	157.390.288	2%	0	157.390.288
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	157.390.288	8%	0	157.390.288
120	Remuneraciones Temporales	394.767.134	394.767.134	8.962.652	2%	0	8.962.652
130	Asignaciones Complementarias	758.482.961	758.482.961	113.347.392	15%	0	113.347.392
140	Personal Contratado	661.265.361	661.265.361	31.186.472	5%	0	31.186.472
190	Otros Gastos del Personal	162.851.000	162.851.000	3.893.772	2%	0	3.893.772
200 Servicios No Personales		2.874.410.300	2.874.410.300	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	561.410.300	561.410.300	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		213.690.372	213.690.372	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.550.000.000	1.550.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	320.400.000	320.400.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	59.877.249.514	59.877.249.514	6.268.085.398	10%	575.832.539	5.692.252.859
100 Servicios Personales		41.607.806.695	41.607.806.695	5.654.302.859	14%	0	5.654.302.859
110 Remuneraciones Básicas		34.466.421.613	34.466.421.613	4.916.345.197	14%	0	4.916.345.197
120 Remuneraciones Temporales		1.082.042.734	1.082.042.734	20.961.898	2%	0	20.961.898
130 Asignaciones Complementarias		3.200.000.000	3.200.000.000	462.887.542	14%	0	462.887.542
140 Personal Contratado		2.756.987.941	2.756.987.941	164.769.080	6%	0	164.769.080
190 Otros Gastos del Personal		102.354.407	102.354.407	89.339.142	87%	0	89.339.142
200 Servicios No Personales		9.307.169.007	9.307.169.007	37.950.000	0,41%	0	37.950.000
230 Pasajes y Viáticos		1.088.928.000	1.088.928.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		6.363.241.007	6.363.241.007	37.950.000	1%	0	37.950.000
250 Alquileres y Derechos		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.690.000.000	1.690.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.170.000.000	3.170.000.000	220.975.397	7%	220.975.397	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		2.600.000.000	2.600.000.000	220.975.397	8%	220.975.397	0
500 Inversión Física		5.700.000.000	5.700.000.000	354.857.142	6%	354.857.142	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		3.700.000.000	3.700.000.000	354.857.142	10%	354.857.142	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	3.380.000.000	3.380.000.000	103.001.334	3%	0	103.001.334
100 Servicios Personales		1.818.386.800	1.818.386.800	103.001.334	6%	0	103.001.334
120 Remuneraciones Temporales		460.000.000	460.000.000	11.238.728	2%	0	11.238.728
130 Asignaciones Complementarias		615.000.000	615.000.000	86.165.988	14%	0	86.165.988
140 Personal Contratado		597.386.800	597.386.800	5.596.618	1%	0	5.596.618
190 Otros Gastos del Personal		146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.011.613.200	1.011.613.200	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		1.011.613.200	1.011.613.200	0	0%	0	0
500 Inversión Física		550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	2.370.000.000	2.370.000.000	54.854.268	2%	54.854.268	0
200 Servicios No Personales		1.125.000.000	1.125.000.000	54.854.268	5%	54.854.268	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	805.000.000	805.000.000	54.854.268	7%	54.854.268	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		195.000.000	195.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.266.165.728	2.266.165.728	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.266.165.728	2.266.165.728	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.770.515.728	1.770.515.728	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	285.181.268.796	285.181.268.796	7.051.424	0%	0	7.051.424
200 Servicios No Personales		179.560.000	179.560.000	7.051.424	4%	0	7.051.424
230	Pasajes y Viáticos	69.160.000	69.160.000	7.051.424	10%	0	7.051.424
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		843.300.000	843.300.000	0	0%	0	0
330	Produtos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	183.300.000	183.300.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		283.198.408.796	283.198.408.796	0	0%	0	0
520	Construcciones	283.198.408.796	283.198.408.796	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	95.736.927.178	95.736.927.178	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0	0
520 Construcciones		95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.551.669.453	2.551.669.453	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		143.748.000	143.748.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		143.748.000	143.748.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0	0
800 Transferencias		360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
520 Construcciones		8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	1.735.674.943	25%	0	1.735.674.943
500 Inversión Física		6.944.538.090	6.944.538.090	1.735.674.943	25%	0	1.735.674.943
520 Construcciones		6.944.538.090	6.944.538.090	1.735.674.943	25%	0	1.735.674.943
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0
800 Transferencias		9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	11.778.946.863	11.778.946.863	227.903.046	2%	227.903.046	0
200 Servicios No Personales		1.974.046.167	1.974.046.167	227.903.046	12%	227.903.046	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.974.046.167	1.974.046.167	227.903.046	12%	227.903.046	0
500 Inversión Física		9.779.690.031	9.779.690.031	0	0%	0	0
520 Construcciones		7.950.156.371	7.950.156.371	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		1.829.533.660	1.829.533.660	0	0%	0	0
800 Transferencias		25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	1.073.217.282	1.073.217.282	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.073.217.282	1.073.217.282	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.073.217.282	1.073.217.282	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	276.356.743.428	276.356.743.428	11.665.956.312	4%	0	11.665.956.312
500 Inversión Física		276.356.743.428	276.356.743.428	11.665.956.312	4%	0	11.665.956.312
520 Construcciones		276.356.743.428	276.356.743.428	11.665.956.312	4%	0	11.665.956.312
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	34.622.401.207	34.622.401.207	15.819.469.668	46%	0	15.819.469.668
500 Inversión Física		34.622.401.207	34.622.401.207	15.819.469.668	46%	0	15.819.469.668
520 Construcciones		34.622.401.207	34.622.401.207	15.819.469.668	46%	0	15.819.469.668
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	306.670.459.388	306.670.459.388	770.817.440	0,25%	345.217.440	425.600.000
100	Servicios Personales	3.175.872.000	3.175.872.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	3.175.872.000	3.175.872.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	13.021.075.431	13.021.075.431	377.217.440	3%	345.217.440	32.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	13.021.075.431	13.021.075.431	377.217.440	3%	345.217.440	32.000.000
500	Inversión Física	286.809.145.707	286.809.145.707	0	0%	0	0
520	Construcciones	284.340.217.707	284.340.217.707	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.401.600.000	1.401.600.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	731.712.000	731.712.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	335.616.000	335.616.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	3.664.366.250	3.664.366.250	393.600.000	11%	0	393.600.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.342.800.000	1.342.800.000	393.600.000	29%	0	393.600.000
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	2.321.566.250	2.321.566.250	0	0%	0	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	17.494.534.711	17.494.534.711	1.747.950.489	10%	0	1.747.950.489
500	Inversión Física	17.494.534.711	17.494.534.711	1.747.950.489	10%	0	1.747.950.489
520	Construcciones	17.494.534.711	17.494.534.711	1.747.950.489	10%	0	1.747.950.489
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	24.929.973.774	24.929.973.774	10.739.486.245	43%	0	10.739.486.245
500	Inversión Física	24.929.973.774	24.929.973.774	10.739.486.245	43%	0	10.739.486.245
520	Construcciones	24.929.973.774	24.929.973.774	10.739.486.245	43%	0	10.739.486.245
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	80.316.866	80.316.866	0	0%	0	0
500	Inversión Física	80.316.866	80.316.866	0	0%	0	0
520	Construcciones	80.316.866	80.316.866	0	0%	0	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	173.449.901	173.449.901	0	0%	0	0
500	Inversión Física	173.449.901	173.449.901	0	0%	0	0
520	Construcciones	173.449.901	173.449.901	0	0%	0	0
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	3.177.696.000	3.177.696.000	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	37.684.797.830	37.684.797.830	13.633.214.014	36%	13.496.714.014	136.500.000
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	5.049.646.790	5.049.646.790	215.000.000	4%	78.500.000	136.500.000
230	Pasajes y Viáticos	47.175.000	47.175.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.503.455.724	4.503.455.724	215.000.000	5%	78.500.000	136.500.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	499.016.066	499.016.066	0	0%	0	0
500	Inversión Física	28.842.061.440	28.842.061.440	13.418.214.014	47%	13.418.214.014	0
520	Construcciones	20.708.784.000	20.708.784.000	13.418.214.014	65%	13.418.214.014	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	8.133.277.440	8.133.277.440	0	0%	0	0
800	Transferencias	3.677.889.600	3.677.889.600	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	433.324.800	433.324.800	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	3.244.564.800	3.244.564.800	0	0%	0	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	12.919.311.597	12.919.311.597	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	3.118.008.600	3.118.008.600	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	17.175.000	17.175.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.100.833.600	3.100.833.600	0	0%	0	0
500	Inversión Física	9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.
DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	10.568.074.200	10.568.074.200	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		175.200.000	175.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.398.226.200	4.398.226.200	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		17.175.000	17.175.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.381.051.200	4.381.051.200	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	126.435.019.032	126.435.019.032	42.258.659.505	0%	37.261.753.407	4.996.906.098
500 Inversión Física		126.435.019.032	126.435.019.032	42.258.659.505	0%	37.261.753.407	4.996.906.098
520 Construcciones		126.435.019.032	126.435.019.032	42.258.659.505	0%	37.261.753.407	4.996.906.098
52	Mantenimiento de las Defensa Costeras sobre el Río Paraguay	7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.082.656.909.139	2.082.656.909.139	210.114.563.439	10%	92.888.514.141	117.226.049.298

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.239.344.088.631	4.239.344.088.631	537.209.383.345	13%	199.906.243.370	337.303.139.975
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemit	470.827.779	470.827.779	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		45.827.779	45.827.779	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		45.827.779	45.827.779	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	20.409.587.497	20.409.587.497	12.285.026.578	60%	0	12.285.026.578
200 Servicios No Personales		516.273.149	516.273.149	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		156.273.149	156.273.149	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.776.314.348	19.776.314.348	12.285.026.578	62%	0	12.285.026.578
520 Construcciones		19.581.314.348	19.581.314.348	12.285.026.578	63%	0	12.285.026.578
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		195.000.000	195.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		117.000.000	117.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		117.000.000	117.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	181.176.854.277	181.176.854.277	9.618.732.274	5%	4.572.659.899	5.046.072.375
200 Servicios No Personales		40.137.999	40.137.999	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	17.499.999	17.499.999	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	22.638.000	22.638.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		181.027.516.278	181.027.516.278	9.618.732.274	5%	4.572.659.899	5.046.072.375
520	Construcciones	178.191.812.512	178.191.812.512	9.568.376.982	5%	4.572.659.899	4.995.717.083
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	982.800.000	982.800.000	50.355.292	5%	0	50.355.292
800 Transferencias		109.200.000	109.200.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109.200.000	109.200.000	0	0%	0	0
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	58.958.795.631	58.958.795.631	25.472.891.924	43%	6.201.531.520	19.271.360.404
200 Servicios No Personales		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		58.658.795.631	58.658.795.631	25.472.891.924	43%	6.201.531.520	19.271.360.404
520	Construcciones	58.658.795.631	58.658.795.631	25.472.891.924	43%	6.201.531.520	19.271.360.404
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	45.311.142.346	45.311.142.346	15.971.146.484	35%	0	15.971.146.484
200 Servicios No Personales		3.046.104.823	3.046.104.823	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.046.104.823	3.046.104.823	0	0%	0	0
500 Inversión Física		41.974.268.326	41.974.268.326	15.680.377.287	37%	0	15.680.377.287
520	Construcciones	36.938.356.112	36.938.356.112	11.151.897.323	30%	0	11.151.897.323
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.035.912.214	5.035.912.214	4.528.479.964	90%	0	4.528.479.964
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	0	290.769.197
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	0	290.769.197
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	12.621.204.150	12.621.204.150	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.571.204.150	12.571.204.150	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.750.000.000	9.750.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.821.204.150	2.821.204.150	0	0%	0	0
12	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	11.817.565.067	11.817.565.067	3.550.026.206	30%	1.038.612.341	2.511.413.865
200 Servicios No Personales		701.673.821	701.673.821	231.434.577	33%	210.395.070	21.039.507
230	Pasajes y Viáticos	100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	600.873.821	600.873.821	231.434.577	39%	210.395.070	21.039.507
500 Inversión Física		11.115.891.246	11.115.891.246	3.318.591.629	30%	828.217.271	2.490.374.358
520	Construcciones	11.115.891.246	11.115.891.246	3.318.591.629	30%	828.217.271	2.490.374.358

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	11.917.229.296	11.917.229.296	1.971.895.218	17%	0	1.971.895.218
500 Inversión Física		11.917.229.296	11.917.229.296	1.971.895.218	17%	0	1.971.895.218
520	Construcciones	11.007.622.474	11.007.622.474	1.971.895.218	18%	0	1.971.895.218
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	909.606.822	909.606.822	0	0%	0	
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	4.618.337.393	4.618.337.393	473.244.533	10%	163.239.715	310.004.818
500 Inversión Física		4.618.337.393	4.618.337.393	473.244.533	10%	163.239.715	310.004.818
520	Construcciones	4.618.337.393	4.618.337.393	473.244.533	10%	163.239.715	310.004.818
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	185.929.934.332	185.929.934.332	20.632.166.351	11%	8.449.661.838	12.182.504.513
100 Servicios Personales		349.800.000	349.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	349.800.000	349.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.383.750.000	5.383.750.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.323.750.000	5.323.750.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		180.196.384.332	180.196.384.332	20.632.166.351	11%	8.449.661.838	12.182.504.513
520	Construcciones	180.196.384.332	180.196.384.332	20.632.166.351	11%	8.449.661.838	12.182.504.513
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	50.031.266.938	50.031.266.938	18.227.250.674	36%	16.212.990.311	2.014.260.363
100 Servicios Personales		99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.978.487.720	1.978.487.720	98.000.000	5%	11.000.000	87.000.000
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	1.858.487.720	1.858.487.720	98.000.000	5%	11.000.000	87.000.000
500 Inversión Física		47.952.779.222	47.952.779.222	18.129.250.674	38%	16.201.990.311	1.927.260.363
520	Construcciones	47.421.179.222	47.421.179.222	18.129.250.674	38%	16.201.990.311	1.927.260.363
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	531.600.000	531.600.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	14.920.288.035	14.920.288.035	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.400.000.000	5.400.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.580.192.390	8.580.192.390	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	52.186.904	52.186.904	0	0%	0	0
500 Inversión Física		940.095.645	940.095.645	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	940.095.645	940.095.645	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	8.964.713.445	8.964.713.445	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.964.713.445	8.964.713.445	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.964.713.445	8.964.713.445	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	34.046.793.804	34.046.793.804	1.988.781.162	6%	1.727.370.825	261.410.337
500 Inversión Física		34.046.793.804	34.046.793.804	1.988.781.162	6%	1.727.370.825	261.410.337
520 Construcciones		34.046.793.804	34.046.793.804	1.988.781.162	6%	1.727.370.825	261.410.337
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	2.897.207.632	2.897.207.632	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes Y Viáticos		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.397.207.632	2.397.207.632	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.397.207.632	2.397.207.632	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520 Construcciones		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
500 Inversión Física		239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
520 Construcciones		239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
500 Inversión Física		355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
520 Construcciones		355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	973.650.679.476	973.650.679.476	0	0%	0	0
500 Inversión Física		53.433.100.000	53.433.100.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	44.463.100.000	44.463.100.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.970.000.000	8.970.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		918.443.079.476	918.443.079.476	0	0%	0	0
630	Préstamos al Sector Privado	918.443.079.476	918.443.079.476	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.774.500.000	1.774.500.000	0	0%	0	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	7.681.312.483	7.681.312.483	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.670.331.429	6.670.331.429	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.848.045.012	1.848.045.012	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.822.286.417	4.822.286.417	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	16.131.891.084	16.131.891.084	5.903.206.714	37%	5.802.663.128	100.543.586
200 Servicios No Personales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.059.449.484	16.059.449.484	5.903.206.714	37%	5.802.663.128	100.543.586
520	Construcciones	15.575.085.722	15.575.085.722	5.903.206.714	38%	5.802.663.128	100.543.586
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	484.363.762	484.363.762	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	26.884.117.148	26.884.117.148	1.462.545.872	5%	0	1.462.545.872
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.661.701.510	24.661.701.510	1.462.545.872	6%	0	1.462.545.872
520	Construcciones	23.681.701.510	23.681.701.510	1.462.545.872	6%	0	1.462.545.872
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	980.000.000	980.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	439.005.668.482	439.005.668.482	62.881.235.020	14%	62.309.591.729	571.643.291
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	753.441.481	9%	355.358.708	398.082.773
230	Pasajes y Viáticos	24.999.998	24.999.998	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.659.640.000	8.659.640.000	753.441.481	9%	355.358.708	398.082.773
500 Inversión Física		430.321.028.484	430.321.028.484	62.127.793.539	14%	61.954.233.021	173.560.518
520	Construcciones	430.321.028.484	430.321.028.484	62.127.793.539	14%	61.954.233.021	173.560.518
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	193.569.704.191	193.569.704.191	41.438.504.675	21%	3.078.797.089	38.359.707.586
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.889.431.119	5.889.431.119	2.892.770.773	49%	0	2.892.770.773
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.889.431.119	5.889.431.119	2.892.770.773	49%	0	2.892.770.773
500 Inversión Física		187.190.673.072	187.190.673.072	38.545.733.902	21%	3.078.797.089	35.466.936.813
520	Construcciones	179.990.673.072	179.990.673.072	38.545.733.902	21%	3.078.797.089	35.466.936.813
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0	0
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	4.798.871.415	4.798.871.415	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		940.189.920	940.189.920	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	940.189.920	940.189.920	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.858.681.495	3.858.681.495	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	3.858.681.495	3.858.681.495	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	220.585.887.373	220.585.887.373	40.762.137.546	18%	29.222.078.226	11.540.059.320
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	673.200.000	673.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	0	0%	0	0
220	Transporte y Almacenaje	157.342.500	157.342.500	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	462.156.768	462.156.768	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.524.000	475.524.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		218.817.664.105	218.817.664.105	40.762.137.546	19%	29.222.078.226	11.540.059.320
520	Construcciones	218.817.664.105	218.817.664.105	40.762.137.546	19%	29.222.078.226	11.540.059.320
61	Mejoramiento de Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento de Caminos Departamento Cordillera	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
64	Mejoramiento de Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
65	Mejoramiento de Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
66	Mejoramiento de Caminos Departamento Central	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
500	Inversión Física	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
520	Construcciones	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
68	Mejoramiento de Caminos Departamento Guairá	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
500	Inversión Física	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
520	Construcciones	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
69	Mejoramiento de Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
70	Mejoramiento de Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
71	Mejoramiento de Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
72	Mejoramiento de Caminos Departamento Canindeyú	10.696.207.298	10.696.207.298	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.696.207.298	10.696.207.298	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.696.207.298	10.696.207.298	0	0%	0	0
73	Mejoramiento de Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	357.867.691.311	357.867.691.311	35.211.478.365	10%	7.473.779.809	27.737.698.556
200	Servicios No Personales	2.392.380.000	2.392.380.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.379.880.000	2.379.880.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	350.595.311.311	350.595.311.311	32.638.524.465	9%	7.473.779.809	25.164.744.656
520	Construcciones	331.195.311.311	331.195.311.311	28.348.405.280	9%	7.473.779.809	20.874.625.471
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	19.400.000.000	19.400.000.000	4.290.119.185	22%	0	4.290.119.185
800	Transferencias	4.880.000.000	4.880.000.000	2.572.953.900	53%	0	2.572.953.900
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.880.000.000	4.880.000.000	2.572.953.900	53%	0	2.572.953.900

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	12.260.111.970	12.260.111.970	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.285.111.970	11.285.111.970	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.750.000.000	9.750.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.535.111.970	1.535.111.970	0	0%	0	0
800 Transferencias		975.000.000	975.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	975.000.000	975.000.000	0	0%	0	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	55.891.734.614	55.891.734.614	16.451.047.432	29%	15.813.263.905	637.783.527
200 Servicios No Personales		864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		55.027.734.614	55.027.734.614	16.451.047.432	30%	15.813.263.905	637.783.527
520	Construcciones	50.515.734.614	50.515.734.614	16.451.047.432	33%	15.813.263.905	637.783.527
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	86.764.109.813	86.764.109.813	17.203.190.317	20%	4.406.934.851	12.796.255.466
200 Servicios No Personales		720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		86.044.109.813	86.044.109.813	17.203.190.317	20%	4.406.934.851	12.796.255.466
520	Construcciones	84.028.109.813	84.028.109.813	17.203.190.317	20%	4.406.934.851	12.796.255.466
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
80	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	58.223.044.095	58.223.044.095	19.835.302.575	34%	0	19.835.302.575
500 Inversión Física		58.223.044.095	58.223.044.095	19.835.302.575	34%	0	19.835.302.575
520	Construcciones	58.223.044.095	58.223.044.095	19.835.302.575	34%	0	19.835.302.575

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	88.731.098.297	88.731.098.297	16.077.096.794	18%	3.138.783.469	12.938.313.325
200	Servicios No Personales	1.960.015.936	1.960.015.936	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	0	0%	0	0
500	Inversión Física	82.931.082.361	82.931.082.361	16.077.096.794	19%	3.138.783.469	12.938.313.325
520	Construcciones	67.314.601.561	67.314.601.561	16.077.096.794	24%	3.138.783.469	12.938.313.325
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	15.616.480.800	15.616.480.800	0	0%	0	0
800	Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	210.944.617.230	210.944.617.230	71.836.339.368	34%	27.424.131.811	44.412.207.557
100	Servicios Personales	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	210.656.617.230	210.656.617.230	71.836.339.368	34%	27.424.131.811	44.412.207.557
520	Construcciones	208.208.617.230	208.208.617.230	71.836.339.368	35%	27.424.131.811	44.412.207.557
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.728.000.000	1.728.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	320.854.071.960	320.854.071.960	61.550.220.413	19%	0	61.550.220.413
100	Servicios Personales	747.000.000	747.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.686.000.000	1.686.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.586.000.000	1.586.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	317.461.071.960	317.461.071.960	61.550.220.413	19%	0	61.550.220.413
520	Construcciones	299.621.071.960	299.621.071.960	61.550.220.413	21%	0	61.550.220.413
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.840.000.000	17.840.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km	334.720.195.294	334.720.195.294	15.248.316.850	5%	2.870.152.904	12.378.163.946
100	Servicios Personales	1.382.670.024	1.382.670.024	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	2.028.000.000	2.028.000.000	16.164.672	1%	0	16.164.672
230	Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	16.164.672	8%	0	16.164.672
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.828.000.000	1.828.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	331.309.525.270	331.309.525.270	15.232.152.178	5%	2.870.152.904	12.361.999.274
520	Construcciones	318.009.525.270	318.009.525.270	15.232.152.178	5%	2.870.152.904	12.361.999.274
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	62.166.188.718	62.166.188.718	21.157.600.000	34%	0	21.157.600.000
200 Servicios No Personales		8.178.000.000	8.178.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.978.000.000	3.978.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		28.150.588.718	28.150.588.718	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	17.950.588.718	17.950.588.718	0	0%	0	0
800 Transferencias		25.837.600.000	25.837.600.000	21.157.600.000	82%	0	21.157.600.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.680.000.000	4.680.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	21.157.600.000	21.157.600.000	21.157.600.000	100%	0	21.157.600.000
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	302.663.072.641	302.663.072.641	57.012.123.629	19%	28.214.967.479	32.164.516.150
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física		432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
520	Construcciones	432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	2.124.751.029	2.124.751.029	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		397.963.478	397.963.478	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	397.963.478	397.963.478	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.726.787.551	1.726.787.551	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.726.787.551	1.726.787.551	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	32.653.851.755	32.653.851.755	15.229.669.062	47%	13.215.287.839	2.014.381.223
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.680.639.061	4.680.639.061	2.478.437.665	53%	2.478.437.665	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.680.639.061	4.680.639.061	2.478.437.665	53%	2.478.437.665	0
500 Inversión Física		27.483.612.694	27.483.612.694	12.751.231.397	46%	10.736.850.174	2.014.381.223
520	Construcciones	27.483.612.694	27.483.612.694	12.751.231.397	46%	10.736.850.174	2.014.381.223
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
500 Inversión Física		848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
520	Construcciones	848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.947.217.499	1.947.217.499	182.548.536	9%	0	182.548.536
200 Servicios No Personales		1.649.905.134	1.649.905.134	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	1.380.000.000	1.380.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	269.905.134	269.905.134	0	0%	0	0
500 Inversión Física		297.312.365	297.312.365	182.548.536	61%	0	182.548.536
520	Construcciones	297.312.365	297.312.365	182.548.536	61%	0	182.548.536

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	26.603.658.206	26.603.658.206	17.738.115.815	67%	14.999.679.640	2.738.436.175
200 Servicios No Personales		2.202.863.077	2.202.863.077	324.321.165	15%	274.456.293	49.864.872
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.202.863.077	2.202.863.077	324.321.165	15%	274.456.293	49.864.872
500 Inversión Física		24.400.795.129	24.400.795.129	17.413.794.650	71%	14.725.223.347	2.688.571.303
520	Construcciones	24.400.795.129	24.400.795.129	17.413.794.650	71%	14.725.223.347	2.688.571.303
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	70.825.900.000	70.825.900.000	3.303.369.246	5%	0	3.303.369.246
200 Servicios No Personales		3.600.000.000	3.600.000.000	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		60.595.900.000	60.595.900.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.595.900.000	4.595.900.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.630.000.000	6.630.000.000	3.303.369.246	50%	0	3.303.369.246
520	Construcciones	6.630.000.000	6.630.000.000	3.303.369.246	50%	0	3.303.369.246
15	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Ñeembucú	6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
520	Construcciones	6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
16	Construcción Cam Vec Pav y no Pav Dpto. Paraguari	1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	10.411.053.456	10.411.053.456	8.407.300.492	81%	0	8.407.300.492
500 Inversión Física		10.411.053.456	10.411.053.456	8.407.300.492	81%	0	8.407.300.492
520	Construcciones	10.411.053.456	10.411.053.456	8.407.300.492	81%	0	8.407.300.492
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	14.370.847.706	14.370.847.706	7.941.920.478	55%	0	7.941.920.478
200 Servicios No Personales		645.107.628	645.107.628	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	645.107.628	645.107.628	0	0%	0	0
500 Inversión Física		13.725.740.078	13.725.740.078	7.941.920.478	58%	0	7.941.920.478
520	Construcciones	13.725.740.078	13.725.740.078	7.941.920.478	58%	0	7.941.920.478
20	Mejoramiento de Caminos Distritales San Lorenzo	16.211.752.694	16.211.752.694	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		409.284.336	409.284.336	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	409.284.336	409.284.336	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.802.468.358	15.802.468.358	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.802.468.358	15.802.468.358	0	0%	0	0
21	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ñemby	7.964.231.355	7.964.231.355	3.367.360.000	42%	0	6.734.720.000
200 Servicios No Personales		360.000.000	360.000.000	0	0%	0	3.367.360.000
230	Pasejes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.604.231.355	7.604.231.355	3.367.360.000	44%	0	3.367.360.000
520	Construcciones	7.604.231.355	7.604.231.355	3.367.360.000	44%	0	3.367.360.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.
DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	10.425.065.648	10.425.065.648	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		467.981.399	467.981.399	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	467.981.399	467.981.399	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.957.084.249	9.957.084.249	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.957.084.249	9.957.084.249	0	0%	0	0
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	10.917.582.885	10.917.582.885	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		275.626.934	275.626.934	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	275.626.934	275.626.934	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.641.955.951	10.641.955.951	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.641.955.951	10.641.955.951	0	0%	0	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	2.664.474.156	2.664.474.156	841.840.000	32%	0	841.840.000
200 Servicios No Personales		84.382.890	84.382.890	0	0%	0	841.840.000
230	Pasejes y Viáticos	84.382.890	84.382.890	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.580.091.266	2.580.091.266	841.840.000	33%	0	841.840.000
520	Construcciones	2.580.091.266	2.580.091.266	841.840.000	33%	0	841.840.000
25	Mejoramiento de Tramo Vecinal Cristo Rey - Carpa Cue	621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
26	Mejoramiento Tramo Vecinal Carayao - Cerro Corá i- Nicolas Bo	783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Temciapora"	34.261.929.913	34.261.929.913	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		870.122.412	870.122.412	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	870.122.412	870.122.412	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.391.807.501	33.391.807.501	0	0%	0	0
520	Construcciones	33.391.807.501	33.391.807.501	0	0%	0	0
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
500	Inversión Física	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
31	Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	5.691.402.576	5.691.402.576	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.691.402.576	5.691.402.576	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.691.402.576	5.691.402.576	0	0%	0	0
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	444.271.845.132	444.271.845.132	7.403.571.683	2%	821.460.034	6.582.111.649
01	SP Proyecto Acueducto	1.648.487.527	1.648.487.527	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	18.443.038.220	18.443.038.220	1.153.132.882	6%	0	1.153.132.882
100	Servicios Personales	975.312.852	975.312.852	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	975.312.852	975.312.852	0	0%	0	0
500	Inversión Física	17.467.725.368	17.467.725.368	1.153.132.882	7%	0	1.153.132.882
520	Construcciones	17.467.725.368	17.467.725.368	1.153.132.882	7%	0	1.153.132.882
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	13.561.706.701	13.561.706.701	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	12.246.800.161	12.246.800.161	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.246.800.161	12.246.800.161	0	0%	0	0
800	Transferencias	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	8.347.534.354	8.347.534.354	1.579.753.260	19%	774.460.034	805.293.226
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	7.259.127.814	7.259.127.814	1.579.753.260	22%	774.460.034	805.293.226
520	Construcciones	7.259.127.814	7.259.127.814	1.579.753.260	22%	774.460.034	805.293.226
800	Transferencias	390.000.000	390.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	390.000.000	390.000.000	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	74.978.376.535	74.978.376.535	207.000.000	0,28%	47.000.000	160.000.000
100	Servicios Personales	1.930.899.200	1.930.899.200	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	328.320.000	328.320.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	1.602.579.200	1.602.579.200	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	6.939.269.321	6.939.269.321	207.000.000	3%	47.000.000	160.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.939.269.321	6.939.269.321	207.000.000	3%	47.000.000	160.000.000
500	Inversión Física	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0	0
520	Construcciones	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0	0
800	Transferencias	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.
DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	79.088.289.951	79.088.289.951	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		2.762.899.200	2.762.899.200	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	328.320.000	328.320.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	2.434.579.200	2.434.579.200	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
500 Inversión Física		63.444.032.697	63.444.032.697	0	0%	0	0
510	Adquisición de Inmuebles	4.359.744.000	4.359.744.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	59.084.288.697	59.084.288.697	0	0%	0	0
07	Construcción Alacantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	138.696.350.340	138.696.350.340	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
500 Inversión Física		129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
520	Construcciones	129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	26.288.560.003	26.288.560.003	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		23.362.144.947	23.362.144.947	0	0%	0	0
520	Construcciones	23.362.144.947	23.362.144.947	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	19.895.777.370	19.895.777.370	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.969.362.314	16.969.362.314	0	0%	0	0
520	Construcciones	16.969.362.314	16.969.362.314	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	20.804.890.914	20.804.890.914	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		17.878.475.858	17.878.475.858	0	0%	0	0
520	Construcciones	17.878.475.858	17.878.475.858	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	18.413.833.217	18.413.833.217	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.487.418.161	15.487.418.161	0	0%	0	0
520 Construcciones		15.487.418.161	15.487.418.161	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	0	4.463.685.541
500 Inversión Física		14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	0	4.463.685.541
520 Construcciones		14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	0	4.463.685.541
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		4.986.279.006.404	4.986.279.006.404	601.625.078.657	12%	228.942.670.883	376.049.767.774

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	72.473.014.064	72.473.014.064	8.345.312.467	12%	6.532.469.027	1.812.843.440
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	72.473.014.064	72.473.014.064	8.345.312.467	12%	6.532.469.027	1.812.843.440
800 Transferencias		72.473.014.064	72.473.014.064	8.345.312.467	12%	6.532.469.027	1.812.843.440
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		69.455.274.921	69.455.274.921	8.345.312.467	12%	6.532.469.027	1.812.843.440
860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público		3.017.739.143	3.017.739.143	0	0%	0	0
SUBTOTAL		72.473.014.064	72.473.014.064	8.345.312.467	12%	6.532.469.027	1.812.843.440

TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	7.141.408.929.607	820.084.954.563	11%	328.363.654.051	495.088.660.512
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 28/02/2024

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.
DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
