



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2025


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	268.897.360.285	670.470.024	269.567.830.309	51.596.801.751	217.971.028.558
200 Servicios No Personales	250.519.761.960	6.865.170.195	257.384.932.155	31.924.643.563	225.460.288.592
300 Bienes de Consumo e Insumos	125.784.303.975	-402.553.360	125.381.750.615	12.108.742.333	113.273.008.282
500 Inversión Física	5.134.635.978.804	-3.743.856.056	5.130.892.122.748	975.249.127.481	4.155.642.995.267
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	-250.000.000	918.193.079.476	296.619.192.936	621.573.886.540
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	0	6.869.325.120	0	6.869.325.120
800 Transferencias	432.290.446.175	3.320.000.000	435.610.446.175	141.426.915.264	294.183.530.911
900 Otros Gastos	3.968.673.812	290.769.197	4.259.443.009	2.726.159.300	1.533.283.709
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	6.750.000.000	7.148.158.929.607	1.511.651.582.628	5.636.507.346.979


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 07/04/2025

Participación Presupuestaria

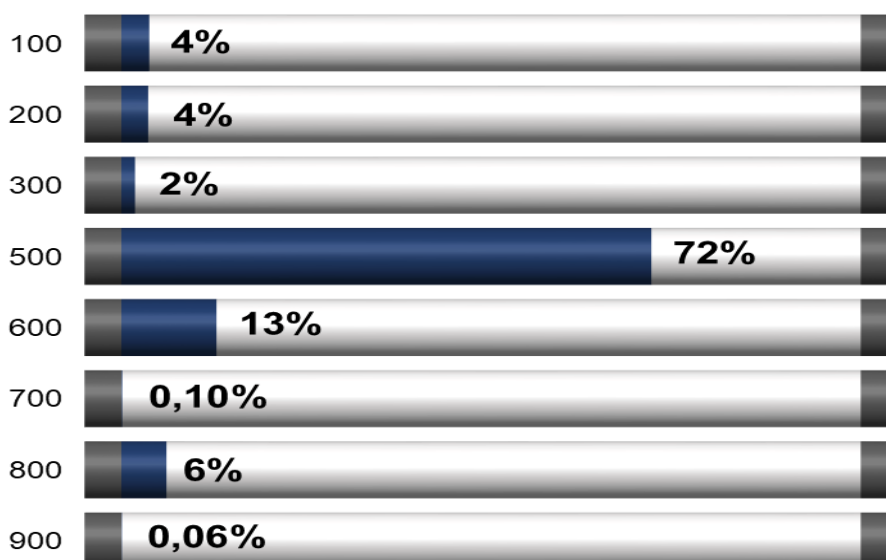


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro




Presupuesto: ₡ 1.422.295.666.815
Ejecutado: ₡ 54.123.384.882

Recursos del Crédito Público

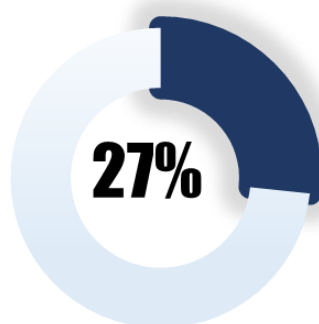

Presupuesto: ₡ 5.022.179.010.652
Ejecutado: ₡ 1.339.321.935.384

Recursos Institucionales

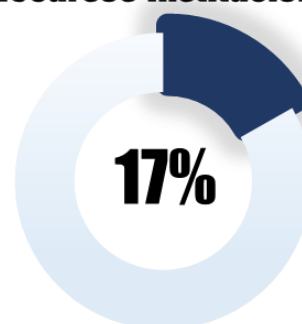

Presupuesto: ₡ 703.684.252.140
Ejecutado: ₡ 118.206.262.362

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.084.927.541.547	2.084.927.541.547	343.270.538.724	16%	150.011.635.569	193.258.903.155
01	Gestión Administrativa Financiera	386.302.535.087	386.302.535.087	63.917.039.789	17%	19.218.141.916	44.698.897.873
100 Servicios Personales		198.464.701.063	198.464.701.063	40.363.232.073	20%	0	40.363.232.073
110 Remuneraciones Básicas		158.309.331.895	158.309.331.895	30.979.753.911	20%	0	30.979.753.911
120 Remuneraciones Temporales		9.091.049.773	9.091.049.773	1.133.838.372	12%	0	1.133.838.372
130 Asignaciones Complementarias		19.192.531.261	19.192.531.261	5.147.949.342	27%	0	5.147.949.342
140 Personal Contratado		10.506.407.920	10.506.407.920	2.776.863.295	26%	0	2.776.863.295
190 Otros Gastos del Personal		1.365.380.214	1.365.380.214	324.827.153	24%	0	324.827.153
200 Servicios No Personales		107.736.081.026	107.736.081.026	16.039.220.677	15%	14.260.009.034	1.779.211.643
210 Servicios Básicos		4.518.200.000	4.518.200.000	2.611.645.720	58%	2.514.380.866	97.264.854
220 Transporte y Almacenaje		300.000.000	300.000.000	84.661.917	28%	0	84.661.917
230 Pasajes y Viáticos		7.380.169.446	7.380.169.446	665.564.321	9%	96.183.904	569.380.417
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		25.083.629.998	25.083.629.998	2.316.878.583	9%	1.777.947.238	538.931.345
250 Alquileres y Derechos		3.895.701.910	3.895.701.910	502.068.671	13%	215.402.005	286.666.666
260 Servicios Técnicos y Profesionales		16.238.620.772	16.238.620.772	1.890.766.607	12%	1.688.460.163	202.306.444
270 Servicio Social		44.262.078.900	44.262.078.900	7.967.634.858	18%	7.967.634.858	0
280 Otros Servicios en General		5.627.680.000	5.627.680.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		430.000.000	430.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.750.978.640	25.750.978.640	4.561.766.936	18%	4.492.753.882	69.013.054
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.705.502.000	1.705.502.000	114.012.056	7%	44.999.002	69.013.054
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.615.000.000	2.615.000.000	26.105.000	1%	26.105.000	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		112.500.000	112.500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		20.812.976.640	20.812.976.640	4.421.649.880	21%	4.421.649.880	0
390 Otros Bienes de Consumo		505.000.000	505.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		50.424.374.358	50.424.374.358	517.430.000	1%	446.150.000	71.280.000
520 Construcciones		21.986.374.358	21.986.374.358	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		8.105.000.000	8.105.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.833.000.000	4.833.000.000	517.430.000	11%	446.150.000	71.280.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		15.500.000.000	15.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.926.400.000	3.926.400.000	2.435.390.103	62%	19.229.000	2.416.161.103
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.926.400.000	3.926.400.000	2.435.390.103	62%	19.229.000	2.416.161.103
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	302.760.000.000	302.760.000.000	103.313.142.362	34%	29.207.738.390	74.105.403.972
800 Transferencias		302.760.000.000	302.760.000.000	103.313.142.362	34%	29.207.738.390	74.105.403.972
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		302.760.000.000	302.760.000.000	103.313.142.362	34%	29.207.738.390	74.105.403.972

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	7.122.027.452	7.122.027.452	1.001.833.185	14%	0	1.001.833.185
100 Servicios Personales		6.001.554.943	6.001.554.943	1.001.833.185	17%	0	1.001.833.185
110 Remuneraciones Básicas		2.769.857.987	2.769.857.987	614.903.070	22%	0	614.903.070
120 Remuneraciones Temporales		135.624.294	135.624.294	19.695.871	15%	0	19.695.871
130 Asignaciones Complementarias		831.823.519	831.823.519	184.414.104	22%	0	184.414.104
140 Personal Contratado		2.121.249.143	2.121.249.143	175.569.617	8%	0	175.569.617
190 Otros Gastos del Personal		143.000.000	143.000.000	7.250.523	5%	0	7.250.523
200 Servicios No Personales		617.533.438	617.533.438	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		196.383.438	196.383.438	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		196.150.000	196.150.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		125.000.000	125.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.419.000	118.419.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.170.000	42.170.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		61.336.000	61.336.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.913.000	14.913.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		374.520.071	374.520.071	0	0%	0	0
520 Construcciones		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		120.520.000	120.520.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		44.000.071	44.000.071	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	9.035.867.128	9.035.867.128	406.582.563	4%	0	406.582.563
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	255.050.415	13%	0	255.050.415
120	Remuneraciones Temporales	394.767.134	394.767.134	27.014.193	7%	0	27.014.193
130	Asignaciones Complementarias	758.482.961	758.482.961	173.915.856	23%	0	173.915.856
140	Personal Contratado	661.265.361	661.265.361	46.779.708	7%	0	46.779.708
190	Otros Gastos del Personal	162.851.000	162.851.000	7.340.658	5%	0	7.340.658
200 Servicios No Personales		2.874.410.300	2.874.410.300	151.532.148	5%	0	151.532.148
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	10.432.148	1%	0	10.432.148
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	141.100.000	15%	0	141.100.000
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	561.410.300	561.410.300	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		213.690.372	213.690.372	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.550.000.000	1.550.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	320.400.000	320.400.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	59.877.249.514	59.877.249.514	9.618.645.589	16%	613.782.539	9.004.863.050
100 Servicios Personales		41.607.806.695	41.607.806.695	8.487.175.177	20%	0	8.487.175.177
110 Remuneraciones Básicas		34.466.421.613	34.466.421.613	7.393.120.332	21%	0	7.393.120.332
120 Remuneraciones Temporales		1.082.042.734	1.082.042.734	51.373.401	5%	0	51.373.401
130 Asignaciones Complementarias		3.200.000.000	3.200.000.000	696.750.185	22%	0	696.750.185
140 Personal Contratado		2.756.987.941	2.756.987.941	253.309.902	9%	0	253.309.902
190 Otros Gastos del Personal		102.354.407	102.354.407	92.621.357	90%	0	92.621.357
200 Servicios No Personales		7.077.454.723	7.077.454.723	200.780.731	3%	37.950.000	162.830.731
230 Pasajes y Viáticos		1.088.928.000	1.088.928.000	21.180.993	2%	0	21.180.993
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.096.517.198	4.096.517.198	171.258.333	4%	37.950.000	133.308.333
250 Alquileres y Derechos		150.000.000	150.000.000	8.341.405	6%	0	8.341.405
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.727.009.525	1.727.009.525	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.070.000.000	3.070.000.000	220.975.397	7%	220.975.397	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		2.600.000.000	2.600.000.000	220.975.397	8%	220.975.397	0
500 Inversión Física		8.009.714.284	8.009.714.284	709.714.284	9%	354.857.142	354.857.142
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		6.509.714.284	6.509.714.284	709.714.284	11%	354.857.142	354.857.142
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		32.273.812	32.273.812	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	3.380.000.000	3.380.000.000	172.604.830	5%	0	172.604.830
100 Servicios Personales		1.818.386.800	1.818.386.800	167.538.665	9%	0	167.538.665
120 Remuneraciones Temporales		460.000.000	460.000.000	28.425.306	6%	0	28.425.306
130 Asignaciones Complementarias		615.000.000	615.000.000	130.718.432	21%	0	130.718.432
140 Personal Contratado		597.386.800	597.386.800	8.394.927	1%	0	8.394.927
190 Otros Gastos del Personal		146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.011.613.200	1.011.613.200	5.066.165	1%	0	5.066.165
230 Pasajes y Viáticos		1.011.613.200	1.011.613.200	5.066.165	1%	0	5.066.165
500 Inversión Física		550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	2.370.000.000	2.370.000.000	80.874.268	3%	54.854.268	26.020.000
200 Servicios No Personales		1.125.000.000	1.125.000.000	54.854.268	5%	54.854.268	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	805.000.000	805.000.000	54.854.268	7%	54.854.268	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		195.000.000	195.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.050.000.000	1.050.000.000	26.020.000	2%	0	26.020.000
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	26.020.000	6%	0	26.020.000
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.266.165.728	2.266.165.728	235.001.868	10%	0	235.001.868
200 Servicios No Personales		2.266.165.728	2.266.165.728	235.001.868	10%	0	235.001.868
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	34.982.262	18%	0	34.982.262
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.512.815.728	1.512.815.728	28.419.606	2%	0	28.419.606
250	Alquileres y Derechos	557.700.000	557.700.000	171.600.000	31%	0	171.600.000
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	285.181.268.796	285.181.268.796	34.690.037	0,01%	7.051.424	27.638.613
200 Servicios No Personales		179.560.000	179.560.000	34.690.037	19%	7.051.424	27.638.613
230	Pasajes y Viáticos	69.160.000	69.160.000	34.690.037	50%	7.051.424	27.638.613
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		843.300.000	843.300.000	0	0%	0	0
330	Producos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	183.300.000	183.300.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		283.198.408.796	283.198.408.796	0	0%	0	0
520	Construcciones	283.198.408.796	283.198.408.796	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	95.736.927.178	95.736.927.178	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0	0
520	Construcciones	95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.551.669.453	2.551.669.453	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	143.748.000	143.748.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	143.748.000	143.748.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0	0
800	Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.477.948	8.477.948	0	0%	0	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.729.496.894	1.729.496.894	0	0%	0	0
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.679.948.660	142.620.680
500	Inversión Física	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.679.948.660	142.620.680
520	Construcciones	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.679.948.660	142.620.680
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0
800	Transferencias	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	11.778.946.863	11.778.946.863	461.547.943	4%	0
200	Servicios No Personales	1.974.046.167	1.974.046.167	461.547.943	23%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.046.167	1.974.046.167	461.547.943	23%	0
500	Inversión Física	9.779.690.031	9.779.690.031	0	0%	0
520	Construcciones	7.950.156.371	7.950.156.371	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.829.533.660	1.829.533.660	0	0%	0
800	Transferencias	25.210.665	25.210.665	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.210.665	25.210.665	0	0%	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	1.073.217.282	1.073.217.282	656.169.628	61%	0
500	Inversión Física	1.073.217.282	1.073.217.282	656.169.628	61%	0
520	Construcciones	1.073.217.282	1.073.217.282	656.169.628	61%	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	276.356.743.428	276.356.743.428	46.459.374.332	17%	34.793.418.020
500	Inversión Física	276.356.743.428	276.356.743.428	46.459.374.332	17%	34.793.418.020
520	Construcciones	276.356.743.428	276.356.743.428	46.459.374.332	17%	34.793.418.020
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	34.622.401.207	34.622.401.207	32.577.112.283	94%	16.757.642.615
500	Inversión Física	34.622.401.207	34.622.401.207	32.577.112.283	94%	16.757.642.615
520	Construcciones	34.622.401.207	34.622.401.207	32.577.112.283	94%	16.757.642.615
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0
500	Inversión Física	1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0
520	Construcciones	1.290.726.292	1.290.726.292	0	0%	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	306.670.459.388	306.670.459.388	1.386.807.440	0,45%	1.009.590.000
100	Servicios Personales	3.175.872.000	3.175.872.000	489.776.000	15%	0
140	Personal Contratado	3.175.872.000	3.175.872.000	489.776.000	15%	0
200	Servicios No Personales	13.021.075.431	13.021.075.431	503.431.440	4%	377.217.440
260	Servicios Técnicos y Profesionales	13.021.075.431	13.021.075.431	503.431.440	4%	377.217.440
500	Inversión Física	286.809.145.707	286.809.145.707	0	0%	0
520	Construcciones	284.340.217.707	284.340.217.707	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.401.600.000	1.401.600.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	731.712.000	731.712.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	335.616.000	335.616.000	0	0%	0
800	Transferencias	3.664.366.250	3.664.366.250	393.600.000	11%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.342.800.000	1.342.800.000	393.600.000	29%	393.600.000
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	2.321.566.250	2.321.566.250	0	0%	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	17.494.534.711	17.494.534.711	8.102.738.857	46%	4.280.567.245
500	Inversión Física	17.494.534.711	17.494.534.711	8.102.738.857	46%	4.280.567.245
520	Construcciones	17.494.534.711	17.494.534.711	8.102.738.857	46%	4.280.567.245
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	24.929.973.774	24.929.973.774	16.843.230.891	68%	6.103.744.646
500	Inversión Física	24.929.973.774	24.929.973.774	16.843.230.891	68%	6.103.744.646
520	Construcciones	24.929.973.774	24.929.973.774	16.843.230.891	68%	6.103.744.646
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	80.316.866	80.316.866	0	0%	0
500	Inversión Física	80.316.866	80.316.866	0	0%	0
520	Construcciones	80.316.866	80.316.866	0	0%	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	173.449.901	173.449.901	0	0%	0
500	Inversión Física	173.449.901	173.449.901	0	0%	0
520	Construcciones	173.449.901	173.449.901	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	3.177.696.000	3.177.696.000	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	37.684.797.830	37.684.797.830	13.921.914.014	37%	13.627.214.014	294.700.000
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	5.049.646.790	5.049.646.790	503.700.000	10%	209.000.000	294.700.000
230	Pasajes y Viáticos	47.175.000	47.175.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.503.455.724	4.503.455.724	503.700.000	11%	209.000.000	294.700.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	499.016.066	499.016.066	0	0%	0	0
500	Inversión Física	28.842.061.440	28.842.061.440	13.418.214.014	47%	13.418.214.014	0
520	Construcciones	20.708.784.000	20.708.784.000	13.418.214.014	65%	13.418.214.014	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	8.133.277.440	8.133.277.440	0	0%	0	0
800	Transferencias	3.677.889.600	3.677.889.600	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	433.324.800	433.324.800	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	3.244.564.800	3.244.564.800	0	0%	0	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	12.919.311.597	12.919.311.597	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	3.118.008.600	3.118.008.600	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	17.175.000	17.175.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.100.833.600	3.100.833.600	0	0%	0	0
500	Inversión Física	9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0	0
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	10.568.074.200	10.568.074.200	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	175.200.000	175.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	4.398.226.200	4.398.226.200	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	17.175.000	17.175.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.381.051.200	4.381.051.200	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	121.955.651.440	121.955.651.440	42.258.659.505	35%	42.258.659.505	0
500	Inversión Física	121.955.651.440	121.955.651.440	42.258.659.505	35%	42.258.659.505	0
520	Construcciones	121.955.651.440	121.955.651.440	42.258.659.505	35%	42.258.659.505	0
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	7.800.000.000	7.800.000.000	0	0%	0	0
54	Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	3.050.000.000	3.050.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
56	Construcción Gran Hospital General	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.084.927.541.547	2.084.927.541.547	343.270.538.724	16%	150.011.635.569	193.258.903.155

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.243.823.456.223	4.243.823.456.223	1.015.865.230.112	24%	797.107.926.843	218.757.303.269
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	470.827.779	470.827.779	44.698.338	9%	0	44.698.338
200	Servicios No Personales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	45.827.779	45.827.779	44.698.338	98%	0	44.698.338
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	45.827.779	45.827.779	44.698.338	98%	0	44.698.338
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	20.409.587.497	20.409.587.497	12.301.282.820	60%	10.701.822.546	1.599.460.274
200	Servicios No Personales	516.273.149	516.273.149	11.621.242	2%	0	11.621.242
230	Pasajes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	11.621.242	3%	0	11.621.242
260	Servicios Técnicos y Profesionales	156.273.149	156.273.149	0	0%	0	0
500	Inversión Física	19.776.314.348	19.776.314.348	12.285.026.578	62%	10.701.822.546	1.583.204.032
520	Construcciones	19.581.314.348	19.581.314.348	12.285.026.578	63%	10.701.822.546	1.583.204.032
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	195.000.000	195.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	117.000.000	117.000.000	4.635.000	4%	0	4.635.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	117.000.000	117.000.000	4.635.000	4%	0	4.635.000

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	181.176.854.277	181.176.854.277	12.841.379.346	7%	9.057.267.715	3.784.111.631
200 Servicios No Personales		40.137.999	40.137.999	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		17.499.999	17.499.999	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		22.638.000	22.638.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		181.027.516.278	181.027.516.278	12.841.379.346	7%	9.057.267.715	3.784.111.631
520 Construcciones		178.191.812.512	178.191.812.512	12.748.545.601	7%	9.057.267.715	3.691.277.886
580 Estudios y Proyectos de Inversión		1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		982.800.000	982.800.000	92.833.745	9%	0	92.833.745
800 Transferencias		109.200.000	109.200.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		109.200.000	109.200.000	0	0%	0	0
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	58.958.795.631	58.958.795.631	28.096.891.196	48%	25.472.891.924	2.623.999.272
200 Servicios No Personales		300.000.000	300.000.000	15.441.382	5%	0	15.441.382
230 Pasajes y Viáticos		300.000.000	300.000.000	15.441.382	5%	0	15.441.382
500 Inversión Física		58.658.795.631	58.658.795.631	28.081.449.814	48%	25.472.891.924	2.608.557.890
520 Construcciones		58.658.795.631	58.658.795.631	28.081.449.814	48%	25.472.891.924	2.608.557.890
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	45.311.142.346	45.311.142.346	16.994.858.604	38%	12.246.439.204	4.748.419.400
200 Servicios No Personales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	0	260.467.750
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	0	260.467.750
500 Inversión Física		41.974.268.326	41.974.268.326	16.443.621.657	39%	11.955.670.007	4.487.951.650
520 Construcciones		36.938.356.112	36.938.356.112	11.407.709.443	31%	11.151.897.323	255.812.120
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		5.035.912.214	5.035.912.214	5.035.912.214	100%	803.772.684	4.232.139.530
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	12.621.204.150	12.621.204.150	558.715.607	4%	0	558.715.607
200 Servicios No Personales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.571.204.150	12.571.204.150	558.715.607	4%	0	558.715.607
520 Construcciones		9.750.000.000	9.750.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		2.821.204.150	2.821.204.150	558.715.607	20%	0	558.715.607
12	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	11.817.565.067	11.817.565.067	4.108.873.581	35%	3.384.765.187	724.108.394
200 Servicios No Personales		701.673.821	701.673.821	441.829.647	63%	231.434.577	210.395.070
230 Pasajes y Viáticos		100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		600.873.821	600.873.821	441.829.647	74%	231.434.577	210.395.070
500 Inversión Física		11.115.891.246	11.115.891.246	3.667.043.934	33%	3.153.330.610	513.713.324
520 Construcciones		11.115.891.246	11.115.891.246	3.667.043.934	33%	3.153.330.610	513.713.324

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	11.917.229.296	11.917.229.296	2.474.451.146	21%	1.971.895.218	502.555.928
500 Inversión Física		11.917.229.296	11.917.229.296	2.474.451.146	21%	1.971.895.218	502.555.928
520	Construcciones	11.007.622.474	11.007.622.474	2.474.451.146	22%	1.971.895.218	502.555.928
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	909.606.822	909.606.822	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	4.618.337.393	4.618.337.393	652.808.220	14%	473.244.533	179.563.687
500 Inversión Física		4.618.337.393	4.618.337.393	652.808.220	14%	473.244.533	179.563.687
520	Construcciones	4.618.337.393	4.618.337.393	652.808.220	14%	473.244.533	179.563.687
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	185.929.934.332	185.929.934.332	24.679.402.419	13%	19.991.461.423	4.687.940.996
100 Servicios Personales		349.800.000	349.800.000	26.400.000	8%	0	26.400.000
140	Personal Contratado	349.800.000	349.800.000	26.400.000	8%	0	26.400.000
200 Servicios No Personales		5.383.750.000	5.383.750.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.323.750.000	5.323.750.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		180.196.384.332	180.196.384.332	24.653.002.419	14%	19.991.461.423	4.661.540.996
520	Construcciones	180.196.384.332	180.196.384.332	24.653.002.419	14%	19.991.461.423	4.661.540.996
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	50.031.266.938	50.031.266.938	22.185.201.723	44%	18.227.250.674	3.957.951.049
100 Servicios Personales		99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.978.487.720	1.978.487.720	129.500.000	7%	98.000.000	31.500.000
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	1.858.487.720	1.858.487.720	129.500.000	7%	98.000.000	31.500.000
500 Inversión Física		47.952.779.222	47.952.779.222	22.055.701.723	46%	18.129.250.674	3.926.451.049
520	Construcciones	47.421.179.222	47.421.179.222	22.055.701.723	47%	18.129.250.674	3.926.451.049
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	531.600.000	531.600.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	14.920.288.035	14.920.288.035	474.858.001	3%	0	474.858.001
200 Servicios No Personales		5.400.000.000	5.400.000.000	474.858.001	9%	0	474.858.001
230	Pasajes y Viáticos	5.400.000.000	5.400.000.000	474.858.001	9%	0	474.858.001
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.580.192.390	8.580.192.390	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
390	Otros Bienes De Consumo	52.186.904	52.186.904	0	0%	0	0
500 Inversión Física		940.095.645	940.095.645	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	940.095.645	940.095.645	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	0	351.075.269
500 Inversión Física		19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	0	351.075.269
520	Construcciones	19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	0	351.075.269

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
500 Inversión Física		23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
520	Construcciones	23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	2.897.207.632	2.897.207.632	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes Y Viáticos	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.397.207.632	2.397.207.632	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.397.207.632	2.397.207.632	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.948.001.517	3.948.001.517	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
500 Inversión Física		239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
520	Construcciones	239.619.241	239.619.241	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
500 Inversión Física		355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
520	Construcciones	355.685.042	355.685.042	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.719.943.324	2.719.943.324	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	973.650.679.476	973.650.679.476	297.019.551.815	31%	296.619.192.936	400.358.879
500 Inversión Física		53.683.100.000	53.683.100.000	400.358.879	1%	0	400.358.879
520 Construcciones		44.713.100.000	44.713.100.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		8.970.000.000	8.970.000.000	400.358.879	4%	0	400.358.879
600 Inversión Financiera		918.193.079.476	918.193.079.476	296.619.192.936	32%	296.619.192.936	0
630 Préstamos al Sector Privado		918.193.079.476	918.193.079.476	296.619.192.936	32%	296.619.192.936	0
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.774.500.000	1.774.500.000	0	0%	0	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	7.681.312.483	7.681.312.483	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.670.331.429	6.670.331.429	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.848.045.012	1.848.045.012	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		4.822.286.417	4.822.286.417	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520 Construcciones		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	16.131.891.084	16.131.891.084	5.903.206.714	37%	5.903.206.714	0
200 Servicios No Personales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.059.449.484	16.059.449.484	5.903.206.714	37%	5.903.206.714	0
520 Construcciones		15.575.085.722	15.575.085.722	5.903.206.714	38%	5.903.206.714	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		484.363.762	484.363.762	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	26.884.117.148	26.884.117.148	2.780.314.881	10%	1.462.545.872	1.317.769.009
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.661.701.510	24.661.701.510	2.780.314.881	11%	1.462.545.872	1.317.769.009
520 Construcciones		23.681.701.510	23.681.701.510	2.780.314.881	12%	1.462.545.872	1.317.769.009
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		980.000.000	980.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	439.005.668.482	439.005.668.482	64.820.203.347	15%	62.881.235.020	1.938.968.327
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	1.646.269.673	19%	753.441.481	892.828.192
230	Pasajes y Viáticos	24.999.998	24.999.998	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.659.640.000	8.659.640.000	1.646.269.673	19%	753.441.481	892.828.192
500 Inversión Física		430.321.028.484	430.321.028.484	63.173.933.674	15%	62.127.793.539	1.046.140.135
520	Construcciones	430.321.028.484	430.321.028.484	63.173.933.674	15%	62.127.793.539	1.046.140.135
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	193.569.704.191	193.569.704.191	41.905.471.826	22%	39.824.826.110	2.080.645.716
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	81.651.232	17%	0	81.651.232
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	81.651.232	17%	0	81.651.232
200 Servicios No Personales		5.889.431.119	5.889.431.119	3.010.070.773	51%	2.892.770.773	117.300.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.889.431.119	5.889.431.119	3.010.070.773	51%	2.892.770.773	117.300.000
500 Inversión Física		187.190.673.072	187.190.673.072	38.813.749.821	21%	36.932.055.337	1.881.694.484
520	Construcciones	179.990.673.072	179.990.673.072	38.813.749.821	22%	36.932.055.337	1.881.694.484
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0	0
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	4.798.871.415	4.798.871.415	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		940.189.920	940.189.920	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	940.189.920	940.189.920	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.858.681.495	3.858.681.495	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	3.858.681.495	3.858.681.495	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	220.585.887.373	220.585.887.373	45.868.529.195	21%	40.762.137.546	5.106.391.649
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	123.200.000	18%	0	123.200.000
140	Personal Contratado	673.200.000	673.200.000	123.200.000	18%	0	123.200.000
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	12.643.080	1%	0	12.643.080
220	Transporte y Almacenaje	157.342.500	157.342.500	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	462.156.768	462.156.768	12.643.080	3%	0	12.643.080
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.524.000	475.524.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		218.817.664.105	218.817.664.105	45.732.686.115	21%	40.762.137.546	4.970.548.569
520	Construcciones	218.817.664.105	218.817.664.105	45.732.686.115	21%	40.762.137.546	4.970.548.569
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
500	Inversión Física	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
520	Construcciones	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
500	Inversión Física	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
520	Construcciones	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	15.175.574.890	15.175.574.890	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.175.574.890	15.175.574.890	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.175.574.890	15.175.574.890	0	0%	0	0
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	357.867.691.311	357.867.691.311	48.588.630.313	14%	28.680.213.042	19.908.417.271
200	Servicios No Personales	2.392.380.000	2.392.380.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.379.880.000	2.379.880.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	350.595.311.311	350.595.311.311	45.609.015.908	13%	28.680.213.042	16.928.802.866
520	Construcciones	331.195.311.311	331.195.311.311	35.861.324.505	11%	28.005.017.851	7.856.306.654
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	19.400.000.000	19.400.000.000	9.747.691.403	50%	675.195.191	9.072.496.212
800	Transferencias	4.880.000.000	4.880.000.000	2.979.614.405	61%	0	2.979.614.405
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.880.000.000	4.880.000.000	2.979.614.405	61%	0	2.979.614.405

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	12.260.111.970	12.260.111.970	179.546.103	1%	0	179.546.103
500	Inversión Física	11.285.111.970	11.285.111.970	52.879.978	0,47%	0	52.879.978
520	Construcciones	9.750.000.000	9.750.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.535.111.970	1.535.111.970	52.879.978	3%	0	52.879.978
800	Transferencias	975.000.000	975.000.000	126.666.125	13%	0	126.666.125
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	975.000.000	975.000.000	126.666.125	13%	0	126.666.125
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	55.891.734.614	55.891.734.614	20.564.420.389	37%	16.350.132.145	4.214.288.244
200	Servicios No Personales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	55.027.734.614	55.027.734.614	20.564.420.389	37%	16.350.132.145	4.214.288.244
520	Construcciones	50.515.734.614	50.515.734.614	20.564.420.389	41%	16.350.132.145	4.214.288.244
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	86.764.109.813	86.764.109.813	23.001.985.935	27%	17.203.190.317	5.798.795.618
200	Servicios No Personales	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	86.044.109.813	86.044.109.813	23.001.985.935	27%	17.203.190.317	5.798.795.618
520	Construcciones	84.028.109.813	84.028.109.813	23.001.985.935	27%	17.203.190.317	5.798.795.618
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
80	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0%	0	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	0	2.000.000.000
500	Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	0	2.000.000.000
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	0	2.000.000.000
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	19.835.302.575	18.839.711.314
500	Inversión Física	58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	19.835.302.575	18.839.711.314
520	Construcciones	58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	19.835.302.575	18.839.711.314

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	88.731.098.297	88.731.098.297	21.991.550.286	25%	15.723.046.794	6.268.503.492
200 Servicios No Personales		1.960.015.936	1.960.015.936	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		82.931.082.361	82.931.082.361	21.972.636.666	26%	15.723.046.794	6.249.589.872
520	Construcciones	67.314.601.561	67.314.601.561	20.761.760.498	31%	15.723.046.794	5.038.713.704
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	15.616.480.800	15.616.480.800	1.210.876.168	8%	0	1.210.876.168
800 Transferencias		3.840.000.000	3.840.000.000	18.913.620	0,49%	0	18.913.620
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	18.913.620	0,49%	0	18.913.620
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	210.944.617.230	210.944.617.230	90.299.231.573	43%	71.836.339.368	18.462.892.205
100 Servicios Personales		288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		209.656.617.230	209.656.617.230	90.299.231.573	43%	71.836.339.368	18.462.892.205
520	Construcciones	206.808.617.230	206.808.617.230	90.299.231.573	44%	71.836.339.368	18.462.892.205
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.128.000.000	2.128.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	320.854.071.960	320.854.071.960	125.327.932.921	39%	61.550.220.413	63.777.712.508
100 Servicios Personales		811.000.000	811.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	64.000.000	64.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.686.000.000	1.686.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.586.000.000	1.586.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		317.397.071.960	317.397.071.960	125.327.932.921	39%	61.550.220.413	63.777.712.508
520	Construcciones	299.557.071.960	299.557.071.960	125.327.932.921	42%	61.550.220.413	63.777.712.508
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.840.000.000	17.840.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	334.720.195.294	334.720.195.294	30.238.920.616	9%	14.960.518.405	15.278.402.211
100 Servicios Personales		1.382.670.024	1.382.670.024	193.045.004	14%	0	193.045.004
140	Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	193.045.004	14%	0	193.045.004
200 Servicios No Personales		2.028.000.000	2.028.000.000	50.260.904	2%	16.164.672	34.096.232
230	Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	50.260.904	25%	16.164.672	34.096.232
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.828.000.000	1.828.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		331.309.525.270	331.309.525.270	29.995.614.708	9%	14.944.353.733	15.051.260.975
520	Construcciones	318.009.525.270	318.009.525.270	29.995.614.708	9%	14.944.353.733	15.051.260.975
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	62.166.188.718	62.166.188.718	28.947.442.877	47%	0	28.947.442.877
200 Servicios No Personales		8.178.000.000	8.178.000.000	101.971.677	1%	0	101.971.677
230	Pasajes y Viáticos	4.200.000.000	4.200.000.000	101.971.677	2%	0	101.971.677
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.978.000.000	3.978.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.155.588.718	22.155.588.718	7.326.000.000	33%	0	7.326.000.000
360	Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	11.955.588.718	11.955.588.718	7.326.000.000	61%	0	7.326.000.000
500 Inversión Física		5.995.000.000	5.995.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.995.000.000	5.995.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		25.837.600.000	25.837.600.000	21.519.471.200	83%	0	21.519.471.200
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.680.000.000	4.680.000.000	361.871.200	8%	0	361.871.200
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	21.157.600.000	21.157.600.000	21.157.600.000	100%	0	21.157.600.000
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	302.663.072.641	302.663.072.641	105.651.139.101	35%	55.464.221.984	50.186.917.117
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.014.706.246	1.014.706.246	0	0%	0	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física		432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
520	Construcciones	432.613.676	432.613.676	0	0%	0	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	2.124.751.029	2.124.751.029	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		397.963.478	397.963.478	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	397.963.478	397.963.478	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.726.787.551	1.726.787.551	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.726.787.551	1.726.787.551	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	32.653.851.755	32.653.851.755	16.956.213.424	52%	13.932.847.678	3.023.365.746
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	170.200.000	35%	0	170.200.000
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	170.200.000	35%	0	170.200.000
200 Servicios No Personales		4.680.639.061	4.680.639.061	3.837.502.532	82%	2.478.437.665	1.359.064.867
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.680.639.061	4.680.639.061	3.837.502.532	82%	2.478.437.665	1.359.064.867
500 Inversión Física		27.483.612.694	27.483.612.694	12.948.510.892	47%	11.454.410.013	1.494.100.879
520	Construcciones	27.483.612.694	27.483.612.694	12.948.510.892	47%	11.454.410.013	1.494.100.879
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
500 Inversión Física		848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
520	Construcciones	848.427.334	848.427.334	0	0%	0	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.947.217.499	1.947.217.499	549.375.723	28%	155.804.882	393.570.841
200 Servicios No Personales		1.649.905.134	1.649.905.134	366.827.187	22%	0	366.827.187
230	Pasejes y Viáticos	1.380.000.000	1.380.000.000	366.827.187	27%	0	366.827.187
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	269.905.134	269.905.134	0	0%	0	0
500 Inversión Física		297.312.365	297.312.365	182.548.536	61%	155.804.882	26.743.654
520	Construcciones	297.312.365	297.312.365	182.548.536	61%	155.804.882	26.743.654

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	26.603.658.206	26.603.658.206	19.197.600.654	72%	17.738.115.815	1.459.484.839
200	Servicios No Personales	2.202.863.077	2.202.863.077	795.660.356	36%	324.321.165	471.339.191
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.202.863.077	2.202.863.077	795.660.356	36%	324.321.165	471.339.191
500	Inversión Física	24.400.795.129	24.400.795.129	18.401.940.298	75%	17.413.794.650	988.145.648
520	Construcciones	24.400.795.129	24.400.795.129	18.401.940.298	75%	17.413.794.650	988.145.648
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	70.825.900.000	70.825.900.000	5.718.605.057	8%	3.079.032.639	2.639.572.418
200	Servicios No Personales	3.600.000.000	3.600.000.000	2.193.894.082	61%	127.585.421	2.066.308.661
230	Pasejes y Viáticos	3.600.000.000	3.600.000.000	2.193.894.082	61%	127.585.421	2.066.308.661
300	Bienes de Consumo e Insumos	60.595.900.000	60.595.900.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.595.900.000	4.595.900.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	6.630.000.000	6.630.000.000	3.524.710.975	53%	2.951.447.218	573.263.757
520	Construcciones	6.630.000.000	6.630.000.000	3.524.710.975	53%	2.951.447.218	573.263.757
15	Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú	6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
500	Inversión Física	6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
520	Construcciones	6.724.124.772	6.724.124.772	0	0%	0	0
16	Construcción Cam. Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari	1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.532.180.891	1.532.180.891	0	0%	0	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	10.411.053.456	10.411.053.456	10.411.053.456	100%	8.407.300.492	2.003.752.964
500	Inversión Física	10.411.053.456	10.411.053.456	10.411.053.456	100%	8.407.300.492	2.003.752.964
520	Construcciones	10.411.053.456	10.411.053.456	10.411.053.456	100%	8.407.300.492	2.003.752.964
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	14.370.847.706	14.370.847.706	7.941.920.478	55%	7.941.920.478	0
200	Servicios No Personales	645.107.628	645.107.628	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	645.107.628	645.107.628	0	0%	0	0
500	Inversión Física	13.725.740.078	13.725.740.078	7.941.920.478	58%	7.941.920.478	0
520	Construcciones	13.725.740.078	13.725.740.078	7.941.920.478	58%	7.941.920.478	0
20	Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	16.211.752.694	16.211.752.694	6.938.039.234	43%	0	6.938.039.234
200	Servicios No Personales	409.284.336	409.284.336	0	0%	0	6.938.039.234
230	Pasejes y Viáticos	409.284.336	409.284.336	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.802.468.358	15.802.468.358	6.938.039.234	44%	0	6.938.039.234
520	Construcciones	15.802.468.358	15.802.468.358	6.938.039.234	44%	0	6.938.039.234
21	Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	7.964.231.355	7.964.231.355	3.836.955.135	48%	3.367.360.000	469.595.135
200	Servicios No Personales	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	7.604.231.355	7.604.231.355	3.836.955.135	50%	3.367.360.000	469.595.135
520	Construcciones	7.604.231.355	7.604.231.355	3.836.955.135	50%	3.367.360.000	469.595.135

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	10.425.065.648	10.425.065.648	5.681.588.457	54%	0	5.681.588.457
200	Servicios No Personales	467.981.399	467.981.399	0	0%	0	5.681.588.457
230	Pasejes y Viáticos	467.981.399	467.981.399	0	0%	0	0
500	Inversión Física	9.957.084.249	9.957.084.249	5.681.588.457	57%	0	5.681.588.457
520	Construcciones	9.957.084.249	9.957.084.249	5.681.588.457	57%	0	5.681.588.457
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	10.917.582.885	10.917.582.885	4.947.672.627	45%	0	4.947.672.627
200	Servicios No Personales	275.626.934	275.626.934	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	275.626.934	275.626.934	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.641.955.951	10.641.955.951	4.947.672.627	46%	0	4.947.672.627
520	Construcciones	10.641.955.951	10.641.955.951	4.947.672.627	46%	0	4.947.672.627
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	2.664.474.156	2.664.474.156	841.840.000	32%	841.840.000	0
200	Servicios No Personales	84.382.890	84.382.890	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	84.382.890	84.382.890	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.580.091.266	2.580.091.266	841.840.000	33%	841.840.000	0
520	Construcciones	2.580.091.266	2.580.091.266	841.840.000	33%	841.840.000	0
25	Mejoramiento de Tramo Vecinal Cristo Rey - Carpa Cue	621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	621.593.501	621.593.501	0	0%	0	0
26	Mejoramiento Tramo Vecinal Carayao - Cerro Corá i- Nicolas Bo	783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	783.952.728	783.952.728	0	0%	0	0
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Temciapora"	34.261.929.913	34.261.929.913	18.222.271.729	53%	0	18.222.271.729
200	Servicios No Personales	870.122.412	870.122.412	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	870.122.412	870.122.412	0	0%	0	0
500	Inversión Física	33.391.807.501	33.391.807.501	18.222.271.729	55%	0	18.222.271.729
520	Construcciones	33.391.807.501	33.391.807.501	18.222.271.729	55%	0	18.222.271.729
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.084.670.602	8.084.670.602	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
500	Inversión Física	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
520	Construcciones	9.635.427.725	9.635.427.725	0	0%	0	0
31	Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	0	4.408.003.127
500	Inversión Física	5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	0	4.408.003.127
520	Construcciones	5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	0	4.408.003.127
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.911.656.288	15.911.656.288	0	0%	0	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	444.271.845.132	444.271.845.132	33.793.802.139	8%	7.428.571.683	26.365.230.456
01	SP Proyecto Acueducto	1.648.487.527	1.648.487.527	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	18.443.038.220	18.443.038.220	1.733.002.607	9%	1.153.132.882	579.869.725
100	Servicios Personales	975.312.852	975.312.852	175.000.000	18%	0	175.000.000
140	Personal Contratado	975.312.852	975.312.852	175.000.000	18%	0	175.000.000
500	Inversión Física	17.467.725.368	17.467.725.368	1.558.002.607	9%	1.153.132.882	404.869.725
520	Construcciones	17.467.725.368	17.467.725.368	1.558.002.607	9%	1.153.132.882	404.869.725
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	13.561.706.701	13.561.706.701	6.716.393.062	50%	0	6.716.393.062
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	12.246.800.161	12.246.800.161	6.716.393.062	55%	0	6.716.393.062
520	Construcciones	12.246.800.161	12.246.800.161	6.716.393.062	55%	0	6.716.393.062
800	Transferencias	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	8.347.534.354	8.347.534.354	3.485.588.147	42%	1.579.753.260	1.905.834.887
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	7.259.127.814	7.259.127.814	3.485.588.147	48%	1.579.753.260	1.905.834.887
520	Construcciones	7.259.127.814	7.259.127.814	3.485.588.147	48%	1.579.753.260	1.905.834.887
800	Transferencias	390.000.000	390.000.000	0	0%	0	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	390.000.000	390.000.000	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	74.978.376.535	74.978.376.535	448.700.000	1%	232.000.000	216.700.000
100	Servicios Personales	1.930.899.200	1.930.899.200	62.700.000	3%	0	62.700.000
130	Asignaciones Complementarias	328.320.000	328.320.000	62.700.000	19%	0	62.700.000
140	Personal Contratado	1.602.579.200	1.602.579.200	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	6.939.269.321	6.939.269.321	386.000.000	6%	232.000.000	154.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.939.269.321	6.939.269.321	386.000.000	6%	232.000.000	154.000.000
500	Inversión Física	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0	0
520	Construcciones	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0	0
800	Transferencias	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	79.088.289.951	79.088.289.951	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	2.762.899.200	2.762.899.200	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	328.320.000	328.320.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	2.434.579.200	2.434.579.200	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
500	Inversión Física	63.444.032.697	63.444.032.697	0	0%	0	0
510	Adquisición de Inmuebles	4.359.744.000	4.359.744.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	59.084.288.697	59.084.288.697	0	0%	0	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	138.696.350.340	138.696.350.340	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
500	Inversión Física	129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
520	Construcciones	129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
700	Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	26.288.560.003	26.288.560.003	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500	Inversión Física	23.362.144.947	23.362.144.947	0	0%	0	0
520	Construcciones	23.362.144.947	23.362.144.947	0	0%	0	0
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	19.895.777.370	19.895.777.370	8.245.938.005	41%	0	8.245.938.005
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500	Inversión Física	16.969.362.314	16.969.362.314	8.245.938.005	49%	0	8.245.938.005
520	Construcciones	16.969.362.314	16.969.362.314	8.245.938.005	49%	0	8.245.938.005
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	20.804.890.914	20.804.890.914	8.700.494.777	42%	0	8.700.494.777
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500	Inversión Física	17.878.475.858	17.878.475.858	8.700.494.777	49%	0	8.700.494.777
520	Construcciones	17.878.475.858	17.878.475.858	8.700.494.777	49%	0	8.700.494.777
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	18.413.833.217	18.413.833.217	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.487.418.161	15.487.418.161	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.487.418.161	15.487.418.161	0	0%	0	0
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
500	Inversión Física	14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
520	Construcciones	14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		4.990.758.373.996	4.990.758.373.996	1.155.310.171.352	23%	860.000.720.510	295.309.450.842

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	72.473.014.064	72.473.014.064	13.070.872.552	18%	10.240.946.187	2.829.926.365
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	72.473.014.064	72.473.014.064	13.070.872.552	18%	10.240.946.187	2.829.926.365
800	Transferencias	72.473.014.064	72.473.014.064	13.070.872.552	18%	10.240.946.187	2.829.926.365
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	69.455.274.921	69.455.274.921	12.594.905.052	18%	10.240.946.187	2.353.958.865
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	3.017.739.143	3.017.739.143	475.967.500	16%	0	475.967.500
SUBTOTAL		72.473.014.064	72.473.014.064	13.070.872.552	18%	10.240.946.187	2.829.926.365

TOTAL ENTIDAD	7.148.158.929.607	7.148.158.929.607	1.511.651.582.628	21%	1.020.253.302.266	491.398.280.362
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 07/04/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
