



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2024 AL 30/04/2025


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	268.897.360.285	1.220.599.331	270.117.959.616	69.377.985.343	200.739.974.273
200 Servicios No Personales	250.519.761.960	30.062.332.419	280.582.094.379	40.601.983.117	239.980.111.262
300 Bienes de Consumo e Insumos	125.784.303.975	-1.771.921.759	124.012.382.216	26.039.642.383	97.972.739.833
500 Inversión Física	5.134.635.978.804	-25.097.008.768	5.109.538.970.036	1.199.050.978.298	3.910.487.991.738
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	-250.000.000	918.193.079.476	429.237.559.780	488.955.519.696
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	0	6.869.325.120	0	6.869.325.120
800 Transferencias	432.290.446.175	3.343.000.000	435.633.446.175	151.213.342.896	284.420.103.279
900 Otros Gastos	3.968.673.812	334.401.857	4.303.075.669	2.728.236.498	1.574.839.171
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	7.841.403.080	7.149.250.332.687	1.918.249.728.315	5.231.000.604.372


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 07/05/2025

Participación Presupuestaria

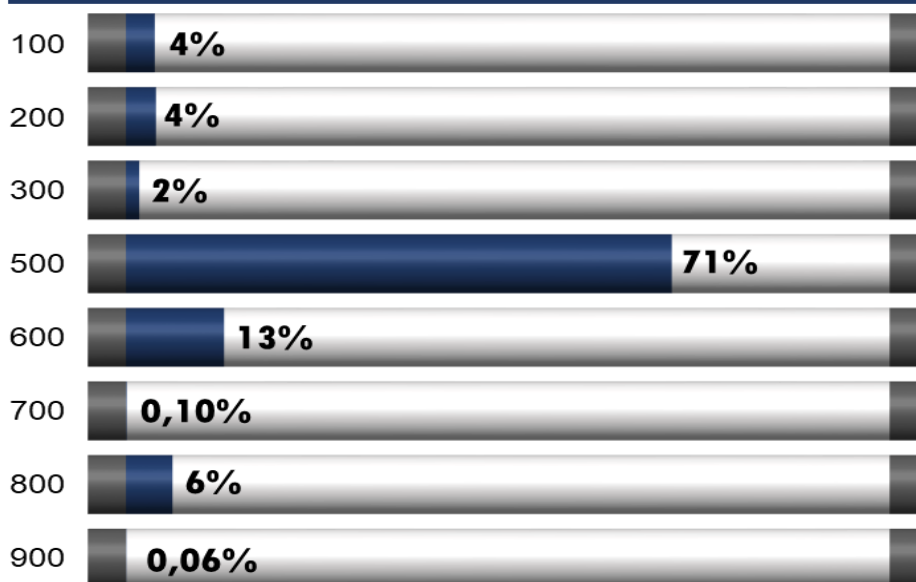


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

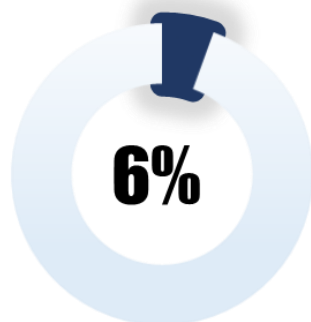


Presupuesto: \$ 1.300.314.757.794
Ejecutado: \$ 72.008.382.430

Recursos del Crédito Público

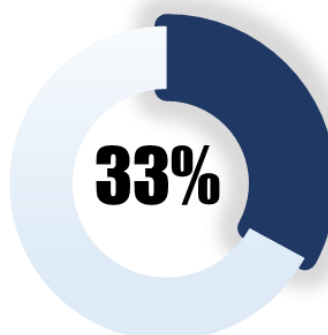

Presupuesto: \$ 5.144.159.919.673
Ejecutado: \$ 1.692.280.133.306

Recursos Institucionales

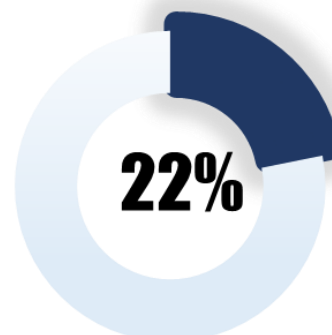

Presupuesto: \$ 704.775.655.220
Ejecutado: \$ 153.961.212.579

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.100.969.296.116	2.100.969.296.116	376.060.966.632	18%	304.933.987.102
01	Gestión Administrativa Financiera	386.302.535.087	386.302.535.087	82.920.595.811	21%	47.780.077.288
100 Servicios Personales		198.464.701.063	198.464.701.063	54.063.715.668	27%	42.542.531.914
110	Remuneraciones Básicas	158.309.331.895	158.309.331.895	41.237.201.712	26%	31.708.586.385
120	Remuneraciones Temporales	9.091.049.773	9.091.049.773	1.898.427.515	21%	1.898.427.515
130	Asignaciones Complementarias	19.192.531.261	19.192.531.261	6.783.207.033	35%	5.910.075.767
140	Personal Contratado	10.506.407.920	10.506.407.920	3.707.026.724	35%	2.804.287.078
190	Otros Gastos del Personal	1.365.380.214	1.365.380.214	437.852.684	32%	221.155.169
200 Servicios No Personales		107.596.581.026	107.596.581.026	21.282.555.989	20%	5.177.808.259
210	Servicios Básicos	4.518.200.000	4.518.200.000	3.050.939.396	68%	439.293.676
220	Transporte y Almacenaje	305.000.000	305.000.000	84.661.917	28%	0
230	Pasajes y Viáticos	7.380.169.446	7.380.169.446	1.005.792.645	14%	146.349.051
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.138.629.998	25.138.629.998	3.546.525.321	14%	1.257.602.958
250	Alquileres y Derechos	3.895.701.910	3.895.701.910	595.402.004	15%	118.333.333
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.146.120.772	16.146.120.772	2.386.599.940	15%	571.229.333
270	Servicio Social	44.262.078.900	44.262.078.900	10.612.634.766	24%	2.644.999.908
280	Otros Servicios en General	5.520.680.000	5.520.680.000	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	430.000.000	430.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.890.478.640	25.890.478.640	4.619.426.853	18%	57.659.917
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.723.502.000	1.723.502.000	114.012.056	7%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.658.000.000	2.658.000.000	26.105.000	1%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	112.500.000	112.500.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.812.976.640	20.812.976.640	4.479.309.797	22%	57.659.917
390	Otros Bienes de Consumo	583.500.000	583.500.000	0	0%	0
500 Inversión Física		50.424.374.358	50.424.374.358	517.430.000	1%	0
520	Construcciones	21.986.374.358	21.986.374.358	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.105.000.000	8.105.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.833.000.000	4.833.000.000	517.430.000	11%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0%	0
900 Otros Gastos		3.926.400.000	3.926.400.000	2.437.467.301	62%	2.077.198
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.926.400.000	3.926.400.000	2.437.467.301	62%	2.077.198
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	302.760.000.000	302.760.000.000	106.372.986.251	35%	3.059.843.889
800 Transferencias		302.760.000.000	302.760.000.000	106.372.986.251	35%	3.059.843.889
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	302.760.000.000	302.760.000.000	106.372.986.251	35%	3.059.843.889

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	8.213.430.532	8.213.430.532	1.337.545.432	16%	360.677.023	976.868.409
100 Servicios Personales		6.001.554.943	6.001.554.943	1.337.545.432	22%	360.677.023	976.868.409
110 Remuneraciones Básicas		2.769.857.987	2.769.857.987	819.870.760	30%	214.632.290	605.238.470
120 Remuneraciones Temporales		135.624.294	135.624.294	35.126.922	26%	0	35.126.922
130 Asignaciones Complementarias		831.823.519	831.823.519	245.885.472	30%	94.631.880	151.253.592
140 Personal Contratado		2.121.249.143	2.121.249.143	226.994.914	11%	46.579.171	180.415.743
190 Otros Gastos del Personal		143.000.000	143.000.000	9.667.364	7%	4.833.682	4.833.682
200 Servicios No Personales		1.665.303.858	1.665.303.858	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		196.383.438	196.383.438	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		196.150.000	196.150.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.172.770.420	1.172.770.420	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.419.000	118.419.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.170.000	42.170.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		61.336.000	61.336.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		14.913.000	14.913.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		374.520.071	374.520.071	0	0%	0	0
520 Construcciones		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		120.520.000	120.520.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		44.000.071	44.000.071	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		53.632.660	53.632.660	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		53.632.660	53.632.660	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	9.035.867.128	9.035.867.128	511.601.093	6%	273.389.596	238.211.497
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	360.068.945	18%	121.857.448	238.211.497
120	Remuneraciones Temporales	394.767.134	394.767.134	46.581.985	12%	0	46.581.985
130	Asignaciones Complementarias	758.482.961	758.482.961	240.326.472	32%	102.370.440	137.956.032
140	Personal Contratado	661.265.361	661.265.361	62.372.944	9%	15.593.236	46.779.708
190	Otros Gastos del Personal	162.851.000	162.851.000	10.787.544	7%	3.893.772	6.893.772
200 Servicios No Personales		2.874.410.300	2.874.410.300	151.532.148	5%	151.532.148	0
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	10.432.148	1%	10.432.148	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	141.100.000	15%	141.100.000	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	561.410.300	561.410.300	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		213.690.372	213.690.372	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.550.000.000	1.550.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	320.400.000	320.400.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	59.877.249.514	59.877.249.514	12.437.923.160	21%	3.290.793.083
100	Servicios Personales	41.607.806.695	41.607.806.695	11.298.574.452	27%	2.159.322.671
110	Remuneraciones Básicas	34.466.421.613	34.466.421.613	9.854.695.467	29%	1.999.357.890
120	Remuneraciones Temporales	1.082.042.734	1.082.042.734	83.887.861	8%	0
130	Asignaciones Complementarias	3.200.000.000	3.200.000.000	930.612.828	29%	71.015.811
140	Personal Contratado	2.756.987.941	2.756.987.941	333.474.724	12%	82.384.540
190	Otros Gastos del Personal	102.354.407	102.354.407	95.903.572	94%	6.564.430
200	Servicios No Personales	7.077.454.723	7.077.454.723	208.659.027	3%	200.780.731
230	Pasajes y Viáticos	1.068.928.000	1.068.928.000	29.059.289	3%	21.180.993
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.096.517.198	4.096.517.198	171.258.333	4%	171.258.333
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	8.341.405	6%	8.341.405
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.727.009.525	1.727.009.525	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	35.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.070.000.000	3.070.000.000	220.975.397	7%	220.975.397
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	220.000.000	220.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.600.000.000	2.600.000.000	220.975.397	8%	220.975.397
500	Inversión Física	8.009.714.284	8.009.714.284	709.714.284	9%	709.714.284
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.509.714.284	6.509.714.284	709.714.284	11%	709.714.284
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	80.000.000	80.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.000.000	80.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	32.273.812	32.273.812	0	0%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.273.812	32.273.812	0	0%	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	3.380.000.000	3.380.000.000	380.370.867	11%	103.254.348
100	Servicios Personales	1.818.386.800	1.818.386.800	277.222.492	15%	27.498.769
120	Remuneraciones Temporales	460.000.000	460.000.000	46.454.437	10%	0
130	Asignaciones Complementarias	615.000.000	615.000.000	175.270.876	28%	24.955.460
140	Personal Contratado	597.386.800	597.386.800	11.193.236	2%	2.543.309
190	Otros Gastos del Personal	146.000.000	146.000.000	44.303.943	30%	0
200	Servicios No Personales	1.011.613.200	1.011.613.200	103.148.375	10%	75.755.579
230	Pasajes y Viáticos	1.011.613.200	1.011.613.200	103.148.375	10%	75.755.579
500	Inversión Física	550.000.000	550.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	250.000.000	250.000.000	0	0%	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	2.370.000.000	2.370.000.000	80.874.268	3%	80.874.268
200 Servicios No Personales		1.125.000.000	1.125.000.000	54.854.268	5%	54.854.268
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	805.000.000	805.000.000	54.854.268	7%	54.854.268
260	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000.000	220.000.000	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		195.000.000	195.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.000.000	15.000.000	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		1.050.000.000	1.050.000.000	26.020.000	2%	26.020.000
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	26.020.000	6%	26.020.000
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.266.165.728	2.266.165.728	256.268.962	11%	235.001.868
200 Servicios No Personales		2.266.165.728	2.266.165.728	256.268.962	11%	235.001.868
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	56.249.356	29%	34.982.262
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.512.815.728	1.512.815.728	28.419.606	2%	28.419.606
250	Alquileres y Derechos	557.700.000	557.700.000	171.600.000	31%	171.600.000
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	247.279.935.536	247.279.935.536	553.933.743	0,22%	32.537.496
200 Servicios No Personales		179.560.000	179.560.000	53.933.743	30%	32.537.496
230	Pasajes y Viáticos	69.160.000	69.160.000	53.933.743	78%	21.396.247
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		843.300.000	843.300.000	500.000.000	59%	500.000.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	183.300.000	183.300.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	500.000.000	77%	500.000.000
500 Inversión Física		245.297.075.536	245.297.075.536	0	0%	0
520	Construcciones	245.297.075.536	245.297.075.536	0	0%	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	95.736.927.178	95.736.927.178	0	0%	0
200	Servicios No Personales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0
500	Inversión Física	95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0
520	Construcciones	95.387.007.178	95.387.007.178	0	0%	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2º Etapa	2.421.642.853	2.421.642.853	0	0%	0
100	Servicios Personales	13.721.400	13.721.400	0	0%	0
140	Personal Contratado	13.721.400	13.721.400	0	0%	0
500	Inversión Física	2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.047.254.411	2.047.254.411	0	0%	0
800	Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	134.000.000	134.000.000	0	0%	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	0	0%	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	21.738.327	21.738.327	0	0%	0
500	Inversión Física	21.738.327	21.738.327	0	0%	0
520	Construcciones	21.738.327	21.738.327	0	0%	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0
500	Inversión Física	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0
520	Construcciones	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.822.569.340
500	Inversión Física	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.822.569.340
520	Construcciones	6.944.538.090	6.944.538.090	1.822.569.340	26%	1.822.569.340
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0
800	Transferencias	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	9.201.017.500	9.201.017.500	0	0%	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	11.778.946.863	11.778.946.863	658.015.389	6%	461.547.943	196.467.446
200	Servicios No Personales	1.974.046.167	1.974.046.167	658.015.389	33%	461.547.943	196.467.446
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.046.167	1.974.046.167	658.015.389	33%	461.547.943	196.467.446
500	Inversión Física	9.779.690.031	9.779.690.031	0	0%	0	0
520	Construcciones	7.950.156.371	7.950.156.371	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.829.533.660	1.829.533.660	0	0%	0	0
800	Transferencias	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	1.073.217.282	1.073.217.282	984.254.442	92%	656.169.628	328.084.814
500	Inversión Física	1.073.217.282	1.073.217.282	984.254.442	92%	656.169.628	328.084.814
520	Construcciones	1.073.217.282	1.073.217.282	984.254.442	92%	656.169.628	328.084.814
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	282.926.315.610	282.926.315.610	47.575.673.343	17%	46.377.910.540	1.197.762.803
500	Inversión Física	282.926.315.610	282.926.315.610	47.575.673.343	17%	46.377.910.540	1.197.762.803
520	Construcciones	281.684.743.428	281.684.743.428	47.575.673.343	17%	46.377.910.540	1.197.762.803
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.241.572.182	1.241.572.182	0	0%	0	0
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	63.895.734.467	63.895.734.467	32.577.112.283	51%	32.577.112.283	0
500	Inversión Física	63.895.734.467	63.895.734.467	32.577.112.283	51%	32.577.112.283	0
520	Construcciones	63.895.734.467	63.895.734.467	32.577.112.283	51%	32.577.112.283	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	898.746.558	898.746.558	0	0%	0	0
500	Inversión Física	898.746.558	898.746.558	0	0%	0	0
520	Construcciones	898.746.558	898.746.558	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	306.670.459.388	306.670.459.388	1.706.795.440	1%	1.386.807.440	319.988.000
100	Servicios Personales	3.175.872.000	3.175.872.000	734.664.000	23%	489.776.000	244.888.000
140	Personal Contratado	3.175.872.000	3.175.872.000	734.664.000	23%	489.776.000	244.888.000
200	Servicios No Personales	13.021.075.431	13.021.075.431	578.531.440	4%	503.431.440	75.100.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	13.021.075.431	13.021.075.431	578.531.440	4%	503.431.440	75.100.000
500	Inversión Física	286.809.145.707	286.809.145.707	0	0%	0	0
520	Construcciones	284.340.217.707	284.340.217.707	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.401.600.000	1.401.600.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	731.712.000	731.712.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	335.616.000	335.616.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	3.664.366.250	3.664.366.250	393.600.000	11%	393.600.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.342.800.000	1.342.800.000	393.600.000	29%	393.600.000	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	2.321.566.250	2.321.566.250	0	0%	0	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	20.794.534.711	20.794.534.711	8.102.738.857	39%	5.833.876.951	2.268.861.906
500	Inversión Física	20.794.534.711	20.794.534.711	8.102.738.857	39%	5.833.876.951	2.268.861.906
520	Construcciones	20.794.534.711	20.794.534.711	8.102.738.857	39%	5.833.876.951	2.268.861.906
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	24.929.973.774	24.929.973.774	17.504.043.197	70%	16.843.230.891	660.812.306
500	Inversión Física	24.929.973.774	24.929.973.774	17.504.043.197	70%	16.843.230.891	660.812.306
520	Construcciones	24.929.973.774	24.929.973.774	17.504.043.197	70%	16.843.230.891	660.812.306

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	3.177.696.000	3.177.696.000	0	0%	0
100 Servicios Personales		115.200.000	115.200.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.972.560.000	1.972.560.000	0	0%	0
500 Inversión Física		1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.089.936.000	1.089.936.000	0	0%	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	37.684.797.830	37.684.797.830	14.323.080.681	38%	13.885.914.014
100 Servicios Personales		115.200.000	115.200.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		5.049.646.790	5.049.646.790	904.866.667	18%	467.700.000
230	Pasajes y Viáticos	47.175.000	47.175.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.503.455.724	4.503.455.724	904.866.667	20%	467.700.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	499.016.066	499.016.066	0	0%	0
500 Inversión Física		28.842.061.440	28.842.061.440	13.418.214.014	47%	13.418.214.014
520	Construcciones	20.708.784.000	20.708.784.000	13.418.214.014	65%	13.418.214.014
580	Estudios y Proyectos de Inversión	8.133.277.440	8.133.277.440	0	0%	0
800 Transferencias		3.677.889.600	3.677.889.600	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	433.324.800	433.324.800	0	0%	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	3.244.564.800	3.244.564.800	0	0%	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	12.919.311.597	12.919.311.597	0	0%	0
100 Servicios Personales		60.000.000	60.000.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		3.118.008.600	3.118.008.600	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	17.175.000	17.175.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.100.833.600	3.100.833.600	0	0%	0
500 Inversión Física		9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0
520	Construcciones	9.741.302.997	9.741.302.997	0	0%	0
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	10.568.074.200	10.568.074.200	0	0%	0
100 Servicios Personales		175.200.000	175.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		4.398.226.200	4.398.226.200	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	17.175.000	17.175.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.381.051.200	4.381.051.200	0	0%	0
500 Inversión Física		5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0
520	Construcciones	5.994.648.000	5.994.648.000	0	0%	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	114.538.505.534	114.538.505.534	45.954.584.073	40%	42.258.659.505	3.695.924.568
500 Inversión Física		114.538.505.534	114.538.505.534	45.954.584.073	40%	42.258.659.505	3.695.924.568
520	Construcciones	114.538.505.534	114.538.505.534	45.954.584.073	40%	42.258.659.505	3.695.924.568
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
54	Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	3.050.000.000	3.050.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	35.000.000.000	35.000.000.000	0	0%	0	0
56	Construcción Gran Hospital General	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	14.938.805.907	14.938.805.907	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		336.355.907	336.355.907	0	0%	0	0
120	Remuneraciones Temporales	122.470.833	122.470.833	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	92.625.000	92.625.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	121.260.074	121.260.074	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.385.200.000	2.385.200.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	235.200.000	235.200.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.150.000.000	2.150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.217.250.000	12.217.250.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	11.822.250.000	11.822.250.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	395.000.000	395.000.000	0	0%	0	0
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.101.769.296.116	2.101.769.296.116	376.060.966.632	18%	304.933.987.102	71.126.979.530

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.228.073.104.734	4.228.073.104.734	1.318.709.029.635	31%	327.169.747.234
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	470.827.779	470.827.779	44.698.338	9%	44.698.338
200	Servicios No Personales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	45.827.779	45.827.779	44.698.338	98%	44.698.338
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	45.827.779	45.827.779	44.698.338	98%	44.698.338
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	61.758.587.497	61.758.587.497	12.319.027.305	20%	17.643.897
200	Servicios No Personales	516.273.149	516.273.149	17.540.727	3%	1.183.897
230	Pasajes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	17.540.727	5%	1.183.897
260	Servicios Técnicos y Profesionales	156.273.149	156.273.149	0	0%	0
500	Inversión Física	61.102.314.348	61.102.314.348	12.285.026.578	20%	0
520	Construcciones	60.907.314.348	60.907.314.348	12.285.026.578	20%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	195.000.000	195.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	197.778.854.277	197.778.854.277	14.487.628.468	7%	3.855.700.847
200	Servicios No Personales	337.137.999	337.137.999	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	17.499.999	17.499.999	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	319.638.000	319.638.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.000.000	2.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes De Consumo	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	197.330.516.278	197.330.516.278	14.482.975.285	7%	3.851.047.664
520	Construcciones	194.491.812.512	194.491.812.512	14.390.141.540	7%	3.758.213.919
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	982.800.000	982.800.000	92.833.745	9%	92.833.745
800	Transferencias	109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	4.653.183
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	4.653.183
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	74.060.280.418	74.060.280.418	29.166.267.973	39%	1.068.666.439
200	Servicios No Personales	300.000.000	300.000.000	16.151.720	5%	0
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	16.151.720	5%	0
500	Inversión Física	73.760.280.418	73.760.280.418	29.150.116.253	40%	1.068.666.439
520	Construcciones	72.658.795.631	72.658.795.631	29.150.116.253	40%	1.068.666.439
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.101.484.787	1.101.484.787	0	0%	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	24.866.854.714	24.866.854.714	16.994.858.604	68%	0
200	Servicios No Personales	3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	0
500	Inversión Física	21.529.980.694	21.529.980.694	16.443.621.657	76%	0
520	Construcciones	16.494.068.480	16.494.068.480	11.407.709.443	69%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.035.912.214	5.035.912.214	5.035.912.214	100%	0
900	Otros Gastos	290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	17.621.204.150	17.621.204.150	3.415.018.853	19%	447.240.830	2.967.778.023
200 Servicios No Personales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		17.571.204.150	17.571.204.150	3.415.018.853	19%	447.240.830	2.967.778.023
520 Construcciones		14.750.000.000	14.750.000.000	2.632.682.830	18%	0	2.632.682.830
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		2.821.204.150	2.821.204.150	782.336.023	28%	447.240.830	335.095.193
12	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	29.817.565.067	29.817.565.067	5.884.808.049	20%	4.108.873.581	1.775.934.468
200 Servicios No Personales		2.201.673.821	2.201.673.821	441.829.647	20%	441.829.647	0
230 Pasajes y Viáticos		100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.100.873.821	2.100.873.821	441.829.647	21%	441.829.647	0
500 Inversión Física		27.615.891.246	27.615.891.246	5.442.978.402	20%	3.667.043.934	1.775.934.468
520 Construcciones		27.615.891.246	27.615.891.246	5.442.978.402	20%	3.667.043.934	1.775.934.468
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	11.917.229.296	11.917.229.296	3.388.328.816	28%	2.474.451.146	913.877.670
500 Inversión Física		11.917.229.296	11.917.229.296	3.388.328.816	28%	2.474.451.146	913.877.670
520 Construcciones		11.007.622.474	11.007.622.474	3.388.328.816	31%	2.474.451.146	913.877.670
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		909.606.822	909.606.822	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	13.578.337.393	13.578.337.393	652.808.220	5%	652.808.220	0
500 Inversión Física		13.578.337.393	13.578.337.393	652.808.220	5%	652.808.220	0
520 Construcciones		13.578.337.393	13.578.337.393	652.808.220	5%	652.808.220	0
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	168.560.237.240	168.560.237.240	27.970.657.085	17%	24.679.402.419	3.291.254.666
100 Servicios Personales		162.000.000	162.000.000	26.400.000	16%	26.400.000	0
140 Personal Contratado		162.000.000	162.000.000	26.400.000	16%	26.400.000	0
200 Servicios No Personales		3.055.000.000	3.055.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.995.000.000	2.995.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		165.343.237.240	165.343.237.240	27.944.257.085	17%	24.653.002.419	3.291.254.666
520 Construcciones		165.343.237.240	165.343.237.240	27.944.257.085	17%	24.653.002.419	3.291.254.666
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	67.400.964.030	67.400.964.030	28.179.010.879	42%	21.479.785.904	6.699.224.975
100 Servicios Personales		99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.151.833.000	2.151.833.000	388.000.000	18%	129.500.000	258.500.000
230 Pasajes y Viáticos		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos Y Profesionales		2.030.000.000	2.030.000.000	388.000.000	19%	129.500.000	258.500.000
290 Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		1.833.000	1.833.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		65.149.131.034	65.149.131.034	27.791.010.879	43%	21.350.285.904	6.440.724.975
520 Construcciones		56.109.131.034	56.109.131.034	27.791.010.879	50%	21.350.285.904	6.440.724.975
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		9.040.000.000	9.040.000.000	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	12.744.005.486	12.744.005.486	618.303.266	5%	595.271.088	23.032.178
200 Servicios No Personales		4.216.000.000	4.216.000.000	618.303.266	15%	595.271.088	23.032.178
230 Pasajes y Viáticos		4.216.000.000	4.216.000.000	618.303.266	15%	595.271.088	23.032.178
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	351.075.269	0
500 Inversión Física		19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	351.075.269	0
520 Construcciones		19.411.917.717	19.411.917.717	351.075.269	2%	351.075.269	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
500 Inversión Física		23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
520	Construcciones	23.599.589.532	23.599.589.532	1.988.781.162	8%	1.988.781.162	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	354.247.310	354.247.310	0	0%	0	0
500 Inversión Física		354.247.310	354.247.310	0	0%	0	0
520	Construcciones	354.247.310	354.247.310	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
520	Construcciones	948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
500 Inversión Física		545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
520	Construcciones	545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
500 Inversión Física		719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
520	Construcciones	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.876.945.322	1.876.945.322	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	973.650.679.476	973.650.679.476	430.286.650.022	44%	296.814.704.233	133.471.945.789
500 Inversión Física		53.683.100.000	53.683.100.000	941.385.942	2%	195.511.297	745.874.645
520	Construcciones	44.713.100.000	44.713.100.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.970.000.000	8.970.000.000	941.385.942	10%	195.511.297	745.874.645
600 Inversión Financiera		918.193.079.476	918.193.079.476	429.237.559.780	47%	296.619.192.936	132.618.366.844
630	Préstamos al Sector Privado	918.193.079.476	918.193.079.476	429.237.559.780	47%	296.619.192.936	132.618.366.844
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	107.704.300	6%	0	107.704.300
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.774.500.000	1.774.500.000	107.704.300	6%	0	107.704.300
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	7.681.312.483	7.681.312.483	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.670.331.429	6.670.331.429	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.848.045.012	1.848.045.012	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.822.286.417	4.822.286.417	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.010.981.054	1.010.981.054	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	18.448.889.009	18.448.889.009	8.095.961.090	44%	5.903.206.714	2.192.754.376
200 Servicios No Personales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	72.441.600	72.441.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.376.447.409	18.376.447.409	8.095.961.090	44%	5.903.206.714	2.192.754.376
520	Construcciones	17.871.901.824	17.871.901.824	7.843.688.298	44%	5.903.206.714	1.940.481.584
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	504.545.585	504.545.585	252.272.792	50%	0	252.272.792
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	26.884.117.148	26.884.117.148	2.868.744.176	11%	2.780.314.881	88.429.295
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.661.701.510	24.661.701.510	2.868.744.176	12%	2.780.314.881	88.429.295
520	Construcciones	23.681.701.510	23.681.701.510	2.868.744.176	12%	2.780.314.881	88.429.295
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	980.000.000	980.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	439.005.668.482	439.005.668.482	65.861.163.202	15%	64.768.366.945	1.092.796.257
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	1.678.532.450	19%	1.594.433.271	84.099.179
230	Pasajes y Viáticos	24.999.998	24.999.998	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.659.640.000	8.659.640.000	1.678.532.450	19%	1.594.433.271	84.099.179
500 Inversión Física		430.321.028.484	430.321.028.484	64.182.630.752	15%	63.173.933.674	1.008.697.078
520	Construcciones	430.321.028.484	430.321.028.484	64.182.630.752	15%	63.173.933.674	1.008.697.078
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	202.869.704.191	202.869.704.191	86.274.839.402	43%	41.788.171.826	44.486.667.576
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	122.476.848	25%	81.651.232	40.825.616
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	122.476.848	25%	81.651.232	40.825.616
200 Servicios No Personales		5.889.431.119	5.889.431.119	4.381.210.495	74%	2.892.770.773	1.488.439.722
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.889.431.119	5.889.431.119	4.381.210.495	74%	2.892.770.773	1.488.439.722
500 Inversión Física		196.490.673.072	196.490.673.072	81.771.152.059	42%	38.813.749.821	42.957.402.238
520	Construcciones	189.290.673.072	189.290.673.072	81.771.152.059	43%	38.813.749.821	42.957.402.238
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	224.315.913.973	224.315.913.973	70.266.299.557	31%	44.612.009.195	25.654.290.362
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	184.800.000	27%	166.680.000	18.120.000
140	Personal Contratado	673.200.000	673.200.000	184.800.000	27%	166.680.000	18.120.000
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	12.643.080	1%	12.643.080	0
220	Transporte y Almacenaje	157.342.500	157.342.500	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	462.156.768	462.156.768	12.643.080	3%	12.643.080	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.524.000	475.524.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		222.547.690.705	222.547.690.705	70.068.856.477	31%	44.432.686.115	25.636.170.362
520	Construcciones	222.547.690.705	222.547.690.705	70.068.856.477	31%	44.432.686.115	25.636.170.362
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0
500	Inversión Física	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0
520	Construcciones	2.520.235.958	2.520.235.958	0	0%	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
500	Inversión Física	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
520	Construcciones	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
500	Inversión Física	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
520	Construcciones	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	25.775.574.890	25.775.574.890	0	0%	0
500	Inversión Física	25.775.574.890	25.775.574.890	0	0%	0
520	Construcciones	25.775.574.890	25.775.574.890	0	0%	0
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	243.064.119.129	243.064.119.129	76.078.552.377	31%	37.997.140.769
200	Servicios No Personales	2.392.380.000	2.392.380.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.379.880.000	2.379.880.000	0	0%	0
500	Inversión Física	235.791.739.129	235.791.739.129	71.919.014.137	31%	35.424.186.869
520	Construcciones	213.599.739.129	213.599.739.129	61.384.262.696	29%	30.621.717.505
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	22.192.000.000	22.192.000.000	10.534.751.441	47%	4.802.469.364
800	Transferencias	4.880.000.000	4.880.000.000	4.159.538.240	85%	2.572.953.900
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.880.000.000	4.880.000.000	4.159.538.240	85%	2.572.953.900

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	18.760.111.970	18.760.111.970	727.487.000	4%	0	727.487.000
500 Inversión Física		17.785.111.970	17.785.111.970	497.922.327	3%	0	497.922.327
520	Construcciones	14.750.000.000	14.750.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.035.111.970	3.035.111.970	497.922.327	16%	0	497.922.327
800 Transferencias		975.000.000	975.000.000	229.564.673	24%	0	229.564.673
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	975.000.000	975.000.000	229.564.673	24%	0	229.564.673
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	55.891.734.614	55.891.734.614	22.092.905.272	40%	20.813.104.482	1.279.800.790
200 Servicios No Personales		864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		55.027.734.614	55.027.734.614	22.092.905.272	40%	20.813.104.482	1.279.800.790
520	Construcciones	50.515.734.614	50.515.734.614	22.092.905.272	44%	20.813.104.482	1.279.800.790
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	73.624.111.888	73.624.111.888	28.734.128.078	39%	19.184.936.132	9.549.191.946
200 Servicios No Personales		720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		72.904.111.888	72.904.111.888	28.734.128.078	39%	19.184.936.132	9.549.191.946
520	Construcciones	70.888.111.888	70.888.111.888	28.734.128.078	41%	19.184.936.132	9.549.191.946
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
80	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	40.093.080.464	40.093.080.464	0	0%	0	0
500 Inversión Física		40.093.080.464	40.093.080.464	0	0%	0	0
520	Construcciones	40.093.080.464	40.093.080.464	0	0%	0	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	7.318.072.000	7.318.072.000	2.000.000.000	27%	2.000.000.000	0
500 Inversión Física		7.318.072.000	7.318.072.000	2.000.000.000	27%	2.000.000.000	0
520	Construcciones	7.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	29%	2.000.000.000	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	318.072.000	318.072.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	38.675.013.889	0
500 Inversión Física		58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	38.675.013.889	0
520	Construcciones	58.223.044.095	58.223.044.095	38.675.013.889	66%	38.675.013.889	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	79.431.098.297	79.431.098.297	33.677.561.630	42%	16.582.924.191	17.094.637.439
200 Servicios No Personales		1.960.015.936	1.960.015.936	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		73.631.082.361	73.631.082.361	33.072.937.883	45%	16.582.924.191	16.490.013.692
520	Construcciones	58.014.601.561	58.014.601.561	31.735.641.539	55%	16.582.924.191	15.152.717.348
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	15.616.480.800	15.616.480.800	1.337.296.344	9%	0	1.337.296.344
800 Transferencias		3.840.000.000	3.840.000.000	604.623.747	16%	0	604.623.747
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	604.623.747	16%	0	604.623.747
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'í - Gral. Bruguez	220.944.617.230	220.944.617.230	116.424.546.985	53%	90.299.231.573	26.125.315.412
100 Servicios Personales		288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		219.656.617.230	219.656.617.230	116.424.546.985	53%	90.299.231.573	26.125.315.412
520	Construcciones	216.808.617.230	216.808.617.230	116.424.546.985	54%	90.299.231.573	26.125.315.412
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.128.000.000	2.128.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	306.215.266.053	306.215.266.053	125.327.932.921	41%	125.327.932.921	0
100 Servicios Personales		811.000.000	811.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	64.000.000	64.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.686.000.000	1.686.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.586.000.000	1.586.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		302.758.266.053	302.758.266.053	125.327.932.921	41%	125.327.932.921	0
520	Construcciones	284.918.266.053	284.918.266.053	125.327.932.921	44%	125.327.932.921	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.840.000.000	17.840.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	334.720.195.294	334.720.195.294	34.002.112.104	10%	30.238.920.616	3.763.191.488
100 Servicios Personales		1.382.670.024	1.382.670.024	345.667.506	25%	193.045.004	152.622.502
140	Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	345.667.506	25%	193.045.004	152.622.502
200 Servicios No Personales		2.028.000.000	2.028.000.000	50.260.904	2%	50.260.904	0
230	Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	50.260.904	25%	50.260.904	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.828.000.000	1.828.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		331.309.525.270	331.309.525.270	33.606.183.694	10%	29.995.614.708	3.610.568.986
520	Construcciones	318.009.525.270	318.009.525.270	33.606.183.694	11%	29.995.614.708	3.610.568.986
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	93.866.188.718	93.866.188.718	31.853.859.643	34%	28.949.843.248	2.904.016.395
200 Servicios No Personales		33.878.000.000	33.878.000.000	113.638.443	0,34%	104.372.048	9.266.395
230	Pasajes y Viáticos	4.200.000.000	4.200.000.000	113.638.443	3%	104.372.048	9.266.395
260	Servicios Técnicos y Profesionales	29.678.000.000	29.678.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.155.588.718	22.155.588.718	10.220.750.000	46%	7.326.000.000	2.894.750.000
360	Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	2.550.000.000	25%	0	2.550.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	11.955.588.718	11.955.588.718	7.670.750.000	64%	7.326.000.000	344.750.000
500 Inversión Física		11.995.000.000	11.995.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	11.995.000.000	11.995.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		25.837.600.000	25.837.600.000	21.519.471.200	83%	21.519.471.200	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.680.000.000	4.680.000.000	361.871.200	8%	361.871.200	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	21.157.600.000	21.157.600.000	21.157.600.000	100%	21.157.600.000	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	302.663.072.641	302.663.072.641	149.647.004.690	49%	104.359.742.191	45.287.262.499
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	97.142.475	97.142.475	0	0%	0	0
500 Inversión Física		97.142.475	97.142.475	0	0%	0	0
520	Construcciones	97.142.475	97.142.475	0	0%	0	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	1.294.813.676	1.294.813.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.294.813.676	1.294.813.676	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.294.813.676	1.294.813.676	0	0%	0	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	32.653.851.755	32.653.851.755	19.571.472.550	60%	16.343.744.639	3.227.727.911
100 Servicios Personales		1.021.200.000	1.021.200.000	255.300.000	25%	170.200.000	85.100.000
140	Personal Contratado	1.021.200.000	1.021.200.000	255.300.000	25%	170.200.000	85.100.000
200 Servicios No Personales		4.680.639.061	4.680.639.061	3.838.444.774	82%	3.225.033.747	613.411.027
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.680.639.061	4.680.639.061	3.838.444.774	82%	3.225.033.747	613.411.027
500 Inversión Física		26.952.012.694	26.952.012.694	15.477.727.776	57%	12.948.510.892	2.529.216.884
520	Construcciones	26.952.012.694	26.952.012.694	15.477.727.776	57%	12.948.510.892	2.529.216.884
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.564.633.008	1.564.633.008	549.375.723	35%	543.685.100	5.690.623
200 Servicios No Personales		1.382.084.472	1.382.084.472	366.827.187	27%	361.136.564	5.690.623
230	Pasejes y Viáticos	1.380.000.000	1.380.000.000	366.827.187	27%	361.136.564	5.690.623
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.084.472	2.084.472	0	0%	0	0
500 Inversión Física		182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
520	Construcciones	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	27.910.058.206	27.910.058.206	19.745.868.136	71%	1.215.505.089
200	Servicios No Personales	2.202.863.077	2.202.863.077	1.020.339.773	46%	274.794.526
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.202.863.077	2.202.863.077	1.020.339.773	46%	274.794.526
500	Inversión Física	25.707.195.129	25.707.195.129	18.725.528.363	73%	940.710.563
520	Construcciones	25.707.195.129	25.707.195.129	18.725.528.363	73%	940.710.563
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	81.415.815.480	81.415.815.480	17.556.038.858	22%	11.843.433.696
200	Servicios No Personales	6.100.000.000	6.100.000.000	2.571.816.733	42%	383.922.546
220	Transporte y Almacenaje	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
230	Pasejes y Viáticos	5.600.000.000	5.600.000.000	2.571.816.733	46%	383.922.546
300	Bienes de Consumo e Insumos	62.995.900.000	62.995.900.000	10.478.490.133	17%	10.478.490.133
360	Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	10.478.490.133	19%	10.478.490.133
390	Otros Bienes de Consumo	6.995.900.000	6.995.900.000	0	0%	0
500	Inversión Física	12.319.915.480	12.319.915.480	4.505.731.992	37%	981.021.017
520	Construcciones	7.627.915.480	7.627.915.480	4.505.731.992	59%	981.021.017
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.692.000.000	4.692.000.000	0	0%	0
15	Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0
500	Inversión Física	48	48	0	0%	0
520	Construcciones	48	48	0	0%	0
16	Construcción Cam. Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari	236.793.677	236.793.677	0	0%	0
500	Inversión Física	236.793.677	236.793.677	0	0%	0
520	Construcciones	236.793.677	236.793.677	0	0%	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	20.293.305.955	20.293.305.955	10.411.053.456	51%	0
500	Inversión Física	20.293.305.955	20.293.305.955	10.411.053.456	51%	0
520	Construcciones	20.293.305.955	20.293.305.955	10.411.053.456	51%	0
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	13.725.740.078	13.725.740.078	9.089.226.212	66%	1.147.305.734
500	Inversión Física	13.725.740.078	13.725.740.078	9.089.226.212	66%	1.147.305.734
520	Construcciones	13.725.740.078	13.725.740.078	9.089.226.212	66%	1.147.305.734
20	Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	15.802.468.358	15.802.468.358	7.921.921.361	50%	983.882.127
500	Inversión Física	15.802.468.358	15.802.468.358	7.921.921.361	50%	983.882.127
520	Construcciones	15.802.468.358	15.802.468.358	7.921.921.361	50%	983.882.127
21	Mejoramiento Caminos Distritales de Nemby	7.604.231.355	7.604.231.355	4.396.664.950	58%	559.709.815
500	Inversión Física	7.604.231.355	7.604.231.355	4.396.664.950	58%	559.709.815
520	Construcciones	7.604.231.355	7.604.231.355	4.396.664.950	58%	559.709.815

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	9.957.084.249	9.957.084.249	5.681.588.457	57%	5.681.588.457	0
500 Inversión Física		9.957.084.249	9.957.084.249	5.681.588.457	57%	5.681.588.457	0
520 Construcciones		9.957.084.249	9.957.084.249	5.681.588.457	57%	5.681.588.457	0
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	10.641.955.951	10.641.955.951	4.947.672.627	46%	4.947.672.627	0
500 Inversión Física		10.641.955.951	10.641.955.951	4.947.672.627	46%	4.947.672.627	0
520 Construcciones		10.641.955.951	10.641.955.951	4.947.672.627	46%	4.947.672.627	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	2.580.091.266	2.580.091.266	1.099.166.236	43%	841.840.000	257.326.236
500 Inversión Física		2.580.091.266	2.580.091.266	1.099.166.236	43%	841.840.000	257.326.236
520 Construcciones		2.580.091.266	2.580.091.266	1.099.166.236	43%	841.840.000	257.326.236
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Temciapora"	33.561.929.913	33.561.929.913	18.222.271.729	54%	18.222.271.729	0
200 Servicios No Personales		170.122.412	170.122.412	0	0%	0	0
230 Pasejes y Viáticos		170.122.412	170.122.412	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.391.807.501	33.391.807.501	18.222.271.729	55%	18.222.271.729	0
520 Construcciones		33.391.807.501	33.391.807.501	18.222.271.729	55%	18.222.271.729	0
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	8.084.670.602	8.084.670.602	6.262.288.512	77%	0	6.262.288.512
500 Inversión Física		8.084.670.602	8.084.670.602	6.262.288.512	77%	0	6.262.288.512
520 Construcciones		8.084.670.602	8.084.670.602	6.262.288.512	77%	0	6.262.288.512
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	9.635.427.725	9.635.427.725	7.463.405.213	77%	0	7.463.405.213
500 Inversión Física		9.635.427.725	9.635.427.725	7.463.405.213	77%	0	7.463.405.213
520 Construcciones		9.635.427.725	9.635.427.725	7.463.405.213	77%	0	7.463.405.213
31	Mejoramiento Quyyquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	4.408.003.127	0
500 Inversión Física		5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	4.408.003.127	0
520 Construcciones		5.691.402.576	5.691.402.576	4.408.003.127	77%	4.408.003.127	0
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	15.911.656.288	15.911.656.288	12.320.987.543	77%	0	12.320.987.543
500 Inversión Física		15.911.656.288	15.911.656.288	12.320.987.543	77%	0	12.320.987.543
520 Construcciones		15.911.656.288	15.911.656.288	12.320.987.543	77%	0	12.320.987.543

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	444.271.845.132	444.271.845.132	56.027.986.056	13%	22.363.069.549
01	SP Proyecto Acueducto	1.648.487.527	1.648.487.527	8.610.160	1%	0
200	Servicios No Personales	84.000.000	84.000.000	8.610.160	10%	0
230	Pasejes y Viáticos	84.000.000	84.000.000	8.610.160	10%	0
500	Inversión Física	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0
520	Construcciones	1.564.487.527	1.564.487.527	0	0%	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	18.443.038.220	18.443.038.220	4.797.327.410	26%	3.064.324.803
100	Servicios Personales	975.312.852	975.312.852	277.500.000	28%	102.500.000
140	Personal Contratado	975.312.852	975.312.852	277.500.000	28%	102.500.000
500	Inversión Física	17.467.725.368	17.467.725.368	4.519.827.410	26%	2.961.824.803
520	Construcciones	17.467.725.368	17.467.725.368	4.519.827.410	26%	2.961.824.803
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	13.561.706.701	13.561.706.701	6.716.393.062	50%	0
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0
200	Servicios No Personales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	741.000.000	741.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	12.246.800.161	12.246.800.161	6.716.393.062	55%	0
520	Construcciones	12.246.800.161	12.246.800.161	6.716.393.062	55%	0
800	Transferencias	480.000.000	480.000.000	0	0%	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	480.000.000	480.000.000	0	0%	0
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	8.347.534.354	8.347.534.354	3.489.191.851	42%	78.399.496
100	Servicios Personales	93.906.540	93.906.540	0	0%	0
140	Personal Contratado	93.906.540	93.906.540	0	0%	0
200	Servicios No Personales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	604.500.000	604.500.000	0	0%	0
500	Inversión Física	7.259.127.814	7.259.127.814	3.489.191.851	48%	78.399.496
520	Construcciones	7.259.127.814	7.259.127.814	3.489.191.851	48%	78.399.496
800	Transferencias	390.000.000	390.000.000	0	0%	0
880	Transferencia de Capital al Sector Externo	390.000.000	390.000.000	0	0%	0
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	74.978.376.535	74.978.376.535	659.050.000	1%	273.050.000
100	Servicios Personales	1.930.899.200	1.930.899.200	94.050.000	5%	94.050.000
130	Asignaciones Complementarias	376.200.000	376.200.000	94.050.000	25%	94.050.000
140	Personal Contratado	1.554.699.200	1.554.699.200	0	0%	0
200	Servicios No Personales	6.939.269.321	6.939.269.321	565.000.000	8%	179.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.939.269.321	6.939.269.321	565.000.000	8%	179.000.000
500	Inversión Física	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0
520	Construcciones	64.808.208.014	64.808.208.014	0	0%	0
800	Transferencias	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	79.088.289.951	79.088.289.951	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		2.762.899.200	2.762.899.200	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	328.320.000	328.320.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	2.434.579.200	2.434.579.200	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.881.358.054	12.881.358.054	0	0%	0	0
500 Inversión Física		63.444.032.697	63.444.032.697	0	0%	0	0
510	Adquisición de Inmuebles	4.359.744.000	4.359.744.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	59.084.288.697	59.084.288.697	0	0%	0	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	138.696.350.340	138.696.350.340	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
500 Inversión Física		129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
520	Construcciones	129.170.569.836	129.170.569.836	0	0%	0	0
700 Servicio de la Deuda Pública		5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	26.288.560.003	26.288.560.003	11.442.329.322	44%	0	11.442.329.322
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		23.362.144.947	23.362.144.947	11.442.329.322	49%	0	11.442.329.322
520	Construcciones	23.362.144.947	23.362.144.947	11.442.329.322	49%	0	11.442.329.322
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	19.895.777.370	19.895.777.370	8.245.938.005	41%	8.245.938.005	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.969.362.314	16.969.362.314	8.245.938.005	49%	8.245.938.005	0
520	Construcciones	16.969.362.314	16.969.362.314	8.245.938.005	49%	8.245.938.005	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	20.804.890.914	20.804.890.914	8.700.494.777	42%	8.700.494.777	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		17.878.475.858	17.878.475.858	8.700.494.777	49%	8.700.494.777	0
520	Construcciones	17.878.475.858	17.878.475.858	8.700.494.777	49%	8.700.494.777	0
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	18.413.833.217	18.413.833.217	7.504.965.928	41%	0	7.504.965.928
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.487.418.161	15.487.418.161	7.504.965.928	48%	0	7.504.965.928
520 Construcciones		15.487.418.161	15.487.418.161	7.504.965.928	48%	0	7.504.965.928
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
500 Inversión Física		14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
520 Construcciones		14.100.000.000	14.100.000.000	4.463.685.541	32%	4.463.685.541	0
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		10.005.000.000	10.005.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		4.975.008.022.507	4.975.008.022.507	1.524.384.020.381	31%	1.129.563.941.099	394.820.079.282

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	72.473.014.064	72.473.014.064	17.804.741.302	25%	14.958.065.266	2.846.676.036
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	72.473.014.064	72.473.014.064	17.804.741.302	25%	14.958.065.266	2.846.676.036
800 Transferencias		72.473.014.064	72.473.014.064	17.804.741.302	25%	14.958.065.266	2.846.676.036
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	69.455.274.921	69.455.274.921	17.275.923.802	25%	14.429.247.766	2.846.676.036
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	3.017.739.143	3.017.739.143	528.817.500	18%	528.817.500	0
SUBTOTAL		72.473.014.064	72.473.014.064	17.804.741.302	25%	14.958.065.266	2.846.676.036

TOTAL ENTIDAD	7.149.250.332.687	7.149.250.332.687	1.918.249.728.315	27%	1.449.455.993.467	468.793.734.848
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 07/05/2024



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2025

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
