


# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD



**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL  
Al 31/08/2018**

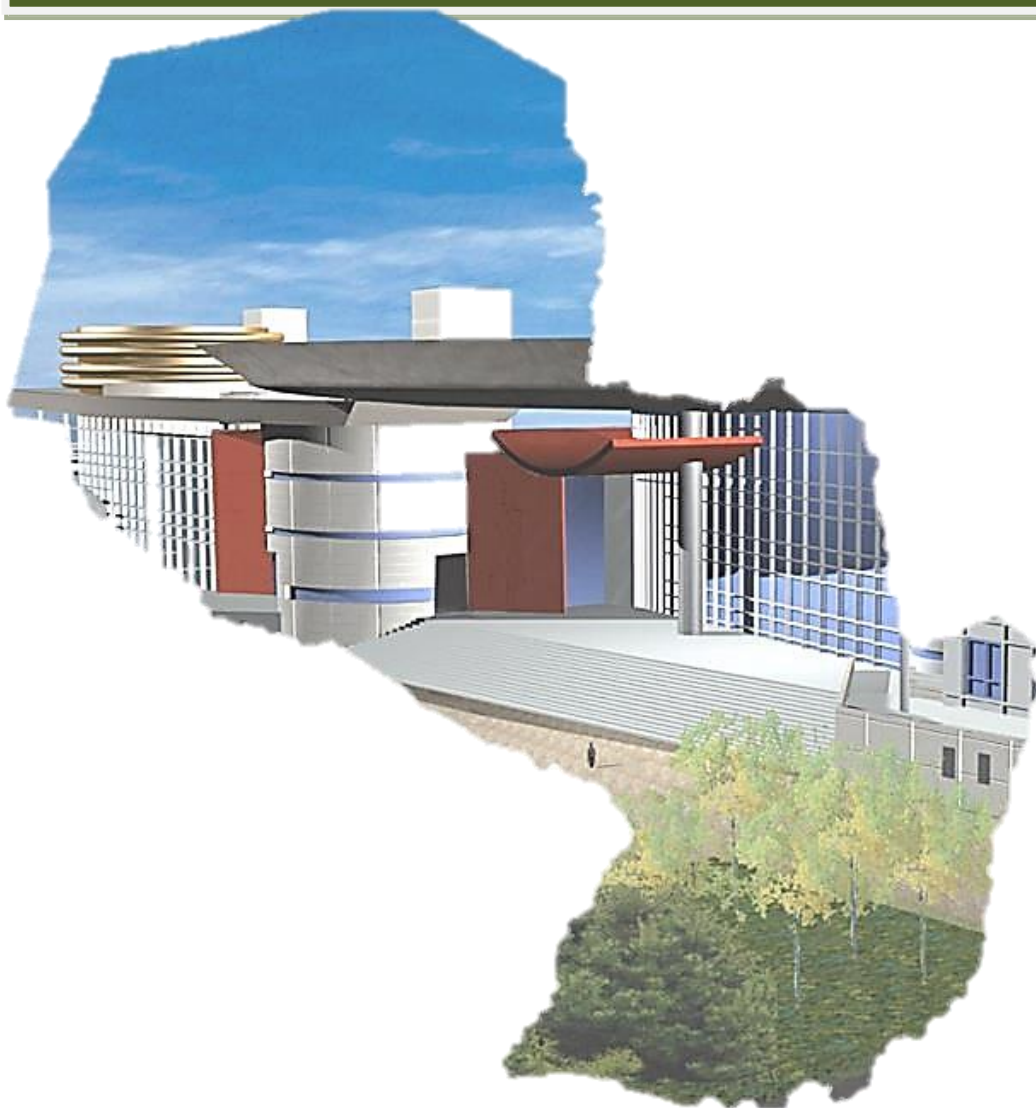

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             |                      |                   |                 |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |            |
|                                                         | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec. |
| TOTAL                                                   | 1.140.124.987.736    | 1.140.124.987.736 | 687.605.251.771 | 60%        |
| Administración General                                  | 1.140.124.987.736    | 1.140.124.987.736 | 687.605.251.771 | 60%        |
| Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 1.140.124.987.736 | 687.605.251.771 | 60%        |

| PROGRAMAS DE ACCIÓN              |                      |                   |                   |            |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |
|                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. |
| TOTAL                            | 3.360.598.594.957    | 3.360.598.594.957 | 1.190.783.691.401 | 35%        |
| Operación y Mantenimiento        | 3.360.598.594.957    | 3.360.598.594.957 | 1.190.783.691.401 | 35%        |
| Energía Facturada a los Clientes |                      | 3.360.598.594.957 | 1.190.783.691.401 | 35%        |

| PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                          |                      |                   |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |            |
|                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec. |
| TOTAL                                                           | 1.917.580.830.276    | 1.917.580.830.276 | 341.759.814.349 | 18%        |
| Competitividad e Innovación                                     | 1.917.580.830.276    | 1.917.580.830.276 | 341.759.814.349 | 18%        |
| SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF               | 133.936.805.761      | 133.936.805.761   | 35.509.266.748  | 27%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                   |                      | 133.936.805.761   | 35.509.266.748  | 27%        |
| SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución     | 29.652.180.670       | 29.652.180.670    | 7.103.381.990   | 24%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                   |                      | 29.652.180.670    | 7.103.381.990   | 24%        |
| Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes | 242.180.254.673      | 242.180.254.673   | 90.480.598.355  | 37%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                   |                      | 242.180.254.673   | 90.480.598.355  | 37%        |
| Ampliación de VAU y Construcción LT 220 KV PBO-VAU              | 28.920.187.977       | 28.920.187.977    | 8.624.210.255   | 30%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                   |                      | 28.920.187.977    | 8.624.210.255   | 30%        |
| Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO                     | 24.072.194.135       | 24.072.194.135    | 1.532.277.483   | 6%         |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                                       |                      |                 |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |            |
|                                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec. |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 24.072.194.135  | 1.532.277.483   | 6%         |
| Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco                      | 5.132.472.745        | 5.132.472.745   | 2.210.079.966   | 43%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 5.132.472.745   | 2.210.079.966   | 43%        |
| Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande                   | 8.948.773.642        | 8.948.773.642   | 1.762.175.481   | 20%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 8.948.773.642   | 1.762.175.481   | 20%        |
| SP Instalación de Medidores de Energía Electrica de Py                       | 58.463.942.809       | 58.463.942.809  | 4.162.097.995   | 7%         |
| Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                                          |                      | 58.463.942.809  | 4.162.097.995   | 7%         |
| Construcciones de Subestación Fram de 66 KV                                  | 14.404.195.275       | 14.404.195.275  | 2.400.931.333   | 17%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 14.404.195.275  | 2.400.931.333   | 17%        |
| Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor               | 8.451.542.412        | 8.451.542.412   | 0               | 0%         |
| Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                                          |                      | 8.451.542.412   | 0               | 0%         |
| Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica                    | 17.103.796.496       | 17.103.796.496  | 4.186.418.568   | 24%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 17.103.796.496  | 4.186.418.568   | 24%        |
| Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera                     | 12.784.200.782       | 12.784.200.782  | 2.372.035.457   | 19%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 12.784.200.782  | 2.372.035.457   | 19%        |
| Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Área Metropolitana | 324.918.877.575      | 324.918.877.575 | 0               | 0%         |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 324.918.877.575 | 0               | 0%         |
| Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguari y Pdte Hayes                    | 260.885.201.895      | 260.885.201.895 | 0               | 0%         |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 260.885.201.895 | 0               | 0%         |
| Mejoramiento Generación y Transmisión de E. Eléctrica en Py                  | 273.431.371.388      | 273.431.371.388 | 65.539.064.380  | 24%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 273.431.371.388 | 65.539.064.380  | 24%        |
| Mej del Sist de Distrib de Energía Eléctrica en todo el territorio           | 455.578.182.041      | 455.578.182.041 | 115.217.917.282 | 25%        |
| Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas                                |                      | 455.578.182.041 | 115.217.917.282 | 25%        |
| Equip y Mat. Para Subestaciones del Sist. Interconec. Nac                    | 18.716.650.000       | 18.716.650.000  | 659.359.056     | 4%         |
| Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                                          |                      | 18.716.650.000  | 659.359.056     | 4%         |

| PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |                      |                   |                   |            |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |
|                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. |
| TOTAL                                      | 379.741.363.043      | 379.741.363.043   | 202.370.961.382   | 53%        |
| Servicios de la Deuda Pública              | 379.741.363.043      | 379.741.363.043   | 202.370.961.382   | 53%        |
| Pago del Servicio de la Deuda Pública      |                      | 379.741.363.043   | 202.370.961.382   | 53%        |
| TOTAL                                      | 6.798.045.776.012    | 6.798.045.776.012 | 2.422.519.718.903 | 36%        |

Fecha: al 31/08/2018

0% a 34,99%  35% a 59,99%  a partir de 60 %

Ley Nº 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"  
Decreto Reglamentario Nº 8.452/18  
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"  
FUENTE MH-SIAF; STP
