



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2025


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	268.897.360.285	-661.062.349	268.236.297.936	159.378.958.464	108.857.339.472
200 Servicios No Personales	250.519.761.960	77.696.335.316	328.216.097.276	116.867.208.327	211.348.888.949
300 Bienes de Consumo e Insumos	125.784.303.975	1.051.619.283	126.835.923.258	39.698.332.525	87.137.590.733
500 Inversión Física	5.134.635.978.804	66.429.954.006	5.201.065.932.810	2.265.584.111.935	2.935.481.820.875
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	-250.000.000	918.193.079.476	791.599.472.255	126.593.607.221
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	0	6.869.325.120	0	6.869.325.120
800 Transferencias	432.290.446.175	5.611.709.081	437.902.155.256	333.698.587.925	104.203.567.331
900 Otros Gastos	3.968.673.812	9.676.252.065	13.644.925.877	11.940.706.773	1.704.219.104
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	159.554.807.402	7.300.963.737.009	3.718.767.378.204	3.582.196.358.805


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 08/10/2025

Participación Presupuestaria

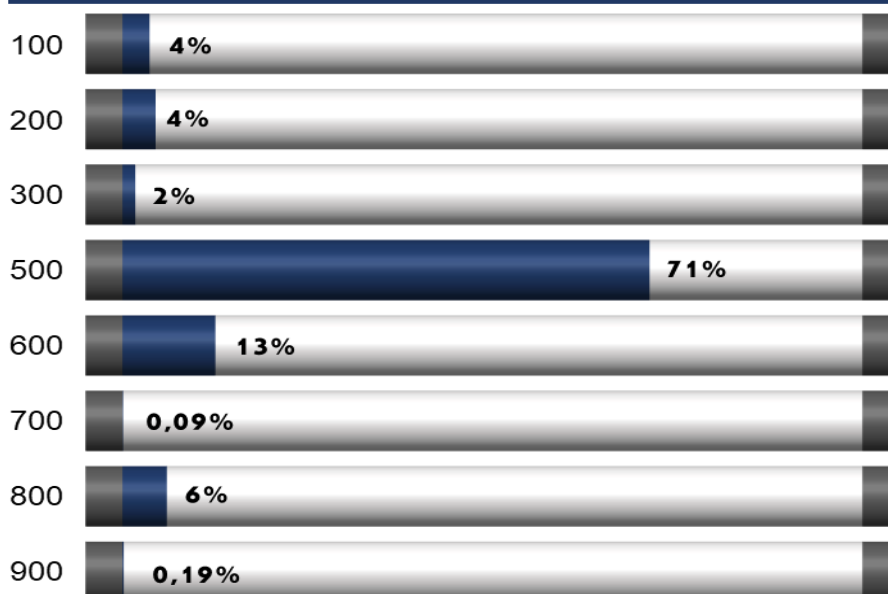


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

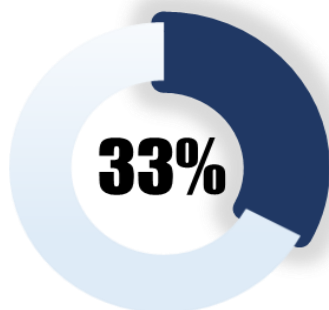


Presupuesto: ₡ 718.952.312.354
Ejecutado: ₡ 235.569.141.092

Recursos del Crédito Público

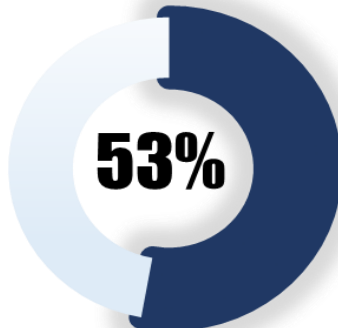

Presupuesto: ₡ 5.869.151.560.933
Ejecutado: ₡ 3.098.113.713.017

Recursos Institucionales

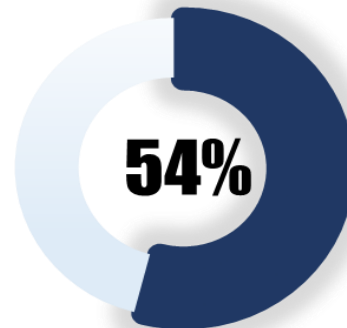

Presupuesto: ₡ 712.859.863.722
Ejecutado: ₡ 385.084.524.095

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.821.216.512.094	1.821.216.512.094	830.788.161.935	46%	718.988.153.981	111.800.007.954
01	Gestión Administrativa Financiera	399.946.609.001	399.946.609.001	187.973.390.515	47%	158.271.549.419	29.701.841.096
100	Servicios Personales	202.817.223.563	202.817.223.563	122.982.411.317	61%	102.281.707.343	20.700.703.974
110	Remuneraciones Básicas	158.309.331.895	158.309.331.895	92.377.382.694	58%	76.073.235.351	16.304.147.343
120	Remuneraciones Temporales	9.025.126.240	9.025.126.240	5.592.569.255	62%	4.796.792.649	795.776.606
130	Asignaciones Complementarias	22.020.966.374	22.020.966.374	15.614.669.245	71%	13.268.175.647	2.346.493.598
140	Personal Contratado	12.096.418.840	12.096.418.840	8.373.956.103	69%	7.419.393.518	954.562.585
190	Otros Gastos del Personal	1.365.380.214	1.365.380.214	1.023.834.020	75%	724.110.178	299.723.842
200	Servicios No Personales	113.336.742.976	113.336.742.976	49.508.578.237	44%	41.868.198.043	7.640.380.194
210	Servicios Básicos	9.318.200.000	9.318.200.000	5.759.454.012	62%	5.049.000.821	710.453.191
220	Transporte y Almacenaje	305.000.000	305.000.000	129.611.917	42%	110.761.917	18.850.000
230	Pasajes y Viáticos	6.730.169.446	6.730.169.446	3.164.930.891	47%	2.559.675.295	605.255.596
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	29.458.791.948	29.458.791.948	11.367.645.402	39%	9.219.658.625	2.147.986.777
250	Alquileres y Derechos	3.955.701.910	3.955.701.910	2.073.766.564	52%	1.647.645.898	426.120.666
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.247.120.772	16.247.120.772	4.650.683.025	29%	4.582.234.545	68.448.480
270	Servicio Social	41.351.078.900	41.351.078.900	21.144.458.724	51%	18.513.445.302	2.631.013.422
280	Otros Servicios en General	5.520.680.000	5.520.680.000	1.001.650.062	18%	8.398.000	993.252.062
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	450.000.000	450.000.000	216.377.640	48%	177.377.640	39.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	25.788.628.432	25.788.628.432	6.233.422.520	24%	6.233.422.520	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.753.502.000	1.753.502.000	698.103.456	40%	698.103.456	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.458.000.000	2.458.000.000	984.198.217	40%	984.198.217	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	112.500.000	112.500.000	9.701.000	9%	9.701.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.812.976.640	20.812.976.640	4.481.503.137	22%	4.481.503.137	0
390	Otros Bienes de Consumo	651.649.792	651.649.792	59.916.710	9%	59.916.710	0
500	Inversión Física	52.271.763.822	52.271.763.822	4.793.577.121	9%	3.439.535.053	1.354.042.068
520	Construcciones	21.486.374.358	21.486.374.358	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.756.500.000	8.756.500.000	1.210.379.168	14%	499.750.000	710.629.168
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.021.102.400	5.021.102.400	1.895.202.900	38%	1.251.790.000	643.412.900
570	Adquisición de Activos Intangibles	15.160.397.600	15.160.397.600	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.847.389.464	1.847.389.464	1.687.995.053	91%	1.687.995.053	0
800	Transferencias	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	1.059.046.787	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	1.059.046.787	0
900	Otros Gastos	4.668.250.208	4.668.250.208	3.396.354.533	73%	3.389.639.673	6.714.860
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.668.250.208	4.668.250.208	3.396.354.533	73%	3.389.639.673	6.714.860
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	302.760.000.000	302.760.000.000	261.535.118.467	86%	214.168.174.850	47.366.943.617
800	Transferencias	302.760.000.000	302.760.000.000	261.535.118.467	86%	214.168.174.850	47.366.943.617
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	302.760.000.000	302.760.000.000	261.535.118.467	86%	214.168.174.850	47.366.943.617

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	9.619.490.771	9.619.490.771	3.692.484.149	38%	3.245.587.007	446.897.142
100 Servicios Personales		5.398.298.342	5.398.298.342	3.158.512.485	59%	2.767.276.877	391.235.608
110	Remuneraciones Básicas	2.769.857.987	2.769.857.987	1.844.709.210	67%	1.630.056.920	214.652.290
120	Remuneraciones Temporales	213.568.780	213.568.780	106.185.620	50%	88.274.198	17.911.422
130	Asignaciones Complementarias	799.127.784	799.127.784	569.082.312	71%	499.190.944	69.891.368
140	Personal Contratado	1.472.743.791	1.472.743.791	616.783.774	42%	532.836.928	83.946.846
190	Otros Gastos del Personal	143.000.000	143.000.000	21.751.569	15%	16.917.887	4.833.682
200 Servicios No Personales		2.909.568.058	2.909.568.058	292.311.114	10%	249.564.850	42.746.264
230	Pasajes y Viáticos	156.383.438	156.383.438	72.360.122	46%	56.764.470	15.595.652
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	198.150.000	198.150.000	104.083.092	53%	76.932.480	27.150.612
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.515.034.620	2.515.034.620	115.867.900	5%	115.867.900	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		66.419.000	66.419.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	22.170.000	22.170.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.336.000	29.336.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	14.913.000	14.913.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		374.520.071	374.520.071	0	0%	0	0
520	Construcciones	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	120.520.000	120.520.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	44.000.071	44.000.071	0	0%	0	0
800 Transferencias		817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	228.745.280	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	228.745.280	0
900 Otros Gastos		53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	0	12.915.270
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	0	12.915.270
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	8.499.371.988	8.499.371.988	1.068.217.349	13%	1.021.071.397	47.145.952
100 Servicios Personales		1.440.871.316	1.440.871.316	695.270.629	48%	691.823.743	3.446.886
120	Remuneraciones Temporales	257.929.218	257.929.218	124.003.473	48%	124.003.473	0
130	Asignaciones Complementarias	817.379.030	817.379.030	437.539.416	54%	437.539.416	0
140	Personal Contratado	202.712.068	202.712.068	109.152.652	54%	109.152.652	0
190	Otros Gastos del Personal	162.851.000	162.851.000	24.575.088	15%	21.128.202	3.446.886
200 Servicios No Personales		2.874.410.300	2.874.410.300	372.946.720	13%	329.247.654	43.699.066
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	171.156.095	17%	127.457.029	43.699.066
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	141.100.000	15%	141.100.000	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	60.690.625	40%	60.690.625	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	561.410.300	561.410.300	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		213.690.372	213.690.372	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.550.000.000	1.550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.570.000.000	1.570.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.400.000	30.400.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
05 Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	57.416.988.834	57.416.988.834	27.585.561.084	48%	21.073.521.004	6.512.040.080
100 Servicios Personales	39.284.005.786	39.284.005.786	25.411.704.326	65%	19.436.273.540	5.975.430.786
110 Remuneraciones Básicas	34.466.421.613	34.466.421.613	22.114.517.787	64%	16.603.183.661	5.511.334.126
120 Remuneraciones Temporales	444.147.946	444.147.946	235.564.525	53%	204.750.362	30.814.163
130 Asignaciones Complementarias	3.034.973.470	3.034.973.470	2.094.178.873	69%	1.860.659.508	233.519.365
140 Personal Contratado	1.099.648.579	1.099.648.579	747.022.506	68%	662.420.092	84.602.414
190 Otros Gastos del Personal	238.814.178	238.814.178	220.420.635	92%	105.259.917	115.160.718
200 Servicios No Personales	6.870.501.951	6.870.501.951	838.216.798	12%	556.207.504	282.009.294
230 Pasajes y Viáticos	891.975.228	891.975.228	305.682.208	34%	49.077.914	256.604.294
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.066.517.198	4.066.517.198	461.000.000	11%	461.000.000	0
250 Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	35.140.590	23%	35.140.590	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.727.009.525	1.727.009.525	36.394.000	2%	10.989.000	25.405.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.123.319.001	3.123.319.001	339.051.864	11%	339.051.864	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	220.000.000	220.000.000	39.350.000	18%	39.350.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.319.001	3.319.001	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	2.900.000.000	2.900.000.000	299.701.864	10%	299.701.864	0
500 Inversión Física	8.009.714.284	8.009.714.284	964.314.284	12%	709.714.284	254.600.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.509.714.284	6.509.714.284	709.714.284	11%	709.714.284	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.500.000.000	1.500.000.000	254.600.000	17%	0	254.600.000
800 Transferencias	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
06 Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.235.225.721	2.235.225.721	927.820.911	42%	826.107.217	101.713.694
100 Servicios Personales	1.065.876.721	1.065.876.721	606.111.166	57%	547.103.103	59.008.063
120 Remuneraciones Temporales	279.247.109	279.247.109	132.456.778	47%	115.730.136	16.726.642
130 Asignaciones Complementarias	592.125.590	592.125.590	387.354.701	65%	348.711.082	38.643.619
140 Personal Contratado	48.504.022	48.504.022	27.878.155	57%	24.240.353	3.637.802
190 Otros Gastos del Personal	146.000.000	146.000.000	58.421.532	40%	58.421.532	0
200 Servicios No Personales	619.349.000	619.349.000	321.709.745	52%	279.004.114	42.705.631
230 Pasajes y Viáticos	619.349.000	619.349.000	321.709.745	52%	279.004.114	42.705.631
500 Inversión Física	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.570.000.000	1.570.000.000	206.710.532	13%	206.710.532	0
200	Servicios No Personales	291.000.000	291.000.000	108.882.532	37%	108.882.532	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	231.000.000	231.000.000	108.882.532	47%	108.882.532	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	229.000.000	229.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.000.000	129.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.050.000.000	1.050.000.000	97.828.000	9%	97.828.000	0
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	97.828.000	22%	97.828.000	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.002.165.728	2.002.165.728	516.130.215	26%	416.355.161	99.775.054
200	Servicios No Personales	2.002.165.728	2.002.165.728	516.130.215	26%	416.355.161	99.775.054
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	140.413.669	72%	104.380.151	36.033.518
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.248.815.728	1.248.815.728	204.116.546	16%	140.375.010	63.741.536
250	Alquileres y Derechos	557.700.000	557.700.000	171.600.000	31%	171.600.000	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	99.982.860.000	99.982.860.000	1.255.607.951	1%	1.255.607.951	0
200	Servicios No Personales	248.043.353	248.043.353	146.108.401	59%	146.108.401	0
230	Pasajes y Viáticos	137.643.353	137.643.353	132.458.401	96%	132.458.401	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	13.650.000	12%	13.650.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	774.816.647	774.816.647	649.499.550	84%	649.499.550	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	124.816.647	124.816.647	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	649.499.550	99%	649.499.550	0
500	Inversión Física	98.000.000.000	98.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	86.000.000.000	86.000.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	960.000.000	960.000.000	460.000.000	48%	460.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100%	460.000.000	0
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	5.397.420.406	5.397.420.406	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.047.500.406	5.047.500.406	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.047.500.406	5.047.500.406	0	0%	0	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.421.642.853	2.421.642.853	1.435.988.440	59%	1.435.988.440	0
100	Servicios Personales	13.721.400	13.721.400	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	13.721.400	13.721.400	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.047.254.411	2.047.254.411	1.435.988.440	70%	1.435.988.440	0
520	Construcciones	1.600.000.000	1.600.000.000	1.435.988.440	90%	1.435.988.440	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	447.254.411	447.254.411	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
16 Restauración de Edificios Patrimoniales	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
500 Inversión Física	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
520 Construcciones	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
20 Construcción del CIRS de Emboscada	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
21 SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	3.958.402.780	57%	3.958.402.780	0
500 Inversión Física	6.944.538.090	6.944.538.090	3.958.402.780	57%	3.958.402.780	0
520 Construcciones	6.944.538.090	6.944.538.090	3.958.402.780	57%	3.958.402.780	0
23 Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
24 Construcción de la Franja Costera Sur	11.159.586.220	11.159.586.220	2.118.466.367	19%	2.118.466.367	0
200 Servicios No Personales	1.974.046.167	1.974.046.167	1.740.401.270	88%	1.740.401.270	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.046.167	1.974.046.167	1.740.401.270	88%	1.740.401.270	0
500 Inversión Física	9.160.329.388	9.160.329.388	378.065.097	4%	378.065.097	0
520 Construcciones	7.950.156.371	7.950.156.371	378.065.097	5%	378.065.097	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.210.173.017	1.210.173.017	0	0%	0	0
800 Transferencias	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
26 Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	296.483.705	296.483.705	0	0%	0	0
500 Inversión Física	296.483.705	296.483.705	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	296.483.705	296.483.705	0	0%	0	0
27 Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	7.932.975.911	7.932.975.911	3.160.375.651	40%	2.067.968.856	1.092.406.795
500 Inversión Física	7.928.292.511	7.928.292.511	3.160.375.651	40%	2.067.968.856	1.092.406.795
520 Construcciones	5.422.465.400	5.422.465.400	2.779.190.899	51%	2.067.968.856	711.222.043
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.505.827.111	2.505.827.111	381.184.752	15%	0	381.184.752
800 Transferencias	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
28 Mejoramiento Intersección Tres Bocas	1.246.703.526	1.246.703.526	0	0%	0	0
500 Inversión Física	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
520 Construcciones	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
800 Transferencias	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
29 Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	255.381.608.252	255.381.608.252	117.941.652.408	46%	113.410.502.747	4.531.149.661
500 Inversión Física	255.273.159.666	255.273.159.666	117.941.652.408	46%	113.410.502.747	4.531.149.661
510 Adquisición de Inmuebles	848.128.304	848.128.304	0	0%	0	0
520 Construcciones	250.829.211.870	250.829.211.870	116.700.080.226	47%	112.168.930.565	4.531.149.661
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.595.819.492	1.595.819.492	1.241.572.182	78%	1.241.572.182	0
800 Transferencias	108.448.586	108.448.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	108.448.586	108.448.586	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	119.998.476.517	119.998.476.517	61.850.445.543	52%	61.850.445.543
500	Inversión Física	119.998.476.517	119.998.476.517	61.850.445.543	52%	61.850.445.543
520	Construcciones	119.998.476.517	119.998.476.517	61.850.445.543	52%	61.850.445.543
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	846.259.058	846.259.058	0	0%	0
500	Inversión Física	846.259.058	846.259.058	0	0%	0
520	Construcciones	846.259.058	846.259.058	0	0%	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	115.855.876.518	115.855.876.518	25.819.562.727	22%	22.125.699.194
100	Servicios Personales	3.974.156.000	3.974.156.000	2.050.028.000	52%	1.631.428.000
140	Personal Contratado	3.974.156.000	3.974.156.000	2.050.028.000	52%	1.631.428.000
200	Servicios No Personales	7.367.154.073	7.367.154.073	2.412.469.682	33%	2.330.869.682
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.367.154.073	7.367.154.073	2.412.469.682	33%	2.330.869.682
500	Inversión Física	104.120.966.445	104.120.966.445	20.963.465.045	20%	17.769.801.512
520	Construcciones	104.120.966.445	104.120.966.445	20.963.465.045	20%	17.769.801.512
800	Transferencias	393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	393.600.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	393.600.000
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	20.801.221.661	20.801.221.661	18.793.195.038	90%	16.003.636.063
200	Servicios No Personales	9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	2.798.302
230	Pasajes y Viáticos	9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	2.798.302
500	Inversión Física	20.791.534.711	20.791.534.711	18.790.396.736	90%	16.000.837.761
520	Construcciones	20.791.534.711	20.791.534.711	18.790.396.736	90%	16.000.837.761
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	48.210.840.709	48.210.840.709	35.858.257.165	74%	27.622.220.415
200	Servicios No Personales	1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	1.313.050
230	Pasajes y Viáticos	1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	1.313.050
500	Inversión Física	48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	27.620.907.365
520	Construcciones	48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	27.620.907.365
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	43.561.352.768	43.561.352.768	16.351.524.499	38%	15.218.621.280
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	4.459.705.728	4.459.705.728	1.843.283.334	41%	1.687.783.334
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.459.705.728	4.459.705.728	1.843.283.334	41%	1.687.783.334
500	Inversión Física	37.741.882.240	37.741.882.240	14.508.241.165	38%	13.530.837.946
520	Construcciones	37.335.538.240	37.335.538.240	14.508.241.165	39%	13.530.837.946
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	6.344.000	6.344.000	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0	0
49 Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	9.473.302.997	9.473.302.997	39.000.000	0,41%	15.000.000	24.000.000
200 Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	39.000.000	3%	15.000.000	24.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	39.000.000	3%	15.000.000	24.000.000
500 Inversión Física	7.973.302.997	7.973.302.997	0	0%	0	0
520 Construcciones	7.141.302.997	7.141.302.997	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	432.000.000	432.000.000	0	0%	0	0
50 Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	11.172.663.862	11.172.663.862	15.000.000	0,13%	0	15.000.000
200 Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	15.000.000	1%	0	15.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	15.000.000	1%	0	15.000.000
500 Inversión Física	9.672.663.862	9.672.663.862	0	0%	0	0
520 Construcciones	9.292.663.862	9.292.663.862	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
51 Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	52.659.555.745	5.995.774.096
500 Inversión Física	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	52.659.555.745	5.995.774.096
520 Construcciones	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	52.659.555.745	5.995.774.096
52 Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
500 Inversión Física	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
520 Construcciones	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
54 Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	3.050.000.000	3.050.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
55 SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
56 Construcción Gran Hospital General	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	14.991.293.407	14.991.293.407	29.920.303	0,20%	16.962.013	12.958.290
200 Servicios No Personales		3.289.043.407	3.289.043.407	29.920.303	1%	16.962.013	12.958.290
230	Pasajes y Viáticos	340.175.000	340.175.000	29.920.303	9%	16.962.013	12.958.290
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.948.868.407	2.948.868.407	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.702.250.000	11.702.250.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	11.307.250.000	11.307.250.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	395.000.000	395.000.000	0	0%	0	0
58	Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón	13.050.176.080	13.050.176.080	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		9.477.279.527	9.477.279.527	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	51.984.231	51.984.231	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	9.425.295.296	9.425.295.296	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.886.704.617	2.886.704.617	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.530.664.617	2.530.664.617	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	118.680.000	118.680.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	237.360.000	237.360.000	0	0%	0	0
59	Mantenimiento y Conservación de Rutas	18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
60	Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes	50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
62	Ampliación de la Defensa Costera de Concepción	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
63	Ampliación de la Defensa Costera Villa Hayes	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.821.216.512.094	1.821.216.512.094	830.788.161.935	46%	718.988.153.981	111.800.007.954

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.421.207.884.240	4.421.207.884.240	2.497.455.476.676	56%	2.341.562.136.851	155.893.339.825
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	2.487.546.155	2.487.546.155	44.698.338	2%	0	44.698.338
200 Servicios No Personales		425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.062.546.155	2.062.546.155	44.698.338	2%	0	44.698.338
520	Construcciones	2.016.718.376	2.016.718.376	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	45.827.779	45.827.779	44.698.338	98%	0	44.698.338

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	70.858.587.497	70.858.587.497	41.636.048.515	59%	25.995.345.521
200 Servicios No Personales		516.273.149	516.273.149	59.300.003	11%	47.999.168
230	Pasajes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	59.300.003	16%	47.999.168
260	Servicios Técnicos y Profesionales	156.273.149	156.273.149	0	0%	0
500 Inversión Física		61.602.314.348	61.602.314.348	33.351.894.551	54%	25.930.886.353
520	Construcciones	60.907.314.348	60.907.314.348	33.261.499.229	55%	25.904.889.177
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	695.000.000	695.000.000	90.395.322	13%	25.997.176
800 Transferencias		140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
900 Otros Gastos		8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	158.970.057.464	158.970.057.464	55.172.915.451	35%	47.042.447.648
200 Servicios No Personales		1.837.137.998	1.837.137.998	46.200.000	3%	46.200.000
230	Pasajes y Viáticos	17.499.999	17.499.999	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.819.637.999	1.819.637.999	46.200.000	3%	46.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.000.000	2.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes De Consumo	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		157.021.719.466	157.021.719.466	55.122.062.268	35%	46.992.887.714
520	Construcciones	154.183.015.700	154.183.015.700	54.929.827.604	36%	46.992.887.714
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	982.800.000	982.800.000	192.234.664	20%	0
800 Transferencias		109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	3.359.934
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	3.359.934
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	102.250.051.965	102.250.051.965	51.895.961.458	51%	47.001.624.688
200 Servicios No Personales		300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	35.912.038
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	35.912.038
500 Inversión Física		101.950.051.965	101.950.051.965	51.851.977.395	51%	46.965.712.650
520	Construcciones	100.848.567.178	100.848.567.178	51.851.977.395	51%	46.965.712.650
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.101.484.787	1.101.484.787	0	0%	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	27.294.963.139	27.294.963.139	18.862.365.158	69%	18.616.896.283
200 Servicios No Personales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750
500 Inversión Física		23.958.089.119	23.958.089.119	18.311.128.211	76%	18.065.659.336
520	Construcciones	18.922.176.905	18.922.176.905	13.275.215.997	70%	13.029.747.122
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.035.912.214	5.035.912.214	5.035.912.214	100%	5.035.912.214
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	35.760.042.099	35.760.042.099	4.428.162.351	12%	3.645.490.900
200 Servicios No Personales		4.554.551.631	4.554.551.631	6.851.631	0%	6.851.631
230	Pasajes y Viáticos	6.851.631	6.851.631	6.851.631	100%	6.851.631
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.547.700.000	4.547.700.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	31.205.490.468	31.205.490.468	4.421.310.720	14%	3.638.639.269	782.671.451
520 Construcciones	28.969.286.318	28.969.286.318	2.632.682.830	9%	2.632.682.830	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.236.204.150	2.236.204.150	1.788.627.890	80%	1.005.956.439	782.671.451
12 Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	58.686.750.963	58.686.750.963	13.710.340.466	23%	12.275.439.027	1.434.901.439
200 Servicios No Personales	2.382.731.672	2.382.731.672	481.829.647	20%	481.829.647	0
230 Pasajes y Viáticos	100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.281.931.672	2.281.931.672	481.829.647	21%	481.829.647	0
500 Inversión Física	56.304.019.291	56.304.019.291	13.228.510.819	23%	11.793.609.380	1.434.901.439
520 Construcciones	56.304.019.291	56.304.019.291	13.228.510.819	23%	11.793.609.380	1.434.901.439
13 Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	12.690.377.665	12.690.377.665	6.687.923.899	53%	4.895.996.600	1.791.927.299
200 Servicios No Personales	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	0	1.076.270
230 Pasajes y Viáticos	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	0	1.076.270
500 Inversión Física	12.647.229.296	12.647.229.296	6.686.847.629	53%	4.895.996.600	1.790.851.029
520 Construcciones	11.737.622.474	11.737.622.474	6.686.847.629	57%	4.895.996.600	1.790.851.029
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	909.606.822	909.606.822	0	0%	0	0
14 Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.417.632.505	204.541.638
500 Inversión Física	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.417.632.505	204.541.638
520 Construcciones	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.417.632.505	204.541.638
15 Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	97.532.637.240	97.532.637.240	51.585.795.252	53%	51.456.799.756	128.995.496
100 Servicios Personales	162.000.000	162.000.000	105.600.000	65%	92.400.000	13.200.000
140 Personal Contratado	162.000.000	162.000.000	105.600.000	65%	92.400.000	13.200.000
200 Servicios No Personales	3.055.000.000	3.055.000.000	5.381.350	0,18%	5.381.350	0
230 Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	5.381.350	9%	5.381.350	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.995.000.000	2.995.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	94.315.637.240	94.315.637.240	51.474.813.902	55%	51.359.018.406	115.795.496
520 Construcciones	94.315.637.240	94.315.637.240	51.474.813.902	55%	51.359.018.406	115.795.496
16 Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	103.455.146.971	103.455.146.971	49.417.012.943	48%	41.876.883.259	7.540.129.684
100 Servicios Personales	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.151.833.000	2.151.833.000	850.857.963	40%	727.857.963	123.000.000
230 Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	3.357.963	3%	3.357.963	0
260 Servicios Técnicos Y Profesionales	2.030.000.000	2.030.000.000	847.500.000	42%	724.500.000	123.000.000
290 Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	1.833.000	1.833.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	101.203.313.975	101.203.313.975	48.566.154.980	48%	41.149.025.296	7.417.129.684
520 Construcciones	91.731.676.375	91.731.676.375	48.566.154.980	53%	41.149.025.296	7.417.129.684
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.471.637.600	9.471.637.600	0	0%	0	0
17 Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	12.744.005.486	12.744.005.486	2.284.713.636	18%	1.634.345.202	650.368.434
200 Servicios No Personales	4.216.000.000	4.216.000.000	2.284.713.636	54%	1.634.345.202	650.368.434
230 Pasajes y Viáticos	4.216.000.000	4.216.000.000	2.284.713.636	54%	1.634.345.202	650.368.434
300 Bienes de Consumo e Insumos	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
500 Inversión Física		19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
520	Construcciones	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	1.988.781.162	842.264.150
500 Inversión Física		2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	1.988.781.162	842.264.150
520	Construcciones	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	1.988.781.162	842.264.150
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
500 Inversión Física		948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
520	Construcciones	948.001.517	948.001.517	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
520	Construcciones	545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.056.223.299	2.056.223.299	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
500 Inversión Física		719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
520	Construcciones	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
500 Inversión Física		1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	955.344.736.776	955.344.736.776	794.853.002.667	83%	793.266.230.954	1.586.771.713
500 Inversión Física		35.377.157.300	35.377.157.300	2.741.335.591	8%	1.154.563.878	1.586.771.713
520	Construcciones	26.407.157.300	26.407.157.300	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.970.000.000	8.970.000.000	2.741.335.591	31%	1.154.563.878	1.586.771.713
600 Inversión Financiera		918.193.079.476	918.193.079.476	791.599.472.255	86%	791.599.472.255	0
630	Préstamos al Sector Privado	918.193.079.476	918.193.079.476	791.599.472.255	86%	791.599.472.255	0
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	7.053.969.600	7.053.969.600	2.176.837.219	31%	1.480.992.145	695.845.074
500 Inversión Física		6.042.988.546	6.042.988.546	1.871.623.844	31%	1.175.778.770	695.845.074
520	Construcciones	1.220.702.129	1.220.702.129	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.822.286.417	4.822.286.417	1.871.623.844	39%	1.175.778.770	695.845.074
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
510	Adquisiciones de Inmuebles	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	18.448.889.009	18.448.889.009	16.960.368.131	92%	16.814.598.962
200 Servicios No Personales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		72.441.600	72.441.600	0	0%	0
500 Inversión Física		18.376.447.409	18.376.447.409	16.960.368.131	92%	16.814.598.962
520 Construcciones		17.871.901.824	17.871.901.824	16.708.095.339	93%	16.562.326.170
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		504.545.585	504.545.585	252.272.792	50%	252.272.792
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	26.884.117.148	26.884.117.148	6.993.495.764	26%	6.256.930.942
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0
140 Personal Contratado		576.000.000	576.000.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0
500 Inversión Física		24.661.701.510	24.661.701.510	6.993.495.764	28%	6.256.930.942
520 Construcciones		23.681.701.510	23.681.701.510	6.993.495.764	30%	6.256.930.942
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		980.000.000	980.000.000	0	0%	0
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	170.738.560.872	170.738.560.872	95.231.739.159	56%	88.212.718.460
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	2.728.418.498	31%	2.728.418.498
230 Pasajes y Viáticos		24.999.998	24.999.998	0	0%	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.659.640.000	8.659.640.000	2.728.418.498	32%	2.728.418.498
500 Inversión Física		162.053.920.874	162.053.920.874	92.503.320.661	57%	85.484.299.962
520 Construcciones		162.053.920.874	162.053.920.874	92.503.320.661	57%	85.484.299.962
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	341.170.639.028	341.170.639.028	179.060.581.058	52%	177.496.145.260
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	414.889.192	85%	363.028.043
140 Personal Contratado		489.600.000	489.600.000	414.889.192	85%	363.028.043
200 Servicios No Personales		17.589.431.119	17.589.431.119	8.260.619.642	47%	8.260.619.642
230 Pasajes y Viáticos		300.000.000	300.000.000	0	0%	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		17.289.431.119	17.289.431.119	8.260.619.642	48%	8.260.619.642
500 Inversión Física		323.091.607.909	323.091.607.909	170.385.072.224	53%	168.872.497.575
520 Construcciones		315.891.607.909	315.891.607.909	170.385.072.224	54%	168.872.497.575
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	214.855.387.433	214.855.387.433	151.871.031.054	71%	129.684.881.604
100 Servicios Personales		800.800.000	800.800.000	492.800.000	62%	315.600.000
140 Personal Contratado		800.800.000	800.800.000	492.800.000	62%	315.600.000
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	51.388.800	5%	44.931.180
220 Transporte y Almacenaje		157.342.500	157.342.500	0	0%	0
230 Pasajes y Viáticos		462.156.768	462.156.768	51.388.800	11%	44.931.180
260 Servicios Técnicos y Profesionales		475.524.000	475.524.000	0	0%	0
500 Inversión Física		212.959.564.165	212.959.564.165	151.326.842.254	71%	129.324.350.424
520 Construcciones		212.959.564.165	212.959.564.165	151.326.842.254	71%	129.324.350.424
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
500 Inversión Física		1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
520 Construcciones		1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	2.318.985.958	2.318.985.958	0	0%	0
500 Inversión Física		2.318.985.958	2.318.985.958	0	0%	0
520 Construcciones		2.318.985.958	2.318.985.958	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
500	Inversión Física	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
520	Construcciones	842.174.015	842.174.015	0	0%	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
500	Inversión Física	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
520	Construcciones	472.648.166	472.648.166	0	0%	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
500	Inversión Física	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
520	Construcciones	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	284.746.882.939	284.746.882.939	134.406.193.714	47%	119.025.871.008
200	Servicios No Personales	3.295.405.000	3.295.405.000	60.500.000	2%	9.528.750
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.282.905.000	3.282.905.000	60.500.000	2%	9.528.750
500	Inversión Física	275.571.477.939	275.571.477.939	130.134.287.273	47%	114.847.262.717
520	Construcciones	247.379.477.939	247.379.477.939	113.182.812.384	46%	100.557.472.931
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	28.192.000.000	28.192.000.000	16.951.474.889	60%	14.289.789.786
800	Transferencias	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.169.079.541
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.169.079.541
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	25.317.411.970	25.317.411.970	9.644.795.856	38%	9.498.358.965
200	Servicios No Personales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	24.499.411.970	24.499.411.970	9.415.231.183	38%	9.268.794.292
520	Construcciones	23.214.300.000	23.214.300.000	8.505.676.490	37%	8.505.676.490
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.285.111.970	1.285.111.970	909.554.693	71%	763.117.802
800	Transferencias	718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	229.564.673
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	229.564.673

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	75.406.634.558	75.406.634.558	38.148.694.629	51%	36.956.726.052	1.191.968.577
200 Servicios No Personales		864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		74.542.634.558	74.542.634.558	38.148.694.629	51%	36.956.726.052	1.191.968.577
520	Construcciones	70.030.634.558	70.030.634.558	38.148.694.629	54%	36.956.726.052	1.191.968.577
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	86.018.420.703	86.018.420.703	55.310.992.349	64%	48.021.571.071	7.289.421.278
200 Servicios No Personales		2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0	0
500 Inversión Física		84.004.111.888	84.004.111.888	55.310.992.349	66%	48.021.571.071	7.289.421.278
520	Construcciones	80.088.111.888	80.088.111.888	55.310.992.349	69%	48.021.571.071	7.289.421.278
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.764.000.000	2.764.000.000	0	0%	0	0
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	23.453.989.550	23.453.989.550	0	0%	0	0
500 Inversión Física		23.453.989.550	23.453.989.550	0	0%	0	0
520	Construcciones	23.453.989.550	23.453.989.550	0	0%	0	0
84	Construcción y Mejoramiento Zona Franca Concepción	36.332.635.946	36.332.635.946	0	0%	0	0
500 Inversión Física		36.332.635.946	36.332.635.946	0	0%	0	0
520	Construcciones	36.332.635.946	36.332.635.946	0	0%	0	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	19.318.072.000	19.318.072.000	7.000.000.000	36%	7.000.000.000	0
500 Inversión Física		19.318.072.000	19.318.072.000	7.000.000.000	36%	7.000.000.000	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	7.000.000.000	37%	7.000.000.000	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	318.072.000	318.072.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	53.632.489.623	0
500 Inversión Física		68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	53.632.489.623	0
520	Construcciones	68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	53.632.489.623	0
89	SP AP. Pre Prog. de Mod. del Sec. Tra. Py ATN/OC-11921-PR	351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	133.728.073.297	133.728.073.297	65.295.383.626	49%	54.481.554.664	10.813.828.962
200 Servicios No Personales		1.960.015.936	1.960.015.936	289.974.334	15%	289.974.334	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	289.974.334	15%	289.974.334	0
500 Inversión Física		127.928.057.361	127.928.057.361	64.360.065.085	50%	53.612.405.674	10.747.659.411
520	Construcciones	117.311.576.561	117.311.576.561	60.761.231.161	52%	53.153.351.593	7.607.879.568
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	10.616.480.800	10.616.480.800	3.598.833.924	34%	459.054.081	3.139.779.843

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	579.174.656	66.169.551
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	579.174.656	66.169.551
93 Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	370.944.617.230	370.944.617.230	219.251.438.011	59%	219.251.438.011	0
100 Servicios Personales	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	369.656.617.230	369.656.617.230	219.251.438.011	59%	219.251.438.011	0
520 Construcciones	366.808.617.230	366.808.617.230	219.251.438.011	60%	219.251.438.011	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.128.000.000	2.128.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94 Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	305.915.266.053	305.915.266.053	148.797.072.611	49%	144.018.650.364	4.778.422.247
100 Servicios Personales	811.000.000	811.000.000	365.000.000	45%	303.000.000	62.000.000
140 Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	301.000.000	40%	239.000.000	62.000.000
190 Otros Gastos del Personal	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100%	64.000.000	0
200 Servicios No Personales	1.386.000.000	1.386.000.000	57.601.969	4%	33.407.419	24.194.550
230 Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	57.601.969	23%	33.407.419	24.194.550
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.136.000.000	1.136.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	302.758.266.053	302.758.266.053	148.374.470.642	49%	143.682.242.945	4.692.227.697
520 Construcciones	284.918.266.053	284.918.266.053	148.374.470.642	52%	143.682.242.945	4.692.227.697
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.840.000.000	17.840.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95 Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	314.270.195.294	314.270.195.294	113.945.405.524	36%	89.626.105.364	24.319.300.160
100 Servicios Personales	1.382.670.024	1.382.670.024	921.780.016	67%	806.557.514	115.222.502
140 Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	921.780.016	67%	806.557.514	115.222.502
200 Servicios No Personales	1.578.000.000	1.578.000.000	199.899.806	13%	181.431.013	18.468.793
230 Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	123.059.806	62%	104.591.013	18.468.793
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.378.000.000	1.378.000.000	76.840.000	6%	76.840.000	0
500 Inversión Física	311.309.525.270	311.309.525.270	112.823.725.702	36%	88.638.116.837	24.185.608.865
520 Construcciones	298.009.525.270	298.009.525.270	112.823.725.702	38%	88.638.116.837	24.185.608.865
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0
98 Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	17.000.000.000	17.000.000.000	10.685.611.531	63%	0	10.685.611.531
500 Inversión Física	17.000.000.000	17.000.000.000	10.685.611.531	63%	0	10.685.611.531
520 Construcciones	17.000.000.000	17.000.000.000	10.685.611.531	63%	0	10.685.611.531
99 Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	127.525.678.082	127.525.678.082	71.807.119.947	56%	66.844.174.234	4.962.945.713
200 Servicios No Personales	33.678.000.000	33.678.000.000	22.286.730.526	66%	22.193.063.036	93.667.490
230 Pasajes y Viáticos	4.000.000.000	4.000.000.000	430.815.212	11%	337.147.722	93.667.490
260 Servicios Técnicos y Profesionales	29.678.000.000	29.678.000.000	21.855.915.314	74%	21.855.915.314	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	18.897.843.471	18.897.843.471	10.529.100.000	56%	10.529.100.000	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	2.858.350.000	28%	2.858.350.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	8.597.843.471	8.597.843.471	7.670.750.000	89%	7.670.750.000	0
500 Inversión Física	34.087.760.851	34.087.760.851	14.961.462.221	44%	11.901.539.998	3.059.922.223
520 Construcciones	34.087.760.851	34.087.760.851	14.961.462.221	44%	11.901.539.998	3.059.922.223
800 Transferencias	40.862.073.760	40.862.073.760	24.029.827.200	59%	22.220.471.200	1.809.356.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.580.000.000	11.580.000.000	2.171.227.200	19%	361.871.200	1.809.356.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	29.282.073.760	29.282.073.760	21.858.600.000	75%	21.858.600.000	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	598.943.072.641	598.943.072.641	277.369.176.904	46%	258.021.984.155	19.347.192.749
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
500	Inversión Física	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
520	Construcciones	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
500	Inversión Física	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
520	Construcciones	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	3.544.362.494	3.544.362.494	2.392.175.638	67%	2.392.175.638	0
200	Servicios No Personales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
500	Inversión Física	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
520	Construcciones	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	43.359.489.261	43.359.489.261	27.961.204.267	64%	26.165.312.250	1.795.892.017
100	Servicios Personales	2.583.170.000	2.583.170.000	1.322.068.000	51%	888.482.001	433.585.999
140	Personal Contratado	2.583.170.000	2.583.170.000	1.322.068.000	51%	888.482.001	433.585.999
200	Servicios No Personales	6.528.421.040	6.528.421.040	5.612.302.469	86%	5.442.566.304	169.736.165
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.528.421.040	6.528.421.040	5.612.302.469	86%	5.442.566.304	169.736.165
500	Inversión Física	34.247.898.221	34.247.898.221	21.026.833.798	61%	19.834.263.945	1.192.569.853
520	Construcciones	33.141.857.122	33.141.857.122	19.920.792.701	60%	18.728.222.848	1.192.569.853
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.106.041.099	1.106.041.099	1.106.041.097	100%	1.106.041.097	0
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.546.133.008	1.546.133.008	1.513.866.322	98%	1.153.650.360	360.215.962
200	Servicios No Personales	1.363.584.472	1.363.584.472	1.331.317.786	98%	971.101.824	360.215.962
230	Pasejes y Viáticos	1.361.500.000	1.361.500.000	1.331.317.786	98%	971.101.824	360.215.962
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.084.472	2.084.472	0	0%	0	0
500	Inversión Física	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
520	Construcciones	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	87.260.460.469	87.260.460.469	59.517.253.204	68%	49.611.929.352	9.905.323.852
200	Servicios No Personales	5.753.613.077	5.753.613.077	2.029.581.359	35%	2.029.581.359	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.753.613.077	5.753.613.077	2.029.581.359	35%	2.029.581.359	0
500	Inversión Física	81.506.847.392	81.506.847.392	57.487.671.845	71%	47.582.347.993	9.905.323.852
520	Construcciones	81.194.145.129	81.194.145.129	57.297.171.845	71%	47.582.347.993	9.714.823.852
580	Estudios y Proyectos de Inversión	304.800.000	304.800.000	190.500.000	63%	0	190.500.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.902.263	7.902.263	0	0%	0	0
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	122.574.035.629	122.574.035.629	39.035.942.843	32%	34.582.676.031	4.453.266.812
200	Servicios No Personales	17.991.919.300	17.991.919.300	7.815.391.566	43%	5.562.939.364	2.252.452.202
220	Transporte y Almacenaje	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230	Pasejes y Viáticos	11.491.919.300	11.491.919.300	7.815.391.566	68%	5.562.939.364	2.252.452.202
240	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	69.212.200.849	69.212.200.849	21.947.258.591	32%	21.396.909.591	550.349.000
320	Textiles y Vestuarios	105.000.000	105.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	19.219.700.321	34%	19.219.700.321	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.107.200.849	10.107.200.849	2.727.558.270	27%	2.177.209.270	550.349.000
500	Inversión Física	35.369.915.480	35.369.915.480	9.273.292.686	26%	7.622.827.076	1.650.465.610
520	Construcciones	25.677.915.480	25.677.915.480	9.273.292.686	36%	7.622.827.076	1.650.465.610
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.692.000.000	4.692.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
15	Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0
500 Inversión Física		48	48	0	0%	0
520	Construcciones	48	48	0	0%	0
16	Construcción Cam. Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari	236.793.677	236.793.677	0	0%	0
500 Inversión Física		236.793.677	236.793.677	0	0%	0
520	Construcciones	236.793.677	236.793.677	0	0%	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	41.643.305.955	41.643.305.955	17.721.250.630	43%	17.721.250.630
500 Inversión Física		41.643.305.955	41.643.305.955	17.721.250.630	43%	17.721.250.630
520	Construcciones	41.643.305.955	41.643.305.955	17.721.250.630	43%	17.721.250.630
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	35.725.740.078	35.725.740.078	13.725.740.078	38%	13.725.740.078
500 Inversión Física		35.725.740.078	35.725.740.078	13.725.740.078	38%	13.725.740.078
520	Construcciones	35.725.740.078	35.725.740.078	13.725.740.078	38%	13.725.740.078
20	Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	34.802.468.358	34.802.468.358	15.802.468.358	45%	15.802.468.358
500 Inversión Física		34.802.468.358	34.802.468.358	15.802.468.358	45%	15.802.468.358
520	Construcciones	34.802.468.358	34.802.468.358	15.802.468.358	45%	15.802.468.358
21	Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	18.894.231.355	18.894.231.355	6.855.571.154	36%	6.490.319.148
500 Inversión Física		18.894.231.355	18.894.231.355	6.855.571.154	36%	6.490.319.148
520	Construcciones	18.894.231.355	18.894.231.355	6.855.571.154	36%	6.490.319.148
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724
500 Inversión Física		22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724
520	Construcciones	22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	26.641.955.951	26.641.955.951	10.641.955.951	40%	10.641.955.951
500 Inversión Física		26.641.955.951	26.641.955.951	10.641.955.951	40%	10.641.955.951
520	Construcciones	26.641.955.951	26.641.955.951	10.641.955.951	40%	10.641.955.951
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	1.303.298.830
500 Inversión Física		4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	1.303.298.830
520	Construcciones	4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	1.303.298.830
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"	47.091.807.501	47.091.807.501	26.642.632.601	57%	26.642.632.601
500 Inversión Física		47.091.807.501	47.091.807.501	26.642.632.601	57%	26.642.632.601
520	Construcciones	47.091.807.501	47.091.807.501	26.642.632.601	57%	26.642.632.601
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	930.500.000	930.500.000	0	0%	0
500 Inversión Física		930.500.000	930.500.000	0	0%	0
520	Construcciones	930.500.000	930.500.000	0	0%	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	20.084.670.602	20.084.670.602	7.876.333.202	39%	7.876.333.202
500 Inversión Física		20.084.670.602	20.084.670.602	7.876.333.202	39%	7.876.333.202
520	Construcciones	20.084.670.602	20.084.670.602	7.876.333.202	39%	7.876.333.202
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	24.635.427.725	24.635.427.725	9.393.800.324	38%	9.393.800.324
500 Inversión Física		24.635.427.725	24.635.427.725	9.393.800.324	38%	9.393.800.324
520	Construcciones	24.635.427.725	24.635.427.725	9.393.800.324	38%	9.393.800.324
31	Mejoramiento Quyyquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	20.961.402.576	20.961.402.576	11.962.950.176	57%	11.211.089.942
500 Inversión Física		20.961.402.576	20.961.402.576	11.962.950.176	57%	11.211.089.942
520	Construcciones	20.961.402.576	20.961.402.576	11.962.950.176	57%	11.211.089.942

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	39.411.656.288	39.411.656.288	15.550.955.229	39%	15.550.955.229	0
500 Inversión Física		39.411.656.288	39.411.656.288	15.550.955.229	39%	15.550.955.229	0
520	Construcciones	39.411.656.288	39.411.656.288	15.550.955.229	39%	15.550.955.229	0
36	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itaguá	435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
37	Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
38	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ypacaraí	216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
39	Mejoramiento de Caminos Distritales de Luque	223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
44	Mejoramiento de Caminos Distritales de Presidente Hayes	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	389.256.098.108	389.256.098.108	73.087.149.198	19%	70.413.624.439	2.673.524.759
01	SP Proyecto Acueducto	13.487.527	13.487.527	8.610.160	64%	8.610.160	0
200 Servicios No Personales		9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160	0
230 Pasejes y Viáticos		9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160	0
500 Inversión Física		4.487.527	4.487.527	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.487.527	4.487.527	0	0%	0	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	39.972.087.208	39.972.087.208	13.058.289.379	33%	12.868.025.643	190.263.736
100 Servicios Personales		975.312.852	975.312.852	570.633.333	59%	476.050.000	94.583.333
140 Personal Contratado		975.312.852	975.312.852	570.633.333	59%	476.050.000	94.583.333
200 Servicios No Personales		1.635.000.000	1.635.000.000	597.122.638	37%	501.442.235	95.680.403
230 Pasejes y Viáticos		460.000.000	460.000.000	312.871.689	68%	217.191.286	95.680.403
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.175.000.000	1.175.000.000	284.250.949	24%	284.250.949	0
500 Inversión Física		37.361.774.356	37.361.774.356	11.890.533.408	32%	11.890.533.408	0
520 Construcciones		37.361.774.356	37.361.774.356	11.890.533.408	32%	11.890.533.408	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	24.049.123.174	24.049.123.174	6.716.393.062	28%	6.716.393.062	0
200 Servicios No Personales		2.468.878.265	2.468.878.265	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.468.878.265	2.468.878.265	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.580.244.909	21.580.244.909	6.716.393.062	31%	6.716.393.062	0
520 Construcciones		21.580.244.909	21.580.244.909	6.716.393.062	31%	6.716.393.062	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	32.589.504.810	32.589.504.810	5.250.054.165	16%	3.537.828.485	1.712.225.680
200	Servicios No Personales	3.576.085.069	3.576.085.069	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.576.085.069	3.576.085.069	0	0%	0	0
500	Inversión Física	29.013.419.741	29.013.419.741	5.250.054.165	18%	3.537.828.485	1.712.225.680
520	Construcciones	29.013.419.741	29.013.419.741	5.250.054.165	18%	3.537.828.485	1.712.225.680
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	64.069.027.651	64.069.027.651	1.742.150.000	3%	1.435.450.000	306.700.000
100	Servicios Personales	376.200.000	376.200.000	282.150.000	75%	219.450.000	62.700.000
130	Asignaciones Complementarias	376.200.000	376.200.000	282.150.000	75%	219.450.000	62.700.000
200	Servicios No Personales	6.155.526.907	6.155.526.907	1.460.000.000	24%	1.216.000.000	244.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.155.526.907	6.155.526.907	1.460.000.000	24%	1.216.000.000	244.000.000
500	Inversión Física	56.237.300.744	56.237.300.744	0	0%	0	0
520	Construcciones	56.237.300.744	56.237.300.744	0	0%	0	0
800	Transferencias	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	76.412.638.835	76.412.638.835	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0	0
500	Inversión Física	63.908.637.581	63.908.637.581	0	0%	0	0
510	Adquisición de Inmuebles	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	56.408.637.581	56.408.637.581	0	0%	0	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	42.642.167.399	42.642.167.399	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0	0
500	Inversión Física	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0	0
520	Construcciones	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0	0
700	Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	26.288.560.003	26.288.560.003	11.919.815.626	45%	11.919.815.626	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física	23.362.144.947	23.362.144.947	11.919.815.626	51%	11.919.815.626	0
520 Construcciones	23.362.144.947	23.362.144.947	11.919.815.626	51%	11.919.815.626	0
700 Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
09 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	19.895.777.370	19.895.777.370	8.723.424.309	44%	8.723.424.309	0
100 Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física	16.969.362.314	16.969.362.314	8.723.424.309	51%	8.723.424.309	0
520 Construcciones	16.969.362.314	16.969.362.314	8.723.424.309	51%	8.723.424.309	0
700 Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
10 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	20.804.890.914	20.804.890.914	9.177.981.081	44%	9.177.981.081	0
100 Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0
500 Inversión Física	17.878.475.858	17.878.475.858	9.177.981.081	51%	9.177.981.081	0
520 Construcciones	17.878.475.858	17.878.475.858	9.177.981.081	51%	9.177.981.081	0
700 Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0	0
11 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	18.413.833.217	18.413.833.217	7.982.452.231	43%	7.982.452.231	0
100 Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
500 Inversión Física		15.487.418.161	15.487.418.161	7.982.452.231	52%	7.982.452.231
520 Construcciones		15.487.418.161	15.487.418.161	7.982.452.231	52%	7.982.452.231
700 Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760 Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública		436.656.480	436.656.480	0	0%	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	14.100.000.000	14.100.000.000	6.288.179.260	45%	5.823.843.917
500 Inversión Física		14.100.000.000	14.100.000.000	6.288.179.260	45%	5.823.843.917
520 Construcciones		14.100.000.000	14.100.000.000	6.288.179.260	45%	5.823.843.917
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	2.219.799.925	22%	2.219.799.925
500 Inversión Física		10.005.000.000	10.005.000.000	2.219.799.925	22%	2.219.799.925
520 Construcciones		10.005.000.000	10.005.000.000	2.219.799.925	22%	2.219.799.925
SUBTOTAL		5.409.407.054.989	5.409.407.054.989	2.847.911.802.778	53%	2.669.997.745.445

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	70.340.169.926	70.340.169.926	40.067.413.491	57%	33.954.115.126
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	70.340.169.926	70.340.169.926	40.067.413.491	57%	33.954.115.126
800 Transferencias		70.340.169.926	70.340.169.926	40.067.413.491	57%	33.954.115.126
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		68.270.169.926	68.270.169.926	39.538.595.991	58%	33.425.297.626
860 Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público		2.070.000.000	2.070.000.000	528.817.500	26%	528.817.500
SUBTOTAL		70.340.169.926	70.340.169.926	40.067.413.491	57%	33.954.115.126
TOTAL ENTIDAD		7.300.963.737.009	7.300.963.737.009	3.718.767.378.204	51%	3.422.940.014.552

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 08/10/2025



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2025

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
