



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2025


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	268.897.360.285	8.638.937.651	277.536.297.936	177.121.535.543	100.414.762.393
200 Servicios No Personales	250.519.761.960	79.213.417.735	329.733.179.695	132.816.731.160	196.916.448.535
300 Bienes de Consumo e Insumos	125.784.303.975	10.504.851.521	136.289.155.496	42.475.275.913	93.813.879.583
500 Inversión Física	5.134.635.978.804	58.551.754.006	5.193.187.732.810	2.481.892.639.285	2.711.295.093.525
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	-250.000.000	918.193.079.476	791.599.472.255	126.593.607.221
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	0	6.869.325.120	0	6.869.325.120
800 Transferencias	432.290.446.175	5.719.594.424	438.010.040.599	370.322.352.479	67.687.688.120
900 Otros Gastos	3.968.673.812	9.676.252.065	13.644.925.877	12.197.309.773	1.447.616.104
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	172.054.807.402	7.313.463.737.009	4.008.425.316.408	3.305.038.420.601


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 07/11/2025

Participación Presupuestaria

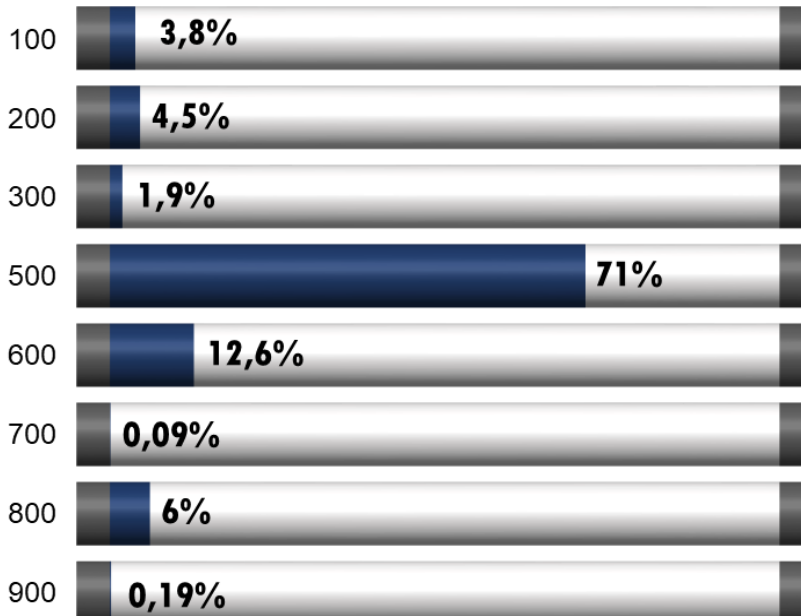


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

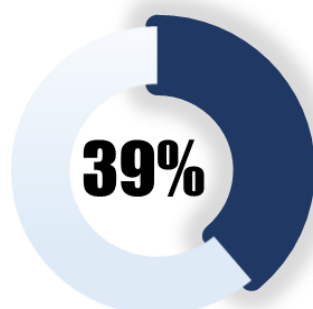


Presupuesto: ¢ 700.952.312.354
Ejecutado: ¢ 272.171.191.205

Recursos del Crédito Público

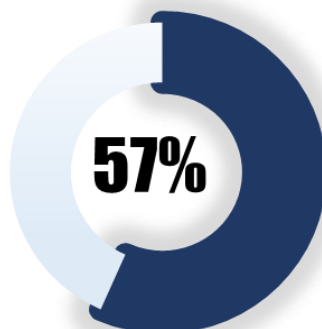

Presupuesto: ¢ 5.887.151.560.933
Ejecutado: ¢ 3.333.206.353.752

Recursos Institucionales

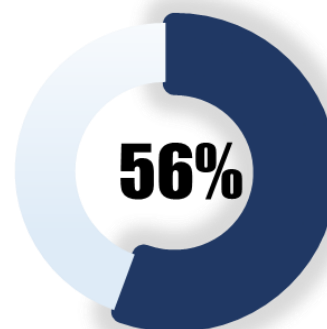

Presupuesto: ¢ 725.359.863.722
Ejecutado: ¢ 403.047.771.451

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.844.459.901.916	1.844.459.901.916	922.957.222.277	50%	848.438.489.222	74.518.733.055
01	Gestión Administrativa Financiera	412.157.103.433	412.157.103.433	214.839.050.158	52%	181.476.045.289	33.363.004.869
100	Servicios Personales	213.434.853.338	213.434.853.338	136.610.361.151	64%	116.172.349.567	20.438.011.584
110	Remuneraciones Básicas	158.309.331.895	158.309.331.895	102.534.401.029	65%	85.582.205.044	16.952.195.985
120	Remuneraciones Temporales	9.400.126.240	9.400.126.240	6.343.677.253	67%	6.298.922.999	44.754.254
130	Asignaciones Complementarias	22.907.783.149	22.907.783.149	17.270.755.989	75%	14.940.662.261	2.330.093.728
140	Personal Contratado	12.152.231.840	12.152.231.840	9.315.392.432	77%	8.367.545.857	947.846.575
190	Otros Gastos del Personal	10.665.380.214	10.665.380.214	1.146.134.448	11%	983.013.406	163.121.042
200	Servicios No Personales	112.976.375.395	112.976.375.395	62.203.681.386	55%	49.612.945.971	12.590.735.415
210	Servicios Básicos	17.818.200.000	17.818.200.000	8.393.093.904	47%	5.904.740.821	2.488.353.083
220	Transporte y Almacenaje	305.000.000	305.000.000	129.611.917	42%	129.611.917	0
230	Pasajes y Viáticos	7.130.169.446	7.130.169.446	3.568.050.438	50%	3.213.793.549	354.256.889
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	27.217.852.315	27.217.852.315	13.560.090.152	50%	11.368.095.402	2.191.994.750
250	Alquileres y Derechos	3.955.701.910	3.955.701.910	2.167.099.897	55%	1.980.433.231	186.666.666
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.748.771.236	12.748.771.236	5.158.830.035	40%	4.650.683.025	508.147.010
270	Servicio Social	37.830.000.488	37.830.000.488	27.139.587.011	72%	21.144.458.724	5.995.128.287
280	Otros Servicios en General	5.520.680.000	5.520.680.000	1.862.446.804	34%	1.004.751.662	857.695.142
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	450.000.000	450.000.000	224.871.228	50%	216.377.640	8.493.588
300	Bienes de Consumo e Insumos	29.241.860.670	29.241.860.670	6.519.426.180	22%	6.262.731.310	256.694.870
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.637.502.000	1.637.502.000	699.412.456	43%	699.412.456	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.027.232.238	2.027.232.238	1.070.123.007	53%	1.007.179.007	62.944.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	112.500.000	112.500.000	9.994.000	9%	9.994.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.812.976.640	20.812.976.640	4.571.254.007	22%	4.481.503.137	89.750.870
390	Otros Bienes de Consumo	4.651.649.792	4.651.649.792	168.642.710	4%	64.642.710	104.000.000
500	Inversión Física	50.771.763.822	50.771.763.822	4.793.577.121	9%	4.793.577.121	0
520	Construcciones	21.486.374.358	21.486.374.358	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.756.500.000	8.756.500.000	1.210.379.168	14%	1.210.379.168	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.021.102.400	5.021.102.400	1.895.202.900	38%	1.895.202.900	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	13.660.397.600	13.660.397.600	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.847.389.464	1.847.389.464	1.687.995.053	91%	1.687.995.053	0
800	Transferencias	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	1.059.046.787	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	1.059.046.787	0
900	Otros Gastos	4.668.250.208	4.668.250.208	3.652.957.533	78%	3.575.394.533	77.563.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.668.250.208	4.668.250.208	3.652.957.533	78%	3.575.394.533	77.563.000
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	302.760.000.000	302.760.000.000	293.889.072.773	97%	260.476.718.418	33.412.354.355
800	Transferencias	302.760.000.000	302.760.000.000	293.889.072.773	97%	260.476.718.418	33.412.354.355
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	302.760.000.000	302.760.000.000	293.889.072.773	97%	260.476.718.418	33.412.354.355

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	9.103.990.771	9.103.990.771	4.082.594.622	45%	3.701.907.463
100	Servicios Personales	4.882.798.342	4.882.798.342	3.532.041.614	72%	3.180.851.069
110	Remuneraciones Básicas	2.769.857.987	2.769.857.987	2.049.676.900	74%	1.844.709.210
120	Remuneraciones Temporales	194.968.780	194.968.780	124.817.434	64%	124.817.434
130	Asignaciones Complementarias	842.127.784	842.127.784	638.473.680	76%	569.082.312
140	Personal Contratado	932.843.791	932.843.791	694.905.190	74%	620.490.544
190	Otros Gastos del Personal	143.000.000	143.000.000	24.168.410	17%	21.751.569
200	Servicios No Personales	2.909.568.058	2.909.568.058	308.892.458	11%	292.311.114
230	Pasajes y Viáticos	156.383.438	156.383.438	88.941.466	57%	72.360.122
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	198.150.000	198.150.000	104.083.092	53%	104.083.092
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.515.034.620	2.515.034.620	115.867.900	5%	115.867.900
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	66.419.000	66.419.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	22.170.000	22.170.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.336.000	29.336.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	14.913.000	14.913.000	0	0%	0
500	Inversión Física	374.520.071	374.520.071	0	0%	0
520	Construcciones	50.000.000	50.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	160.000.000	160.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	120.520.000	120.520.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	44.000.071	44.000.071	0	0%	0
800	Transferencias	817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	228.745.280
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	228.745.280
900	Otros Gastos	53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	12.915.270
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.892.047.213	7.892.047.213	1.068.217.349	14%	1.068.217.349
100	Servicios Personales	833.546.541	833.546.541	695.270.629	83%	695.270.629
120	Remuneraciones Temporales	124.003.473	124.003.473	124.003.473	100%	124.003.473
130	Asignaciones Complementarias	437.539.416	437.539.416	437.539.416	100%	437.539.416
140	Personal Contratado	109.152.652	109.152.652	109.152.652	100%	109.152.652
190	Otros Gastos del Personal	162.851.000	162.851.000	24.575.088	15%	24.575.088
200	Servicios No Personales	2.874.410.300	2.874.410.300	372.946.720	13%	372.946.720
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	171.156.095	17%	171.156.095
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	141.100.000	15%	141.100.000
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	60.690.625	40%	60.690.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0
270	Servicio Social	561.410.300	561.410.300	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	213.690.372	213.690.372	0	0%	0
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.550.000.000	1.550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.570.000.000	1.570.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.400.000	30.400.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
05 Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	57.331.183.834	57.331.183.834	30.389.186.824	53%	24.120.572.616	6.268.614.208
100 Servicios Personales	39.198.200.786	39.198.200.786	28.198.777.033	72%	21.946.715.858	6.252.061.175
110 Remuneraciones Básicas	34.466.421.613	34.466.421.613	24.554.478.519	71%	18.619.377.985	5.935.100.534
120 Remuneraciones Temporales	389.147.946	389.147.946	265.845.714	68%	265.532.902	312.812
130 Asignaciones Complementarias	3.027.973.470	3.027.973.470	2.325.902.565	77%	2.094.178.873	231.723.692
140 Personal Contratado	1.075.843.579	1.075.843.579	828.847.385	77%	747.582.168	81.265.217
190 Otros Gastos del Personal	238.814.178	238.814.178	223.702.850	94%	220.043.930	3.658.920
200 Servicios No Personales	6.870.501.951	6.870.501.951	854.769.831	12%	838.216.798	16.553.033
230 Pasajes y Viáticos	891.975.228	891.975.228	322.235.241	36%	305.682.208	16.553.033
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.066.517.198	4.066.517.198	461.000.000	11%	461.000.000	0
250 Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	35.140.590	23%	35.140.590	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.727.009.525	1.727.009.525	36.394.000	2%	36.394.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.123.319.001	3.123.319.001	339.051.864	11%	339.051.864	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	220.000.000	220.000.000	39.350.000	18%	39.350.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.319.001	3.319.001	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	2.900.000.000	2.900.000.000	299.701.864	10%	299.701.864	0
500 Inversión Física	8.009.714.284	8.009.714.284	964.314.284	12%	964.314.284	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.509.714.284	6.509.714.284	709.714.284	11%	709.714.284	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.500.000.000	1.500.000.000	254.600.000	17%	254.600.000	0
800 Transferencias	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
06 Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.126.225.721	2.126.225.721	984.762.002	46%	943.166.261	41.595.741
100 Servicios Personales	956.876.721	956.876.721	663.052.257	69%	621.456.516	41.595.741
120 Remuneraciones Temporales	218.247.109	218.247.109	147.802.128	68%	147.802.128	0
130 Asignaciones Complementarias	550.125.590	550.125.590	425.312.640	77%	387.354.701	37.957.939
140 Personal Contratado	42.504.022	42.504.022	31.515.957	74%	27.878.155	3.637.802
190 Otros Gastos del Personal	146.000.000	146.000.000	58.421.532	40%	58.421.532	0
200 Servicios No Personales	619.349.000	619.349.000	321.709.745	52%	321.709.745	0
230 Pasajes y Viáticos	619.349.000	619.349.000	321.709.745	52%	321.709.745	0
500 Inversión Física	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.570.000.000	1.570.000.000	206.710.532	13%	206.710.532	0
200	Servicios No Personales	291.000.000	291.000.000	108.882.532	37%	108.882.532	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	231.000.000	231.000.000	108.882.532	47%	108.882.532	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	229.000.000	229.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.000.000	129.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.050.000.000	1.050.000.000	97.828.000	9%	97.828.000	0
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	97.828.000	22%	97.828.000	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.002.165.728	2.002.165.728	543.962.558	27%	516.130.215	27.832.343
200	Servicios No Personales	2.002.165.728	2.002.165.728	543.962.558	27%	516.130.215	27.832.343
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	168.246.012	86%	140.413.669	27.832.343
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.248.815.728	1.248.815.728	204.116.546	16%	204.116.546	0
250	Alquileres y Derechos	557.700.000	557.700.000	171.600.000	31%	171.600.000	0
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	99.982.860.000	99.982.860.000	1.255.607.951	1%	1.255.607.951	0
200	Servicios No Personales	248.043.353	248.043.353	146.108.401	59%	146.108.401	0
230	Pasajes y Viáticos	137.643.353	137.643.353	132.458.401	96%	132.458.401	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	13.650.000	12%	13.650.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	774.816.647	774.816.647	649.499.550	84%	649.499.550	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	124.816.647	124.816.647	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	649.499.550	99%	649.499.550	0
500	Inversión Física	98.000.000.000	98.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	86.000.000.000	86.000.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	960.000.000	960.000.000	460.000.000	48%	460.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100%	460.000.000	0
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	5.397.420.406	5.397.420.406	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.047.500.406	5.047.500.406	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.047.500.406	5.047.500.406	0	0%	0	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.418.493.004	2.418.493.004	1.435.988.440	59%	1.435.988.440	0
100	Servicios Personales	13.721.400	13.721.400	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	13.721.400	13.721.400	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.044.104.562	2.044.104.562	1.435.988.440	70%	1.435.988.440	0
520	Construcciones	1.600.000.000	1.600.000.000	1.435.988.440	90%	1.435.988.440	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	444.104.562	444.104.562	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
16 Restauración de Edificios Patrimoniales	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
500 Inversión Física	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
520 Construcciones	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
20 Construcción del CIRS de Emboscada	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
21 SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
500 Inversión Física	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
520 Construcciones	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
23 Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
24 Construcción de la Franja Costera Sur	11.159.586.220	11.159.586.220	2.118.466.367	19%	2.118.466.367	0
200 Servicios No Personales	1.974.046.167	1.974.046.167	1.740.401.270	88%	1.740.401.270	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.046.167	1.974.046.167	1.740.401.270	88%	1.740.401.270	0
500 Inversión Física	9.160.329.388	9.160.329.388	378.065.097	4%	378.065.097	0
520 Construcciones	7.950.156.371	7.950.156.371	378.065.097	5%	378.065.097	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.210.173.017	1.210.173.017	0	0%	0	0
800 Transferencias	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.210.665	25.210.665	0	0%	0	0
26 Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
500 Inversión Física	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
27 Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	7.932.975.911	7.932.975.911	3.481.244.431	44%	3.100.059.679	381.184.752
500 Inversión Física	7.928.292.511	7.928.292.511	3.481.244.431	44%	3.100.059.679	381.184.752
520 Construcciones	5.422.465.400	5.422.465.400	3.100.059.679	57%	3.100.059.679	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.505.827.111	2.505.827.111	381.184.752	15%	0	381.184.752
800 Transferencias	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
28 Mejoramiento Intersección Tres Bocas	1.246.703.526	1.246.703.526	0	0%	0	0
500 Inversión Física	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
520 Construcciones	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
800 Transferencias	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
29 Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	256.018.201.570	256.018.201.570	138.031.370.339	54%	138.031.370.339	0
500 Inversión Física	255.802.617.641	255.802.617.641	138.031.370.339	54%	138.031.370.339	0
510 Adquisición de Inmuebles	848.128.304	848.128.304	0	0%	0	0
520 Construcciones	250.829.211.870	250.829.211.870	136.789.798.157	55%	136.789.798.157	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.125.277.467	2.125.277.467	1.241.572.182	58%	1.241.572.182	0
800 Transferencias	215.583.929	215.583.929	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	215.583.929	215.583.929	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	119.998.476.517	119.998.476.517	64.491.127.259	54%	64.491.127.259	0
500 Inversión Física		119.998.476.517	119.998.476.517	64.491.127.259	54%	64.491.127.259	0
520	Construcciones	119.998.476.517	119.998.476.517	64.491.127.259	54%	64.491.127.259	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	846.259.058	846.259.058	0	0%	0	0
500 Inversión Física		846.259.058	846.259.058	0	0%	0	0
520	Construcciones	846.259.058	846.259.058	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	115.855.876.518	115.855.876.518	26.499.022.355	23%	26.048.062.727	450.959.628
100 Servicios Personales		3.974.156.000	3.974.156.000	2.321.658.667	58%	2.042.528.000	279.130.667
140	Personal Contratado	3.974.156.000	3.974.156.000	2.321.658.667	58%	2.042.528.000	279.130.667
200 Servicios No Personales		7.367.154.073	7.367.154.073	2.820.298.643	38%	2.648.469.682	171.828.961
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.367.154.073	7.367.154.073	2.820.298.643	38%	2.648.469.682	171.828.961
500 Inversión Física		104.120.966.445	104.120.966.445	20.963.465.045	20%	20.963.465.045	0
520	Construcciones	104.120.966.445	104.120.966.445	20.963.465.045	20%	20.963.465.045	0
800 Transferencias		393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	393.600.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	393.600.000	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	20.801.221.661	20.801.221.661	18.793.195.038	90%	18.793.195.038	0
200 Servicios No Personales		9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	2.798.302	0
230	Pasajes y Viáticos	9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	2.798.302	0
500 Inversión Física		20.791.534.711	20.791.534.711	18.790.396.736	90%	18.790.396.736	0
520	Construcciones	20.791.534.711	20.791.534.711	18.790.396.736	90%	18.790.396.736	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	48.210.840.709	48.210.840.709	35.858.257.165	74%	35.858.257.165	0
200 Servicios No Personales		1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	1.313.050	0
230	Pasajes y Viáticos	1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	1.313.050	0
500 Inversión Física		48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	35.856.944.115	0
520	Construcciones	48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	35.856.944.115	0
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	43.561.352.768	43.561.352.768	21.280.789.830	49%	21.198.289.830	82.500.000
100 Servicios Personales		115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.459.705.728	4.459.705.728	2.067.783.334	46%	1.985.283.334	82.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.459.705.728	4.459.705.728	2.067.783.334	46%	1.985.283.334	82.500.000
500 Inversión Física		37.741.882.240	37.741.882.240	19.213.006.496	51%	19.213.006.496	0
520	Construcciones	37.335.538.240	37.335.538.240	19.213.006.496	51%	19.213.006.496	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	6.344.000	6.344.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0	0
49 Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	9.473.302.997	9.473.302.997	106.500.000	1%	55.000.000	51.500.000
200 Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	106.500.000	7%	55.000.000	51.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	106.500.000	7%	55.000.000	51.500.000
500 Inversión Física	7.973.302.997	7.973.302.997	0	0%	0	0
520 Construcciones	7.141.302.997	7.141.302.997	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	432.000.000	432.000.000	0	0%	0	0
50 Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	21.172.663.862	21.172.663.862	73.500.000	0,35%	15.000.000	58.500.000
200 Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	73.500.000	5%	15.000.000	58.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	73.500.000	5%	15.000.000	58.500.000
500 Inversión Física	19.672.663.862	19.672.663.862	0	0%	0	0
520 Construcciones	19.292.663.862	19.292.663.862	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
51 Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	58.655.329.841	0
500 Inversión Física	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	58.655.329.841	0
520 Construcciones	103.617.653.934	103.617.653.934	58.655.329.841	57%	58.655.329.841	0
52 Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
500 Inversión Física	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
520 Construcciones	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
54 Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	3.050.000.000	3.050.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
55 SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
56 Construcción Gran Hospital General	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	14.991.293.407	14.991.293.407	29.920.303	0,20%	29.920.303	0
200	Servicios No Personales	3.289.043.407	3.289.043.407	29.920.303	1%	29.920.303	0
230	Pasajes y Viáticos	340.175.000	340.175.000	29.920.303	9%	29.920.303	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.948.868.407	2.948.868.407	0	0%	0	0
500	Inversión Física	11.702.250.000	11.702.250.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	11.307.250.000	11.307.250.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	395.000.000	395.000.000	0	0%	0	0
58	Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón	13.050.176.080	13.050.176.080	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	9.477.279.527	9.477.279.527	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	51.984.231	51.984.231	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	9.425.295.296	9.425.295.296	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.886.704.617	2.886.704.617	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.530.664.617	2.530.664.617	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	118.680.000	118.680.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	237.360.000	237.360.000	0	0%	0	0
59	Mantenimiento y Conservación de Rutas	18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	18.500.000.000	18.500.000.000	0	0%	0	0
60	Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes	50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	50.500.000.000	50.500.000.000	0	0%	0	0
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
62	Ampliación de la Defensa Costera de Concepción	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
63	Ampliación de la Defensa Costera Villa Hayes	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.844.459.901.916	1.844.459.901.916	922.957.222.277	50%	848.438.489.222	74.518.733.055

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.405.464.494.418	4.405.464.494.418	2.605.517.346.330	59%	2.589.101.276.223	16.416.070.107
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	2.490.696.004	2.490.696.004	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.065.696.004	2.065.696.004	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.016.718.376	2.016.718.376	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	48.977.628	48.977.628	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	70.858.587.497	70.858.587.497	41.636.048.515	59%	41.571.650.369
200 Servicios No Personales		516.273.149	516.273.149	59.300.003	11%	59.300.003
230	Pasajes y Viáticos	360.000.000	360.000.000	59.300.003	16%	59.300.003
260	Servicios Técnicos y Profesionales	156.273.149	156.273.149	0	0%	0
500 Inversión Física		61.602.314.348	61.602.314.348	33.351.894.551	54%	33.287.496.405
520	Construcciones	60.907.314.348	60.907.314.348	33.261.499.229	55%	33.261.499.229
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	695.000.000	695.000.000	90.395.322	13%	25.997.176
800 Transferencias		140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000
900 Otros Gastos		8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	8.208.393.961
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	8.208.393.961
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	158.970.057.464	158.970.057.464	55.596.701.835	35%	54.690.472.500
200 Servicios No Personales		1.837.137.998	1.837.137.998	46.200.000	3%	46.200.000
230	Pasajes y Viáticos	17.499.999	17.499.999	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.819.637.999	1.819.637.999	46.200.000	3%	46.200.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.000.000	2.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes De Consumo	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		157.021.719.466	157.021.719.466	55.545.848.652	35%	54.640.912.566
520	Construcciones	154.183.015.700	154.183.015.700	55.353.613.988	36%	54.640.912.566
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.000.000	1.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	982.800.000	982.800.000	192.234.664	20%	0
800 Transferencias		109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	3.359.934
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109.200.000	109.200.000	4.653.183	4%	3.359.934
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	102.250.051.965	102.250.051.965	57.834.789.317	57%	56.139.863.188
200 Servicios No Personales		300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	43.984.063
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	43.984.063
500 Inversión Física		101.950.051.965	101.950.051.965	57.790.805.254	57%	56.095.879.125
520	Construcciones	100.848.567.178	100.848.567.178	57.790.805.254	57%	56.095.879.125
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.101.484.787	1.101.484.787	0	0%	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	27.294.963.139	27.294.963.139	18.862.365.158	69%	18.862.365.158
200 Servicios No Personales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750
500 Inversión Física		23.958.089.119	23.958.089.119	18.311.128.211	76%	18.311.128.211
520	Construcciones	18.922.176.905	18.922.176.905	13.275.215.997	70%	13.275.215.997
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.035.912.214	5.035.912.214	5.035.912.214	100%	5.035.912.214
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	35.760.042.099	35.760.042.099	4.428.162.351	12%	4.428.162.351
200 Servicios No Personales		4.554.551.631	4.554.551.631	6.851.631	0,15%	6.851.631
230	Pasajes y Viáticos	6.851.631	6.851.631	6.851.631	100%	6.851.631
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.547.700.000	4.547.700.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	31.205.490.468	31.205.490.468	4.421.310.720	14%	4.421.310.720	0
520 Construcciones	28.969.286.318	28.969.286.318	2.632.682.830	9%	2.632.682.830	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.236.204.150	2.236.204.150	1.788.627.890	80%	1.788.627.890	0
12 Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	58.686.750.963	58.686.750.963	13.710.340.466	23%	13.269.129.339	441.211.127
200 Servicios No Personales	2.382.731.672	2.382.731.672	481.829.647	20%	481.829.647	0
230 Pasajes y Viáticos	100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.281.931.672	2.281.931.672	481.829.647	21%	481.829.647	0
500 Inversión Física	56.304.019.291	56.304.019.291	13.228.510.819	23%	12.787.299.692	441.211.127
520 Construcciones	56.304.019.291	56.304.019.291	13.228.510.819	23%	12.787.299.692	441.211.127
13 Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	12.690.377.665	12.690.377.665	7.196.595.162	57%	6.784.885.658	411.709.504
200 Servicios No Personales	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	1.076.270	0
230 Pasajes y Viáticos	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	1.076.270	0
500 Inversión Física	12.647.229.296	12.647.229.296	7.195.518.892	57%	6.783.809.388	411.709.504
520 Construcciones	11.737.622.474	11.737.622.474	7.195.518.892	61%	6.783.809.388	411.709.504
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	909.606.822	909.606.822	0	0%	0	0
14 Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.622.174.143	0
500 Inversión Física	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.622.174.143	0
520 Construcciones	22.005.711.371	22.005.711.371	1.622.174.143	7%	1.622.174.143	0
15 Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	91.532.637.240	91.532.637.240	55.674.145.849	61%	52.249.056.309	3.425.089.540
100 Servicios Personales	162.000.000	162.000.000	118.800.000	73%	105.600.000	13.200.000
140 Personal Contratado	162.000.000	162.000.000	118.800.000	73%	105.600.000	13.200.000
200 Servicios No Personales	3.055.000.000	3.055.000.000	5.381.350	0,18%	5.381.350	0
230 Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	5.381.350	9%	5.381.350	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.995.000.000	2.995.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	88.315.637.240	88.315.637.240	55.549.964.499	63%	52.138.074.959	3.411.889.540
520 Construcciones	88.315.637.240	88.315.637.240	55.549.964.499	63%	52.138.074.959	3.411.889.540
16 Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	103.455.146.971	103.455.146.971	55.631.000.523	54%	55.007.254.860	623.745.663
100 Servicios Personales	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.151.833.000	2.151.833.000	925.857.963	43%	818.857.963	107.000.000
230 Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	3.357.963	3%	3.357.963	0
260 Servicios Técnicos Y Profesionales	2.030.000.000	2.030.000.000	922.500.000	45%	815.500.000	107.000.000
290 Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	1.833.000	1.833.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	101.203.313.975	101.203.313.975	54.705.142.560	54%	54.188.396.897	516.745.663
520 Construcciones	91.731.676.375	91.731.676.375	54.705.142.560	60%	54.188.396.897	516.745.663
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.471.637.600	9.471.637.600	0	0%	0	0
17 Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	12.744.005.486	12.744.005.486	2.284.713.636	18%	2.284.713.636	0
200 Servicios No Personales	4.216.000.000	4.216.000.000	2.284.713.636	54%	2.284.713.636	0
230 Pasajes y Viáticos	4.216.000.000	4.216.000.000	2.284.713.636	54%	2.284.713.636	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
500 Inversión Física		19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
520	Construcciones	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
500 Inversión Física		2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
520	Construcciones	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
500 Inversión Física		730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
520	Construcciones	730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	587.795.632	587.795.632	0	0%	0	0
500 Inversión Física		587.045.632	587.045.632	0	0%	0	0
520	Construcciones	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.045.632	13.045.632	0	0%	0	0
800 Transferencias		750.000	750.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	750.000	750.000	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
520	Construcciones	545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.056.223.299	2.056.223.299	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	723.381.383	723.381.383	0	0%	0	0
500 Inversión Física		723.381.383	723.381.383	0	0%	0	0
520	Construcciones	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.438.059	3.438.059	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
500 Inversión Física		1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.876.945.322	1.876.945.322	205.066.470	11%	146.015.806	59.050.664
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	955.344.736.776	955.344.736.776	794.853.002.667	83%	793.675.570.563	1.177.432.104
500 Inversión Física		35.377.157.300	35.377.157.300	2.741.335.591	8%	1.563.903.487	1.177.432.104
520	Construcciones	26.407.157.300	26.407.157.300	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	8.970.000.000	8.970.000.000	2.741.335.591	31%	1.563.903.487	1.177.432.104
600 Inversión Financiera		918.193.079.476	918.193.079.476	791.599.472.255	86%	791.599.472.255	0
630	Préstamos al Sector Privado	918.193.079.476	918.193.079.476	791.599.472.255	86%	791.599.472.255	0
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	7.053.969.600	7.053.969.600	2.176.837.219	31%	1.480.992.145	695.845.074
500 Inversión Física		6.042.988.546	6.042.988.546	1.871.623.844	31%	1.175.778.770	695.845.074
520	Construcciones	1.220.702.129	1.220.702.129	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.822.286.417	4.822.286.417	1.871.623.844	39%	1.175.778.770	695.845.074
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
510	Adquisiciones de Inmuebles	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	18.529.889.009	18.529.889.009	16.960.368.131	92%	16.960.368.131	0
200 Servicios No Personales		153.441.600	153.441.600	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	153.441.600	153.441.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.376.447.409	18.376.447.409	16.960.368.131	92%	16.960.368.131	0
520	Construcciones	17.871.901.824	17.871.901.824	16.708.095.339	93%	16.708.095.339	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	504.545.585	504.545.585	252.272.792	50%	252.272.792	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	26.884.117.148	26.884.117.148	7.083.758.306	26%	7.083.758.306	0
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.661.701.510	24.661.701.510	7.083.758.306	29%	7.083.758.306	0
520	Construcciones	23.681.701.510	23.681.701.510	7.083.758.306	30%	7.083.758.306	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	980.000.000	980.000.000	0	0%	0	0
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	170.738.560.872	170.738.560.872	95.231.739.159	56%	95.033.247.754	198.491.405
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	2.728.418.498	31%	2.728.418.498	0
230	Pasajes y Viáticos	24.999.998	24.999.998	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.659.640.000	8.659.640.000	2.728.418.498	32%	2.728.418.498	0
500 Inversión Física		162.053.920.874	162.053.920.874	92.503.320.661	57%	92.304.829.256	198.491.405
520	Construcciones	162.053.920.874	162.053.920.874	92.503.320.661	57%	92.304.829.256	198.491.405
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	341.170.639.028	341.170.639.028	181.855.765.257	53%	181.507.479.063	348.286.194
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	466.750.341	95%	414.889.192	51.861.149
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	466.750.341	95%	414.889.192	51.861.149
200 Servicios No Personales		17.589.431.119	17.589.431.119	10.620.743.645	60%	10.620.743.645	0
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.289.431.119	17.289.431.119	10.620.743.645	61%	10.620.743.645	0
500 Inversión Física		323.091.607.909	323.091.607.909	170.768.271.271	53%	170.471.846.226	296.425.045
520	Construcciones	315.891.607.909	315.891.607.909	170.768.271.271	54%	170.471.846.226	296.425.045
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	214.855.387.433	214.855.387.433	151.932.631.054	71%	151.781.471.054	151.160.000
100 Servicios Personales		800.800.000	800.800.000	554.400.000	69%	403.240.000	151.160.000
140	Personal Contratado	800.800.000	800.800.000	554.400.000	69%	403.240.000	151.160.000
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	51.388.800	5%	51.388.800	0
220	Transporte y Almacenaje	157.342.500	157.342.500	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	462.156.768	462.156.768	51.388.800	11%	51.388.800	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.524.000	475.524.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		212.959.564.165	212.959.564.165	151.326.842.254	71%	151.326.842.254	0
520	Construcciones	212.959.564.165	212.959.564.165	151.326.842.254	71%	151.326.842.254	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
500	Inversión Física	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
520	Construcciones	842.174.015	842.174.015	0	0%	0	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
500	Inversión Física	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
520	Construcciones	472.648.166	472.648.166	0	0%	0	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591	0
500	Inversión Física	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591	0
520	Construcciones	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591	0
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	282.557.111.508	282.557.111.508	135.674.571.191	48%	134.112.861.029	1.561.710.162
200	Servicios No Personales	3.295.405.000	3.295.405.000	60.500.000	2%	60.500.000	0
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.282.905.000	3.282.905.000	60.500.000	2%	60.500.000	0
500	Inversión Física	273.381.706.508	273.381.706.508	131.402.664.750	48%	129.844.419.588	1.558.245.162
520	Construcciones	245.189.706.508	245.189.706.508	114.451.189.861	47%	114.240.480.369	210.709.492
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	28.192.000.000	28.192.000.000	16.951.474.889	60%	15.603.939.219	1.347.535.670
800	Transferencias	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.207.941.441	3.465.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.207.941.441	3.465.000

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	25.317.411.970	25.317.411.970	9.644.795.856	38%	42.654.571
200	Servicios No Personales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	24.499.411.970	24.499.411.970	9.415.231.183	38%	42.654.571
520	Construcciones	23.214.300.000	23.214.300.000	8.505.676.490	37%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.285.111.970	1.285.111.970	909.554.693	71%	42.654.571
800	Transferencias	718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	75.325.634.558	75.325.634.558	38.148.694.629	51%	248.747.178
200	Servicios No Personales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	74.461.634.558	74.461.634.558	38.148.694.629	51%	248.747.178
520	Construcciones	67.930.634.558	67.930.634.558	38.148.694.629	56%	248.747.178
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.419.000.000	4.419.000.000	0	0%	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	86.018.420.703	86.018.420.703	56.593.273.816	66%	0
200	Servicios No Personales	2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0
500	Inversión Física	84.004.111.888	84.004.111.888	56.593.273.816	67%	0
520	Construcciones	80.088.111.888	80.088.111.888	56.593.273.816	71%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.764.000.000	2.764.000.000	0	0%	0
84	Construcción y Mejoramiento Zona Franca Concepción	21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0
500	Inversión Física	21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0
520	Construcciones	21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	19.318.072.000	19.318.072.000	7.000.000.000	36%	0
500	Inversión Física	19.318.072.000	19.318.072.000	7.000.000.000	36%	0
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	7.000.000.000	37%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	318.072.000	318.072.000	0	0%	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	0
500	Inversión Física	68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	0
520	Construcciones	68.223.044.095	68.223.044.095	53.632.489.623	79%	0
89	SP AP. Pre Prog. de Mod. del Sec. Tra. Py ATN/0C-11921-PR	351.120.000	351.120.000	0	0%	0
500	Inversión Física	351.120.000	351.120.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	351.120.000	351.120.000	0	0%	0
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0
500	Inversión Física	44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0
520	Construcciones	44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	133.728.073.297	133.728.073.297	65.295.383.626	49%	3.051.892.591
200	Servicios No Personales	1.960.015.936	1.960.015.936	289.974.334	15%	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	289.974.334	15%	0
500	Inversión Física	127.928.057.361	127.928.057.361	64.360.065.085	50%	2.985.723.040
520	Construcciones	117.311.576.561	117.311.576.561	60.761.231.161	52%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	10.616.480.800	10.616.480.800	3.598.833.924	34%	2.985.723.040

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	579.174.656	66.169.551
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	579.174.656	66.169.551
93 Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	370.944.617.230	370.944.617.230	275.718.467.630	74%	275.104.198.565	614.269.065
100 Servicios Personales	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	369.656.617.230	369.656.617.230	275.718.467.630	75%	275.104.198.565	614.269.065
520 Construcciones	366.808.617.230	366.808.617.230	275.718.467.630	75%	275.104.198.565	614.269.065
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.128.000.000	2.128.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94 Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	305.915.266.053	305.915.266.053	149.863.555.150	49%	149.816.555.150	47.000.000
100 Servicios Personales	811.000.000	811.000.000	412.000.000	51%	365.000.000	47.000.000
140 Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	348.000.000	47%	301.000.000	47.000.000
190 Otros Gastos del Personal	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100%	64.000.000	0
200 Servicios No Personales	1.386.000.000	1.386.000.000	57.601.969	4%	57.601.969	0
230 Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	57.601.969	23%	57.601.969	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.136.000.000	1.136.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	302.758.266.053	302.758.266.053	149.393.953.181	49%	149.393.953.181	0
520 Construcciones	284.918.266.053	284.918.266.053	149.393.953.181	52%	149.393.953.181	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.840.000.000	17.840.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95 Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	314.270.195.294	314.270.195.294	136.130.048.324	43%	135.705.437.931	424.610.393
100 Servicios Personales	1.382.670.024	1.382.670.024	1.037.002.518	75%	921.780.016	115.222.502
140 Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	1.037.002.518	75%	921.780.016	115.222.502
200 Servicios No Personales	1.578.000.000	1.578.000.000	199.899.806	13%	197.747.266	2.152.540
230 Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	123.059.806	62%	120.907.266	2.152.540
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.378.000.000	1.378.000.000	76.840.000	6%	76.840.000	0
500 Inversión Física	311.309.525.270	311.309.525.270	134.893.146.000	43%	134.585.910.649	307.235.351
520 Construcciones	298.009.525.270	298.009.525.270	134.893.146.000	45%	134.585.910.649	307.235.351
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0
96 SP. Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari- Carapegúa - Quiindy - Caap	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
500 Inversión Física	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
590 Gastos de Inversión y Reparac Mayores	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
98 Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.000.982.862	223.306.182
500 Inversión Física	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.000.982.862	223.306.182
520 Construcciones	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.000.982.862	223.306.182
99 Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	133.525.678.082	133.525.678.082	75.985.526.100	57%	75.981.221.020	4.305.080
200 Servicios No Personales	33.678.000.000	33.678.000.000	22.286.730.526	66%	22.282.425.446	4.305.080
230 Pasajes y Viáticos	4.000.000.000	4.000.000.000	430.815.212	11%	426.510.132	4.305.080
260 Servicios Técnicos y Profesionales	29.678.000.000	29.678.000.000	21.855.915.314	74%	21.855.915.314	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	24.897.843.471	24.897.843.471	10.529.100.000	42%	10.529.100.000	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	2.858.350.000	28%	2.858.350.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	14.597.843.471	14.597.843.471	7.670.750.000	53%	7.670.750.000	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	34.087.760.851	34.087.760.851	19.139.868.374	56%	19.139.868.374	0
520 Construcciones	34.087.760.851	34.087.760.851	19.139.868.374	56%	19.139.868.374	0
800 Transferencias	40.862.073.760	40.862.073.760	24.029.827.200	59%	24.029.827.200	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.580.000.000	11.580.000.000	2.171.227.200	19%	2.171.227.200	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	29.282.073.760	29.282.073.760	21.858.600.000	75%	21.858.600.000	0
002 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	603.943.072.641	603.943.072.641	361.444.495.559	60%	355.681.431.860	5.763.063.699
01 SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
500 Inversión Física	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
520 Construcciones	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
02 Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
520 Construcciones	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
03 Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	3.544.362.494	3.544.362.494	2.392.175.638	67%	2.392.175.638	0
200 Servicios No Personales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
500 Inversión Física	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
520 Construcciones	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
04 Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	47.655.939.261	47.655.939.261	28.723.141.000	60%	28.380.421.000	342.720.000
100 Servicios Personales	2.583.170.000	2.583.170.000	1.627.288.000	63%	1.284.568.000	342.720.000
140 Personal Contratado	2.583.170.000	2.583.170.000	1.627.288.000	63%	1.284.568.000	342.720.000
200 Servicios No Personales	8.324.871.040	8.324.871.040	5.612.302.469	67%	5.612.302.469	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	8.324.871.040	8.324.871.040	5.612.302.469	67%	5.612.302.469	0
500 Inversión Física	36.747.898.221	36.747.898.221	21.483.550.531	58%	21.483.550.531	0
520 Construcciones	35.641.857.122	35.641.857.122	20.377.509.434	57%	20.377.509.434	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	1.106.041.099	1.106.041.099	1.106.041.097	100%	1.106.041.097	0
07 Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.546.133.008	1.546.133.008	1.513.866.322	98%	1.504.718.027	9.148.295
200 Servicios No Personales	1.363.584.472	1.363.584.472	1.331.317.786	98%	1.322.169.491	9.148.295
230 Pasejes y Viáticos	1.361.500.000	1.361.500.000	1.331.317.786	98%	1.322.169.491	9.148.295
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.084.472	2.084.472	0	0%	0	0
500 Inversión Física	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
520 Construcciones	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
11 Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	87.964.010.469	87.964.010.469	61.744.562.011	70%	61.579.939.939	164.622.072
200 Servicios No Personales	5.753.613.077	5.753.613.077	2.029.581.359	35%	2.029.581.359	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.753.613.077	5.753.613.077	2.029.581.359	35%	2.029.581.359	0
500 Inversión Física	82.210.397.392	82.210.397.392	59.714.980.652	73%	59.550.358.580	164.622.072
520 Construcciones	81.897.695.129	81.897.695.129	59.524.480.652	73%	59.359.858.580	164.622.072
580 Estudios y Proyectos de Inversión	304.800.000	304.800.000	190.500.000	63%	190.500.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.902.263	7.902.263	0	0%	0	0
12 Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	122.574.035.629	122.574.035.629	46.449.043.536	38%	43.406.571.273	3.042.472.263
200 Servicios No Personales	17.991.919.300	17.991.919.300	7.815.391.566	43%	7.791.175.491	24.216.075
220 Transporte y Almacenaje	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230 Pasejes y Viáticos	11.491.919.300	11.491.919.300	7.815.391.566	68%	7.791.175.491	24.216.075
240 Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	69.212.200.849	69.212.200.849	24.438.198.319	35%	21.947.258.591	2.490.939.728
320 Textiles y Vestuarios	105.000.000	105.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	21.710.640.049	39%	19.219.700.321	2.490.939.728
390 Otros Bienes de Consumo	10.107.200.849	10.107.200.849	2.727.558.270	27%	2.727.558.270	0
500 Inversión Física	35.369.915.480	35.369.915.480	14.195.453.651	40%	13.668.137.191	527.316.460
520 Construcciones	25.677.915.480	25.677.915.480	14.195.453.651	55%	13.668.137.191	527.316.460
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.692.000.000	4.692.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0	0
15 Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0	0
500 Inversión Física	48	48	0	0%	0	0
520 Construcciones	48	48	0	0%	0	0
16 Construcción Cam. Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
500 Inversión Física	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
520 Construcciones	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
18 Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	41.643.305.955	41.643.305.955	20.580.627.640	49%	20.580.627.640	0
500 Inversión Física	41.643.305.955	41.643.305.955	20.580.627.640	49%	20.580.627.640	0
520 Construcciones	41.643.305.955	41.643.305.955	20.580.627.640	49%	20.580.627.640	0
19 Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	35.725.740.078	35.725.740.078	22.837.665.428	64%	22.837.665.428	0
500 Inversión Física	35.725.740.078	35.725.740.078	22.837.665.428	64%	22.837.665.428	0
520 Construcciones	35.725.740.078	35.725.740.078	22.837.665.428	64%	22.837.665.428	0
20 Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	34.802.468.358	34.802.468.358	21.411.701.215	62%	21.411.701.215	0
500 Inversión Física	34.802.468.358	34.802.468.358	21.411.701.215	62%	21.411.701.215	0
520 Construcciones	34.802.468.358	34.802.468.358	21.411.701.215	62%	21.411.701.215	0
21 Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	18.894.231.355	18.894.231.355	7.530.953.480	40%	7.530.953.480	0
500 Inversión Física	18.894.231.355	18.894.231.355	7.530.953.480	40%	7.530.953.480	0
520 Construcciones	18.894.231.355	18.894.231.355	7.530.953.480	40%	7.530.953.480	0
22 Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724	778.472.294
500 Inversión Física	22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724	778.472.294
520 Construcciones	22.457.084.249	22.457.084.249	8.517.277.018	38%	7.738.804.724	778.472.294
23 Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	26.641.955.951	26.641.955.951	18.810.189.190	71%	18.810.189.190	0
500 Inversión Física	26.641.955.951	26.641.955.951	18.810.189.190	71%	18.810.189.190	0
520 Construcciones	26.641.955.951	26.641.955.951	18.810.189.190	71%	18.810.189.190	0
24 Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	2.240.208.402	0
500 Inversión Física	4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	2.240.208.402	0
520 Construcciones	4.950.091.266	4.950.091.266	2.240.208.402	45%	2.240.208.402	0
27 Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"	47.091.807.501	47.091.807.501	33.514.087.426	71%	32.806.270.016	707.817.410
500 Inversión Física	47.091.807.501	47.091.807.501	33.514.087.426	71%	32.806.270.016	707.817.410
520 Construcciones	47.091.807.501	47.091.807.501	33.514.087.426	71%	32.806.270.016	707.817.410
28 Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	930.500.000	930.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	930.500.000	930.500.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	930.500.000	930.500.000	0	0%	0	0
29 Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	20.084.670.602	20.084.670.602	18.732.179.551	93%	18.732.179.551	0
500 Inversión Física	20.084.670.602	20.084.670.602	18.732.179.551	93%	18.732.179.551	0
520 Construcciones	20.084.670.602	20.084.670.602	18.732.179.551	93%	18.732.179.551	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	24.635.427.725	24.635.427.725	24.330.017.375	99%	23.840.658.410	489.358.965
500 Inversión Física		24.635.427.725	24.635.427.725	24.330.017.375	99%	23.840.658.410	489.358.965
520 Construcciones		24.635.427.725	24.635.427.725	24.330.017.375	99%	23.840.658.410	489.358.965
31	Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	20.961.402.576	20.961.402.576	12.898.706.649	62%	12.670.254.249	228.452.400
500 Inversión Física		20.961.402.576	20.961.402.576	12.898.706.649	62%	12.670.254.249	228.452.400
520 Construcciones		20.961.402.576	20.961.402.576	12.898.706.649	62%	12.670.254.249	228.452.400
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	39.411.656.288	39.411.656.288	29.200.502.171	74%	29.200.502.171	0
500 Inversión Física		39.411.656.288	39.411.656.288	29.200.502.171	74%	29.200.502.171	0
520 Construcciones		39.411.656.288	39.411.656.288	29.200.502.171	74%	29.200.502.171	0
36	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itaguá	435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		435.500.000	435.500.000	0	0%	0	0
37	Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
38	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ypacaraí	216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		216.000.000	216.000.000	0	0%	0	0
39	Mejoramiento de Caminos Distritales de Luque	223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		223.000.000	223.000.000	0	0%	0	0
44	Mejoramiento de Caminos Distritales de Presidente Hayes	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	389.256.098.108	389.256.098.108	74.169.028.503	19%	74.053.678.503	115.350.000
01	SP Proyecto Acueducto	13.487.527	13.487.527	8.610.160	64%	8.610.160	0
200 Servicios No Personales		9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160	0
230 Pasejes y Viáticos		9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160	0
500 Inversión Física		4.487.527	4.487.527	0	0%	0	0
520 Construcciones		4.487.527	4.487.527	0	0%	0	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	39.972.087.208	39.972.087.208	13.058.289.379	33%	13.058.289.379	0
100 Servicios Personales		975.312.852	975.312.852	570.633.333	59%	570.633.333	0
140 Personal Contratado		975.312.852	975.312.852	570.633.333	59%	570.633.333	0
200 Servicios No Personales		1.635.000.000	1.635.000.000	597.122.638	37%	597.122.638	0
230 Pasejes y Viáticos		460.000.000	460.000.000	312.871.689	68%	312.871.689	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.175.000.000	1.175.000.000	284.250.949	24%	284.250.949	0
500 Inversión Física		37.361.774.356	37.361.774.356	11.890.533.408	32%	11.890.533.408	0
520 Construcciones		37.361.774.356	37.361.774.356	11.890.533.408	32%	11.890.533.408	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	24.049.123.174	24.049.123.174	6.716.393.062	28%	6.716.393.062	0
200 Servicios No Personales		2.468.878.265	2.468.878.265	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.468.878.265	2.468.878.265	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.580.244.909	21.580.244.909	6.716.393.062	31%	6.716.393.062	0
520 Construcciones		21.580.244.909	21.580.244.909	6.716.393.062	31%	6.716.393.062	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	32.589.504.810	32.589.504.810	5.250.054.165	16%	5.250.054.165
200	Servicios No Personales	3.576.085.069	3.576.085.069	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.576.085.069	3.576.085.069	0	0%	0
500	Inversión Física	29.013.419.741	29.013.419.741	5.250.054.165	18%	5.250.054.165
520	Construcciones	29.013.419.741	29.013.419.741	5.250.054.165	18%	5.250.054.165
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	64.069.027.651	64.069.027.651	1.773.500.000	3%	1.658.150.000
100	Servicios Personales	376.200.000	376.200.000	313.500.000	83%	282.150.000
130	Asignaciones Complementarias	376.200.000	376.200.000	313.500.000	83%	282.150.000
200	Servicios No Personales	6.155.526.907	6.155.526.907	1.460.000.000	24%	1.376.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.155.526.907	6.155.526.907	1.460.000.000	24%	1.376.000.000
500	Inversión Física	56.237.300.744	56.237.300.744	0	0%	0
520	Construcciones	56.237.300.744	56.237.300.744	0	0%	0
800	Transferencias	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	76.412.638.835	76.412.638.835	0	0%	0
200	Servicios No Personales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0
500	Inversión Física	63.908.637.581	63.908.637.581	0	0%	0
510	Adquisición de Inmuebles	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	56.408.637.581	56.408.637.581	0	0%	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	42.642.167.399	42.642.167.399	0	0%	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0
500	Inversión Física	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0
520	Construcciones	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0
700	Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	26.288.560.003	26.288.560.003	11.919.815.626	45%	11.919.815.626
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0
500	Inversión Física	23.362.144.947	23.362.144.947	11.919.815.626	51%	11.919.815.626
520	Construcciones	23.362.144.947	23.362.144.947	11.919.815.626	51%	11.919.815.626
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	19.895.777.370	19.895.777.370	8.723.424.309	44%	8.723.424.309
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0
500	Inversión Física	16.969.362.314	16.969.362.314	8.723.424.309	51%	8.723.424.309
520	Construcciones	16.969.362.314	16.969.362.314	8.723.424.309	51%	8.723.424.309
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	20.804.890.914	20.804.890.914	9.177.981.081	44%	9.177.981.081
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0
500	Inversión Física	17.878.475.858	17.878.475.858	9.177.981.081	51%	9.177.981.081
520	Construcciones	17.878.475.858	17.878.475.858	9.177.981.081	51%	9.177.981.081
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	18.413.833.217	18.413.833.217	7.982.452.231	43%	7.982.452.231
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.510.558.576	1.510.558.576	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.366.558.576	1.366.558.576	0	0%	0
500	Inversión Física	15.487.418.161	15.487.418.161	7.982.452.231	52%	7.982.452.231
520	Construcciones	15.487.418.161	15.487.418.161	7.982.452.231	52%	7.982.452.231
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	14.100.000.000	14.100.000.000	6.615.927.755	47%	6.615.927.755
500	Inversión Física	14.100.000.000	14.100.000.000	6.615.927.755	47%	6.615.927.755
520	Construcciones	14.100.000.000	14.100.000.000	6.615.927.755	47%	6.615.927.755
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
500	Inversión Física	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
520	Construcciones	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
SUBTOTAL		5.398.663.665.167	5.398.663.665.167	3.041.130.870.392	56%	3.018.836.386.586
						22.294.483.806

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	70.340.169.926	70.340.169.926	44.337.223.739	63%	39.053.979.919	5.283.243.820
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	70.340.169.926	70.340.169.926	44.337.223.739	63%	39.053.979.919	5.283.243.820
800	Transferencias	70.340.169.926	70.340.169.926	44.337.223.739	63%	39.053.979.919	5.283.243.820
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	68.270.169.926	68.270.169.926	43.808.406.239	64%	38.525.162.419	5.283.243.820
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	2.070.000.000	2.070.000.000	528.817.500	26%	528.817.500	0
SUBTOTAL		70.340.169.926	70.340.169.926	44.337.223.739	63%	39.053.979.919	5.283.243.820
TOTAL ENTIDAD		7.313.463.737.009	7.313.463.737.009	4.008.425.316.408	55%	3.906.328.855.727	102.096.460.681

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 07/11/2025



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2025

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
