



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2025


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	268.897.360.285	3.922.137.651	272.819.497.936	194.943.649.789	77.875.848.147
200 Servicios No Personales	250.519.761.960	60.231.106.265	310.750.868.225	143.308.029.218	167.442.839.007
300 Bienes de Consumo e Insumos	125.784.303.975	11.942.851.521	137.727.155.496	43.907.674.086	93.819.481.410
500 Inversión Física	5.134.635.978.804	43.670.549.849	5.178.306.528.653	2.771.564.250.210	2.406.742.278.443
600 Inversión Financiera	918.443.079.476	750.000.000	919.193.079.476	899.079.680.150	20.113.399.326
700 Servicio de la Deuda Pública	6.869.325.120	0	6.869.325.120	0	6.869.325.120
800 Transferencias	432.290.446.175	44.890.910.051	477.181.356.226	414.210.712.201	62.970.644.025
900 Otros Gastos	3.968.673.812	9.676.252.065	13.644.925.877	12.374.509.773	1.270.416.104
TOTAL ENTIDAD	7.141.408.929.607	175.083.807.402	7.316.492.737.009	4.479.388.505.427	2.837.104.231.582


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 09/12/2025

Participación Presupuestaria

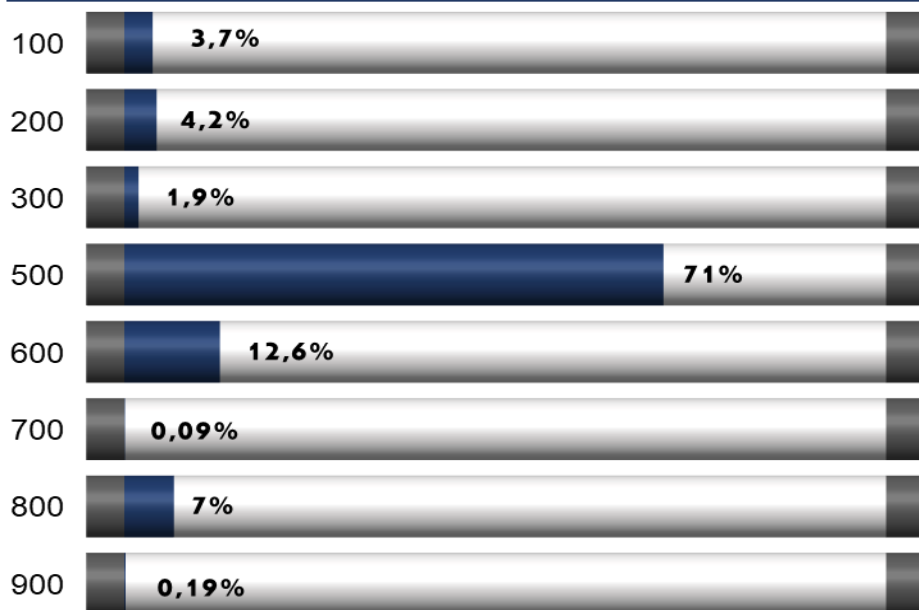


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

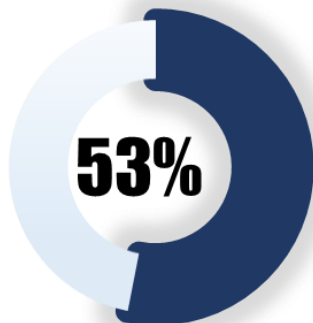


Presupuesto: ₡ 538.617.805.992
Ejecutado: ₡ 285.860.823.213

Recursos del Crédito Público

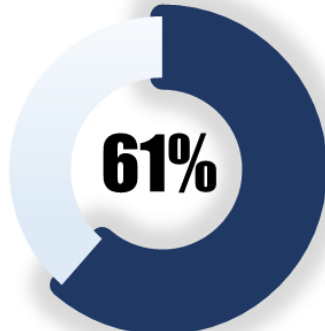

Presupuesto: ₡ 6.059.564.268.049
Ejecutado: ₡ 3.721.109.026.376

Recursos Institucionales

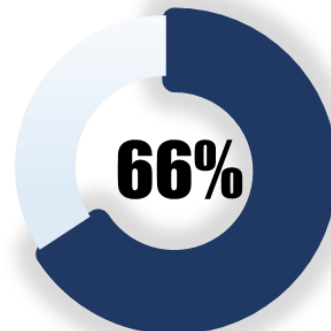

Presupuesto: ₡ 718.310.662.968
Ejecutado: ₡ 472.418.655.838

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.865.284.458.353	1.865.284.458.353	999.944.962.488	54%	902.972.647.828
01	Gestión Administrativa Financiera	405.331.667.656	405.331.667.656	234.235.669.903	58%	190.753.032.416
100	Servicios Personales	213.658.618.315	213.658.618.315	150.310.547.353	70%	34.133.442.005
110	Remuneraciones Básicas	158.309.331.895	158.309.331.895	112.660.475.764	71%	27.078.270.720
120	Remuneraciones Temporales	9.693.126.240	9.693.126.240	7.144.346.338	74%	843.437.581
130	Asignaciones Complementarias	30.668.384.844	30.668.384.844	18.970.298.490	62%	4.029.636.229
140	Personal Contratado	12.967.931.840	12.967.931.840	10.253.059.693	79%	1.882.743.813
190	Otros Gastos del Personal	2.019.843.496	2.019.843.496	1.282.367.068	63%	299.353.662
200	Servicios No Personales	112.838.375.395	112.838.375.395	66.709.384.118	59%	8.012.038.071
210	Servicios Básicos	17.818.200.000	17.818.200.000	10.152.425.649	57%	1.759.331.745
220	Transporte y Almacenaje	300.500.000	300.500.000	132.511.917	44%	2.900.000
230	Pasajes y Viáticos	7.530.169.446	7.530.169.446	4.393.190.634	58%	901.060.283
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	27.249.852.315	27.249.852.315	15.050.648.134	55%	1.515.923.103
250	Alquileres y Derechos	3.905.701.910	3.905.701.910	2.260.433.230	58%	93.333.333
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.233.271.236	12.233.271.236	5.227.140.178	43%	97.799.686
270	Servicio Social	37.830.000.488	37.830.000.488	27.139.587.011	72%	3.368.000.000
280	Otros Servicios en General	5.520.680.000	5.520.680.000	1.989.999.419	36%	126.619.615
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	450.000.000	450.000.000	363.447.946	81%	147.070.306
300	Bienes de Consumo e Insumos	29.379.860.670	29.379.860.670	6.554.562.580	22%	104.000.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.862.502.000	1.862.502.000	702.462.456	38%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.942.232.238	1.942.232.238	1.099.176.407	57%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	112.500.000	112.500.000	12.519.000	11%	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.812.976.640	20.812.976.640	4.571.254.007	22%	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.649.649.792	4.649.649.792	169.150.710	4%	104.000.000
500	Inversión Física	43.722.563.068	43.722.563.068	5.771.971.532	13%	978.394.411
520	Construcciones	21.486.374.358	21.486.374.358	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.756.500.000	8.756.500.000	2.029.379.168	23%	819.000.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.021.102.400	5.021.102.400	1.895.202.900	38%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.611.196.846	6.611.196.846	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.847.389.464	1.847.389.464	1.847.389.464	100%	159.394.411
800	Transferencias	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.064.000.000	1.064.000.000	1.059.046.787	99%	0
900	Otros Gastos	4.668.250.208	4.668.250.208	3.830.157.533	82%	254.763.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.668.250.208	4.668.250.208	3.830.157.533	82%	254.763.000
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	337.760.000.000	337.760.000.000	326.029.814.838	97%	33.199.142.114
800	Transferencias	337.760.000.000	337.760.000.000	326.029.814.838	97%	33.199.142.114
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	337.760.000.000	337.760.000.000	326.029.814.838	97%	33.199.142.114

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	9.032.909.704	9.032.909.704	5.088.434.671	56%	3.718.691.060
100	Servicios Personales	4.811.717.275	4.811.717.275	3.901.318.163	81%	720.264.841
110	Remuneraciones Básicas	2.769.857.987	2.769.857.987	2.249.744.590	81%	405.035.380
120	Remuneraciones Temporales	194.968.780	194.968.780	143.089.650	73%	18.272.216
130	Asignaciones Complementarias	842.127.784	842.127.784	707.865.048	84%	138.782.736
140	Personal Contratado	973.343.791	973.343.791	774.033.624	80%	153.340.827
190	Otros Gastos del Personal	31.418.933	31.418.933	26.585.251	85%	4.833.682
200	Servicios No Personales	2.909.568.058	2.909.568.058	934.060.958	32%	625.168.500
230	Pasajes y Viáticos	156.383.438	156.383.438	104.770.466	67%	15.829.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	198.150.000	198.150.000	104.083.092	53%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.515.034.620	2.515.034.620	695.207.400	28%	579.339.500
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	40.000.000	40.000.000	30.000.000	75%	30.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	66.419.000	66.419.000	11.395.000	17%	11.395.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	22.170.000	22.170.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.336.000	29.336.000	11.395.000	39%	11.395.000
390	Otros Bienes de Consumo	14.913.000	14.913.000	0	0%	0
500	Inversión Física	374.520.071	374.520.071	0	0%	0
520	Construcciones	50.000.000	50.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	160.000.000	160.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	120.520.000	120.520.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	44.000.071	44.000.071	0	0%	0
800	Transferencias	817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	817.052.640	817.052.640	228.745.280	28%	0
900	Otros Gastos	53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	12.915.270
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	53.632.660	53.632.660	12.915.270	24%	12.915.270
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.753.771.301	7.753.771.301	1.113.406.683	14%	1.068.217.349
100	Servicios Personales	695.270.629	695.270.629	695.270.629	100%	0
120	Remuneraciones Temporales	124.003.473	124.003.473	124.003.473	100%	0
130	Asignaciones Complementarias	437.539.416	437.539.416	437.539.416	100%	0
140	Personal Contratado	109.152.652	109.152.652	109.152.652	100%	0
190	Otros Gastos del Personal	24.575.088	24.575.088	24.575.088	100%	0
200	Servicios No Personales	2.874.410.300	2.874.410.300	387.308.054	13%	14.361.334
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	1.000.000.000	185.517.429	19%	14.361.334
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	923.000.000	923.000.000	141.100.000	15%	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	60.690.625	40%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	240.000.000	240.000.000	0	0%	0
270	Servicio Social	561.410.300	561.410.300	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	213.690.372	213.690.372	30.828.000	14%	30.828.000
320	Textiles y Vestuarios	24.000.000	24.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.699.852	26.699.852	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	57.226.000	57.226.000	30.828.000	54%	30.828.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.500.000	27.500.000	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	3.370.400.000	3.370.400.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.570.000.000	1.570.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.400.000	180.400.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
05 Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	57.401.383.834	57.401.383.834	33.332.497.208	58%	24.137.289.711	9.195.207.497
100 Servicios Personales	39.268.400.786	39.268.400.786	30.991.895.029	79%	21.946.879.920	9.045.015.109
110 Remuneraciones Básicas	34.466.421.613	34.466.421.613	27.000.035.869	78%	18.619.377.985	8.380.657.884
120 Remuneraciones Temporales	389.147.946	389.147.946	297.275.151	76%	265.696.964	31.578.187
130 Asignaciones Complementarias	3.027.973.470	3.027.973.470	2.556.926.680	84%	2.094.178.873	462.747.807
140 Personal Contratado	1.146.043.579	1.146.043.579	910.672.264	79%	747.582.168	163.090.096
190 Otros Gastos del Personal	238.814.178	238.814.178	226.985.065	95%	220.043.930	6.941.135
200 Servicios No Personales	6.870.501.951	6.870.501.951	1.004.962.219	15%	854.769.831	150.192.388
230 Pasajes y Viáticos	891.975.228	891.975.228	344.191.149	39%	322.235.241	21.955.908
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.066.517.198	4.066.517.198	498.950.000	12%	461.000.000	37.950.000
250 Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	52.639.070	35%	35.140.590	17.498.480
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.727.009.525	1.727.009.525	109.182.000	6%	36.394.000	72.788.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.123.319.001	3.123.319.001	339.051.864	11%	339.051.864	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	220.000.000	220.000.000	39.350.000	18%	39.350.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.319.001	3.319.001	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	2.900.000.000	2.900.000.000	299.701.864	10%	299.701.864	0
500 Inversión Física	8.009.714.284	8.009.714.284	964.314.284	12%	964.314.284	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.509.714.284	6.509.714.284	709.714.284	11%	709.714.284	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.500.000.000	1.500.000.000	254.600.000	17%	254.600.000	0
800 Transferencias	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	97.174.000	97.174.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.273.812	32.273.812	32.273.812	100%	32.273.812	0
06 Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.041.617.723	2.041.617.723	1.067.546.485	52%	943.166.261	124.380.224
100 Servicios Personales	872.268.723	872.268.723	721.115.254	83%	621.456.516	99.658.738
120 Remuneraciones Temporales	218.247.109	218.247.109	164.269.384	75%	147.802.128	16.467.256
130 Asignaciones Complementarias	550.125.590	550.125.590	463.270.579	84%	387.354.701	75.915.878
140 Personal Contratado	45.204.022	45.204.022	35.153.759	78%	27.878.155	7.275.604
190 Otros Gastos del Personal	58.692.002	58.692.002	58.421.532	99%	58.421.532	0
200 Servicios No Personales	619.349.000	619.349.000	346.431.231	56%	321.709.745	24.721.486
230 Pasajes y Viáticos	619.349.000	619.349.000	346.431.231	56%	321.709.745	24.721.486
500 Inversión Física	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	1.570.000.000	1.570.000.000	206.710.532	13%	206.710.532
200	Servicios No Personales	291.000.000	291.000.000	108.882.532	37%	108.882.532
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	231.000.000	231.000.000	108.882.532	47%	108.882.532
260	Servicios Técnicos y Profesionales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	229.000.000	229.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.000.000	129.000.000	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	1.050.000.000	1.050.000.000	97.828.000	9%	97.828.000
520	Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	450.000.000	450.000.000	97.828.000	22%	97.828.000
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.002.165.728	2.002.165.728	557.166.056	28%	519.531.229
200	Servicios No Personales	2.002.165.728	2.002.165.728	557.166.056	28%	519.531.229
230	Pasajes y Viáticos	195.650.000	195.650.000	178.836.510	91%	143.814.683
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.248.815.728	1.248.815.728	206.729.546	17%	204.116.546
250	Alquileres y Derechos	557.700.000	557.700.000	171.600.000	31%	171.600.000
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	99.982.860.000	99.982.860.000	1.269.983.949	1%	1.255.607.951
200	Servicios No Personales	348.043.353	348.043.353	160.484.399	46%	146.108.401
230	Pasajes y Viáticos	237.643.353	237.643.353	132.458.401	56%	132.458.401
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.400.000	110.400.000	28.025.998	25%	13.650.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	774.816.647	774.816.647	649.499.550	84%	649.499.550
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	124.816.647	124.816.647	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	650.000.000	650.000.000	649.499.550	99%	649.499.550
500	Inversión Física	98.000.000.000	98.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	86.000.000.000	86.000.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	860.000.000	860.000.000	460.000.000	53%	460.000.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	860.000.000	860.000.000	460.000.000	53%	460.000.000
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	13.397.420.406	13.397.420.406	0	0%	0
200	Servicios No Personales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	349.920.000	349.920.000	0	0%	0
500	Inversión Física	13.047.500.406	13.047.500.406	0	0%	0
520	Construcciones	13.047.500.406	13.047.500.406	0	0%	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.418.493.004	2.418.493.004	1.435.988.440	59%	1.435.988.440
100	Servicios Personales	13.721.400	13.721.400	0	0%	0
140	Personal Contratado	13.721.400	13.721.400	0	0%	0
500	Inversión Física	2.044.104.562	2.044.104.562	1.435.988.440	70%	1.435.988.440
520	Construcciones	1.600.000.000	1.600.000.000	1.435.988.440	90%	1.435.988.440
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	444.104.562	444.104.562	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	0	0%	0	0
16 Restauración de Edificios Patrimoniales	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
500 Inversión Física	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
520 Construcciones	21.738.327	21.738.327	0	0%	0	0
20 Construcción del CIRS de Emboscada	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.561.983.016	1.561.983.016	0	0%	0	0
21 SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
500 Inversión Física	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
520 Construcciones	6.944.538.090	6.944.538.090	4.843.346.140	70%	4.843.346.140	0
23 Capacitación y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.778.468.740	1.778.468.740	0	0%	0	0
24 Construcción de la Franja Costera Sur	10.634.375.555	10.634.375.555	2.118.466.367	20%	2.118.466.367	0
200 Servicios No Personales	3.290.076.945	3.290.076.945	1.740.401.270	53%	1.740.401.270	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.290.076.945	3.290.076.945	1.740.401.270	53%	1.740.401.270	0
500 Inversión Física	7.344.298.610	7.344.298.610	378.065.097	5%	378.065.097	0
520 Construcciones	6.634.125.593	6.634.125.593	378.065.097	6%	378.065.097	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	710.173.017	710.173.017	0	0%	0	0
26 Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
500 Inversión Física	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	513.565.401	513.565.401	0	0%	0	0
27 Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	7.932.975.911	7.932.975.911	3.802.113.211	48%	3.100.059.679	702.053.532
500 Inversión Física	7.928.292.511	7.928.292.511	3.802.113.211	48%	3.100.059.679	702.053.532
520 Construcciones	5.422.465.400	5.422.465.400	3.420.928.459	63%	3.100.059.679	320.868.780
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.505.827.111	2.505.827.111	381.184.752	15%	0	381.184.752
800 Transferencias	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.683.400	4.683.400	0	0%	0	0
28 Mejoramiento Intersección Tres Bocas	1.246.703.526	1.246.703.526	0	0%	0	0
500 Inversión Física	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
520 Construcciones	627.342.883	627.342.883	0	0%	0	0
800 Transferencias	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	619.360.643	619.360.643	0	0%	0	0
29 Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	235.018.201.570	235.018.201.570	148.774.779.717	63%	148.312.083.821	462.695.896
500 Inversión Física	234.802.617.641	234.802.617.641	148.666.331.131	63%	148.312.083.821	354.247.310
510 Adquisición de Inmuebles	848.128.304	848.128.304	0	0%	0	0
520 Construcciones	229.829.211.870	229.829.211.870	147.070.511.639	64%	147.070.511.639	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.125.277.467	2.125.277.467	1.595.819.492	75%	1.241.572.182	354.247.310
800 Transferencias	215.583.929	215.583.929	108.448.586	50%	0	108.448.586
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	215.583.929	215.583.929	108.448.586	50%	0	108.448.586

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	168.998.476.517	168.998.476.517	64.491.127.259	38%	64.491.127.259
500	Inversión Física	168.998.476.517	168.998.476.517	64.491.127.259	38%	64.491.127.259
520	Construcciones	168.998.476.517	168.998.476.517	64.491.127.259	38%	64.491.127.259
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	105.760.544.910	105.760.544.910	29.289.503.595	28%	848.338.883
100	Servicios Personales	3.174.156.000	3.174.156.000	2.572.046.667	81%	284.752.000
140	Personal Contratado	3.174.156.000	3.174.156.000	2.572.046.667	81%	284.752.000
200	Servicios No Personales	7.167.154.073	7.167.154.073	3.383.885.526	47%	563.586.883
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.167.154.073	7.167.154.073	3.383.885.526	47%	563.586.883
500	Inversión Física	95.025.634.837	95.025.634.837	22.939.971.402	24%	0
520	Construcciones	95.025.634.837	95.025.634.837	22.939.971.402	24%	0
800	Transferencias	393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	393.600.000	393.600.000	393.600.000	100%	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	21.647.480.719	21.647.480.719	18.793.195.038	87%	0
200	Servicios No Personales	9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	0
230	Pasajes y Viáticos	9.686.950	9.686.950	2.798.302	29%	0
500	Inversión Física	21.637.793.769	21.637.793.769	18.790.396.736	87%	0
520	Construcciones	21.637.793.769	21.637.793.769	18.790.396.736	87%	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	48.210.840.709	48.210.840.709	35.858.257.165	74%	0
200	Servicios No Personales	1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	0
230	Pasajes y Viáticos	1.313.050	1.313.050	1.313.050	100%	0
500	Inversión Física	48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	0
520	Construcciones	48.209.527.659	48.209.527.659	35.856.944.115	74%	0
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	54.622.834.376	54.622.834.376	25.717.590.862	47%	4.436.801.032
100	Servicios Personales	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	115.200.000	115.200.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	4.459.705.728	4.459.705.728	2.270.950.001	51%	203.166.667
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.459.705.728	4.459.705.728	2.270.950.001	51%	203.166.667
500	Inversión Física	48.803.363.848	48.803.363.848	23.446.640.861	48%	4.233.634.365
520	Construcciones	48.397.019.848	48.397.019.848	23.446.640.861	48%	4.233.634.365
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	6.344.000	6.344.000	0	0%	0
800	Transferencias	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	1.244.564.800	1.244.564.800	0	0%	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	14.473.302.997	14.473.302.997	240.683.333	2%	134.183.333
200	Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	240.683.333	16%	134.183.333
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	240.683.333	16%	134.183.333
500	Inversión Física	12.973.302.997	12.973.302.997	0	0%	0
520	Construcciones	12.141.302.997	12.141.302.997	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	432.000.000	432.000.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	21.172.663.862	21.172.663.862	117.750.000	1%	73.500.000	44.250.000
200	Servicios No Personales	1.500.000.000	1.500.000.000	117.750.000	8%	73.500.000	44.250.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000.000	1.500.000.000	117.750.000	8%	73.500.000	44.250.000
500	Inversión Física	19.672.663.862	19.672.663.862	0	0%	0	0
520	Construcciones	19.292.663.862	19.292.663.862	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	103.617.653.934	103.617.653.934	60.985.644.066	59%	58.655.329.841	2.330.314.225
500	Inversión Física	103.617.653.934	103.617.653.934	60.985.644.066	59%	58.655.329.841	2.330.314.225
520	Construcciones	103.617.653.934	103.617.653.934	60.985.644.066	59%	58.655.329.841	2.330.314.225
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
520	Construcciones	15.217.145.906	15.217.145.906	0	0%	0	0
54	Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	2.286.100.000	2.286.100.000	71.000.000	3%	0	71.000.000
200	Servicios No Personales	286.100.000	286.100.000	71.000.000	25%	0	71.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	286.100.000	286.100.000	71.000.000	25%	0	71.000.000
500	Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	35.264.000.000	35.264.000.000	0	0%	0	0
56	Construcción Gran Hospital General	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0%	0	0
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	9.789.043.407	9.789.043.407	504.286.970	5%	29.920.303	474.366.667
200	Servicios No Personales	2.289.043.407	2.289.043.407	504.286.970	22%	29.920.303	474.366.667
230	Pasajes y Viáticos	340.175.000	340.175.000	29.920.303	9%	29.920.303	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.948.868.407	1.948.868.407	474.366.667	24%	0	474.366.667
500	Inversión Física	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0%	0	0
58	Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	686.191.936	686.191.936	0	0%	0	0
59	Mantenimiento y Conservación de Rutas	30.637.952.000	30.637.952.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	30.637.952.000	30.637.952.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	30.637.952.000	30.637.952.000	0	0%	0	0
60	Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes	8.125.000.000	8.125.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.125.000.000	8.125.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.125.000.000	8.125.000.000	0	0%	0	0
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
62	Ampliación de la Defensa Costera de Concepción	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.899.825.458	8.899.825.458	0	0%	0	0
63	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.554.002.130	5.554.002.130	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.865.284.458.353	1.865.284.458.353	999.944.962.488	54%	902.972.647.828	96.972.314.660

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.368.215.737.227	4.368.215.737.227	2.954.951.824.944	68%	2.716.182.031.728	238.769.793.216
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	2.490.696.004	2.490.696.004	689.680.990	28%	0	689.680.990
200 Servicios No Personales		425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		425.000.000	425.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.065.696.004	2.065.696.004	689.680.990	33%	0	689.680.990
520 Construcciones		2.016.718.376	2.016.718.376	689.680.990	34%	0	689.680.990
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		48.977.628	48.977.628	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	70.858.587.497	70.858.587.497	45.363.197.206	64%	41.861.762.797	3.501.434.409
200 Servicios No Personales		516.273.149	516.273.149	65.542.369	13%	59.300.003	6.242.366
230 Pasajes y Viáticos		360.000.000	360.000.000	65.542.369	18%	59.300.003	6.242.366
260 Servicios Técnicos y Profesionales		156.273.149	156.273.149	0	0%	0	0
500 Inversión Física		61.602.314.348	61.602.314.348	37.072.800.876	60%	33.577.608.833	3.495.192.043
520 Construcciones		60.907.314.348	60.907.314.348	36.982.405.554	61%	33.551.611.657	3.430.793.897
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		695.000.000	695.000.000	90.395.322	13%	25.997.176	64.398.146
800 Transferencias		140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		140.000.000	140.000.000	16.460.000	12%	16.460.000	0
900 Otros Gastos		8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	8.208.393.961	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		8.600.000.000	8.600.000.000	8.208.393.961	95%	8.208.393.961	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	130.970.057.464	130.970.057.464	56.705.753.655	43%	55.902.461.298	803.292.357
200 Servicios No Personales		1.837.137.998	1.837.137.998	46.200.000	3%	46.200.000	0
230 Pasajes y Viáticos		17.499.999	17.499.999	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.819.637.999	1.819.637.999	46.200.000	3%	46.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e insumos		1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes De Consumo		1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		128.821.719.466	128.821.719.466	56.654.900.472	44%	55.852.901.364	801.999.108
520 Construcciones		126.183.015.700	126.183.015.700	56.462.665.808	45%	55.771.021.505	691.644.303
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión		1.852.903.766	1.852.903.766	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		782.800.000	782.800.000	192.234.664	25%	81.879.859	110.354.805
800 Transferencias		309.200.000	309.200.000	4.653.183	2%	3.359.934	1.293.249
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		309.200.000	309.200.000	4.653.183	2%	3.359.934	1.293.249
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	102.250.051.965	102.250.051.965	66.160.289.729	65%	64.916.950.438	1.243.339.291
200 Servicios No Personales		300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	43.984.063	0
230 Pasajes y Viáticos		300.000.000	300.000.000	43.984.063	15%	43.984.063	0
500 Inversión Física		101.950.051.965	101.950.051.965	66.116.305.666	65%	64.872.966.375	1.243.339.291
520 Construcciones		100.848.567.178	100.848.567.178	66.116.305.666	66%	64.872.966.375	1.243.339.291
580 Estudios y Proyectos de Inversión		1.101.484.787	1.101.484.787	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	27.294.963.139	27.294.963.139	18.862.365.158	69%	18.862.365.158	0
200 Servicios No Personales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.046.104.823	3.046.104.823	260.467.750	9%	260.467.750	0
500 Inversión Física		23.958.089.119	23.958.089.119	18.311.128.211	76%	18.311.128.211	0
520 Construcciones		18.922.176.905	18.922.176.905	13.275.215.997	70%	13.275.215.997	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		5.035.912.214	5.035.912.214	5.035.912.214	100%	5.035.912.214	0
900 Otros Gastos		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		290.769.197	290.769.197	290.769.197	100%	290.769.197	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	35.760.042.099	35.760.042.099	26.082.793.382	73%	4.593.392.871	21.489.400.511
200	Servicios No Personales	4.554.551.631	4.554.551.631	6.851.631	0,15%	6.851.631	0
230	Pasajes y Viáticos	6.851.631	6.851.631	6.851.631	100%	6.851.631	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.547.700.000	4.547.700.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	31.205.490.468	31.205.490.468	26.075.941.751	84%	4.586.541.240	21.489.400.511
520	Construcciones	28.969.286.318	28.969.286.318	23.952.554.100	83%	2.797.913.350	21.154.640.750
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.236.204.150	2.236.204.150	2.123.387.651	95%	1.788.627.890	334.759.761
12	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	54.786.750.963	54.786.750.963	14.830.641.023	27%	14.408.813.990	421.827.033
200	Servicios No Personales	2.382.731.672	2.382.731.672	481.829.647	20%	481.829.647	0
230	Pasajes y Viáticos	100.800.000	100.800.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.281.931.672	2.281.931.672	481.829.647	21%	481.829.647	0
500	Inversión Física	52.404.019.291	52.404.019.291	14.348.811.376	27%	13.926.984.343	421.827.033
520	Construcciones	52.404.019.291	52.404.019.291	14.348.811.376	27%	13.926.984.343	421.827.033
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	12.690.377.665	12.690.377.665	7.294.335.237	57%	7.196.595.162	97.740.075
200	Servicios No Personales	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	1.076.270	0
230	Pasajes y Viáticos	43.148.369	43.148.369	1.076.270	2%	1.076.270	0
500	Inversión Física	12.647.229.296	12.647.229.296	7.293.258.967	58%	7.195.518.892	97.740.075
520	Construcciones	11.737.622.474	11.737.622.474	7.293.258.967	62%	7.195.518.892	97.740.075
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	909.606.822	909.606.822	0	0%	0	0
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	22.005.711.371	22.005.711.371	4.153.399.614	19%	2.132.279.016	2.021.120.598
500	Inversión Física	22.005.711.371	22.005.711.371	4.153.399.614	19%	2.132.279.016	2.021.120.598
520	Construcciones	22.005.711.371	22.005.711.371	4.153.399.614	19%	2.132.279.016	2.021.120.598
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	91.532.637.240	91.532.637.240	65.967.028.314	72%	57.395.198.796	8.571.829.518
100	Servicios Personales	162.000.000	162.000.000	132.000.000	81%	118.800.000	13.200.000
140	Personal Contratado	162.000.000	162.000.000	132.000.000	81%	118.800.000	13.200.000
200	Servicios No Personales	3.055.000.000	3.055.000.000	8.610.160	0,28%	5.381.350	3.228.810
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	8.610.160	14%	5.381.350	3.228.810
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.995.000.000	2.995.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	88.315.637.240	88.315.637.240	65.826.418.154	75%	57.271.017.446	8.555.400.708
520	Construcciones	88.315.637.240	88.315.637.240	65.826.418.154	75%	57.271.017.446	8.555.400.708
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	103.455.146.971	103.455.146.971	56.878.664.455	55%	55.631.000.523	1.247.663.932
100	Servicios Personales	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	99.999.996	99.999.996	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	2.151.833.000	2.151.833.000	987.441.011	46%	925.857.963	61.583.048
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	5.941.011	5%	3.357.963	2.583.048
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	2.030.000.000	2.030.000.000	981.500.000	48%	922.500.000	59.000.000
290	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	1.833.000	1.833.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	101.203.313.975	101.203.313.975	55.891.223.444	55%	54.705.142.560	1.186.080.884
520	Construcciones	91.731.676.375	91.731.676.375	55.891.223.444	61%	54.705.142.560	1.186.080.884
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	9.471.637.600	9.471.637.600	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	12.744.005.486	12.744.005.486	2.385.344.876	19%	2.284.713.636	100.631.240
200	Servicios No Personales	4.216.000.000	4.216.000.000	2.385.344.876	57%	2.284.713.636	100.631.240
230	Pasajes y Viáticos	4.216.000.000	4.216.000.000	2.385.344.876	57%	2.284.713.636	100.631.240
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	8.528.005.486	8.528.005.486	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
500 Inversión Física		19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
520	Construcciones	19.411.917.717	19.411.917.717	17.519.633.220	90%	17.519.633.220	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
500 Inversión Física		2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
520	Construcciones	2.831.045.312	2.831.045.312	2.831.045.312	100%	2.831.045.312	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.016.469.604	1.016.469.604	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
500 Inversión Física		730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
520	Construcciones	730.919.821	730.919.821	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.680.609	3.680.609	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	587.795.632	587.795.632	0	0%	0	0
500 Inversión Física		587.045.632	587.045.632	0	0%	0	0
520	Construcciones	574.000.000	574.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.045.632	13.045.632	0	0%	0	0
800 Transferencias		750.000	750.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	750.000	750.000	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.601.292.249	2.601.292.249	0	0%	0	0
520	Construcciones	545.068.950	545.068.950	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.056.223.299	2.056.223.299	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	723.381.383	723.381.383	3.438.059	0,48%	0	3.438.059
500 Inversión Física		723.381.383	723.381.383	3.438.059	0,48%	0	3.438.059
520	Construcciones	719.943.324	719.943.324	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.438.059	3.438.059	3.438.059	100%	0	3.438.059
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	3.171.206.468	3.171.206.468	205.066.470	6%	146.015.806	59.050.664
500 Inversión Física		2.980.080.176	2.980.080.176	205.066.470	7%	146.015.806	59.050.664
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.980.080.176	2.980.080.176	205.066.470	7%	146.015.806	59.050.664
800 Transferencias		191.126.292	191.126.292	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	191.126.292	191.126.292	0	0%	0	0
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	955.344.736.776	955.344.736.776	902.377.908.900	94%	839.283.056.449	63.094.852.451
500 Inversión Física		34.377.157.300	34.377.157.300	2.786.033.929	8%	1.591.629.830	1.194.404.099
520	Construcciones	26.407.157.300	26.407.157.300	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.970.000.000	7.970.000.000	2.786.033.929	35%	1.591.629.830	1.194.404.099
600 Inversión Financiera		919.193.079.476	919.193.079.476	899.079.680.150	98%	837.179.231.798	61.900.448.352
630	Préstamos al Sector Privado	919.193.079.476	919.193.079.476	899.079.680.150	98%	837.179.231.798	61.900.448.352
800 Transferencias		1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.774.500.000	1.774.500.000	512.194.821	29%	512.194.821	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	6.284.919.119	6.284.919.119	2.176.837.219	35%	1.681.555.347	495.281.872
500 Inversión Física		5.273.938.065	5.273.938.065	1.871.623.844	35%	1.376.341.972	495.281.872
520	Construcciones	1.220.702.129	1.220.702.129	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.053.235.936	4.053.235.936	1.871.623.844	46%	1.376.341.972	495.281.872
800 Transferencias		1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.010.981.054	1.010.981.054	305.213.375	30%	305.213.375	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
510	Adquisiciones de Inmuebles	201.250.000	201.250.000	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.134.834.062	2.134.834.062	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	18.529.889.009	18.529.889.009	16.960.368.131	92%	16.960.368.131	0
200 Servicios No Personales		153.441.600	153.441.600	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	153.441.600	153.441.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.376.447.409	18.376.447.409	16.960.368.131	92%	16.960.368.131	0
520	Construcciones	17.871.901.824	17.871.901.824	16.708.095.339	93%	16.708.095.339	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	504.545.585	504.545.585	252.272.792	50%	252.272.792	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	27.384.117.148	27.384.117.148	7.815.459.931	29%	7.101.444.164	714.015.767
100 Servicios Personales		576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	576.000.000	576.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.646.415.638	1.646.415.638	0	0%	0	0
500 Inversión Física		25.161.701.510	25.161.701.510	7.815.459.931	31%	7.101.444.164	714.015.767
520	Construcciones	24.181.701.510	24.181.701.510	7.815.459.931	32%	7.101.444.164	714.015.767
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	980.000.000	980.000.000	0	0%	0	0
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	170.738.560.872	170.738.560.872	104.199.807.752	61%	96.951.626.470	7.248.181.282
200 Servicios No Personales		8.684.639.998	8.684.639.998	3.049.772.206	35%	2.728.418.498	321.353.708
230	Pasajes y Viáticos	24.999.998	24.999.998	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.659.640.000	8.659.640.000	3.049.772.206	35%	2.728.418.498	321.353.708
500 Inversión Física		162.053.920.874	162.053.920.874	101.150.035.546	62%	94.223.207.972	6.926.827.574
520	Construcciones	162.053.920.874	162.053.920.874	101.150.035.546	62%	94.223.207.972	6.926.827.574
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	341.170.639.028	341.170.639.028	189.852.692.223	56%	184.679.642.113	5.173.050.110
100 Servicios Personales		489.600.000	489.600.000	466.750.341	95%	466.750.341	0
140	Personal Contratado	489.600.000	489.600.000	466.750.341	95%	466.750.341	0
200 Servicios No Personales		17.589.431.119	17.589.431.119	10.645.203.015	61%	10.620.743.645	24.459.370
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	24.459.370	8%	0	24.459.370
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.289.431.119	17.289.431.119	10.620.743.645	61%	10.620.743.645	0
500 Inversión Física		323.091.607.909	323.091.607.909	178.740.738.867	55%	173.592.148.127	5.148.590.740
520	Construcciones	315.891.607.909	315.891.607.909	178.740.738.867	57%	173.592.148.127	5.148.590.740
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.200.000.000	7.200.000.000	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	227.219.371.577	227.219.371.577	161.586.995.518	71%	158.203.498.174	3.383.497.344
100 Servicios Personales		800.800.000	800.800.000	616.000.000	77%	464.560.000	151.440.000
140	Personal Contratado	800.800.000	800.800.000	616.000.000	77%	464.560.000	151.440.000
200 Servicios No Personales		1.095.023.268	1.095.023.268	64.304.040	6%	51.388.800	12.915.240
220	Transporte y Almacenaje	157.342.500	157.342.500	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	462.156.768	462.156.768	64.304.040	14%	51.388.800	12.915.240
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.524.000	475.524.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		225.323.548.309	225.323.548.309	160.906.691.478	71%	157.687.549.374	3.219.142.104
520	Construcciones	225.323.548.309	225.323.548.309	160.906.691.478	71%	157.687.549.374	3.219.142.104

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
500	Inversión Física	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
520	Construcciones	1.461.600.180	1.461.600.180	0	0%	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0
500	Inversión Física	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0
520	Construcciones	1.227.405.990	1.227.405.990	0	0%	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
500	Inversión Física	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
520	Construcciones	2.112.646.004	2.112.646.004	0	0%	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
500	Inversión Física	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
520	Construcciones	664.580.709	664.580.709	0	0%	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	998.394.677	998.394.677	0	0%	0
500	Inversión Física	998.394.677	998.394.677	0	0%	0
520	Construcciones	998.394.677	998.394.677	0	0%	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	316.427.504	316.427.504	0	0%	0
500	Inversión Física	316.427.504	316.427.504	0	0%	0
520	Construcciones	316.427.504	316.427.504	0	0%	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
500	Inversión Física	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
520	Construcciones	4.773.398.644	4.773.398.644	0	0%	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
500	Inversión Física	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
520	Construcciones	1.461.065.770	1.461.065.770	0	0%	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	1.248.000.000	1.248.000.000	0	0%	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
500	Inversión Física	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
520	Construcciones	25.775.574.890	25.775.574.890	4.479.367.591	17%	4.479.367.591
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
500	Inversión Física	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
520	Construcciones	973.610.590	973.610.590	0	0%	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	273.819.159.508	273.819.159.508	143.416.865.398	52%	137.555.008.173
200	Servicios No Personales	3.295.405.000	3.295.405.000	63.525.000	2%	60.500.000
230	Pasajes y Viáticos	12.500.000	12.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.282.905.000	3.282.905.000	63.525.000	2%	60.500.000
500	Inversión Física	264.643.754.508	264.643.754.508	139.141.933.957	53%	133.286.566.732
520	Construcciones	233.051.754.508	233.051.754.508	121.139.063.295	52%	117.682.627.513
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	31.592.000.000	31.592.000.000	18.002.870.662	57%	15.603.939.219
800	Transferencias	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.207.941.441
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.880.000.000	5.880.000.000	4.211.406.441	72%	4.207.941.441

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	25.317.411.970	25.317.411.970	14.353.371.129	57%	10.947.952.030	3.405.419.099
200 Servicios No Personales		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.499.411.970	24.499.411.970	14.123.806.456	58%	10.718.387.357	3.405.419.099
520	Construcciones	23.214.300.000	23.214.300.000	13.214.251.763	57%	9.851.487.235	3.362.764.528
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.285.111.970	1.285.111.970	909.554.693	71%	866.900.122	42.654.571
800 Transferencias		718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	229.564.673	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	718.000.000	718.000.000	229.564.673	32%	229.564.673	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	75.325.634.558	75.325.634.558	39.641.544.788	53%	38.621.330.708	1.020.214.080
200 Servicios No Personales		864.000.000	864.000.000	70.400.000	8%	0	70.400.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	864.000.000	864.000.000	70.400.000	8%	0	70.400.000
500 Inversión Física		74.461.634.558	74.461.634.558	39.571.144.788	53%	38.621.330.708	949.814.080
520	Construcciones	67.930.634.558	67.930.634.558	39.571.144.788	58%	38.621.330.708	949.814.080
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.112.000.000	2.112.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.419.000.000	4.419.000.000	0	0%	0	0
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	86.018.420.703	86.018.420.703	66.021.009.652	77%	56.919.571.456	9.101.438.196
200 Servicios No Personales		2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.014.308.815	2.014.308.815	0	0%	0	0
500 Inversión Física		84.004.111.888	84.004.111.888	66.021.009.652	79%	56.919.571.456	9.101.438.196
520	Construcciones	80.088.111.888	80.088.111.888	65.768.609.719	82%	56.919.571.456	8.849.038.263
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.152.000.000	1.152.000.000	252.399.933	22%	0	252.399.933
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.764.000.000	2.764.000.000	0	0%	0	0
84	Construcción y Mejoramiento Zona Franca Concepción	21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0	0
520	Construcciones	21.332.635.946	21.332.635.946	0	0%	0	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	19.318.072.000	19.318.072.000	19.000.000.000	98%	7.000.000.000	12.000.000.000
500 Inversión Física		19.318.072.000	19.318.072.000	19.000.000.000	98%	7.000.000.000	12.000.000.000
520	Construcciones	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	100%	7.000.000.000	12.000.000.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	318.072.000	318.072.000	0	0%	0	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	68.223.044.095	68.223.044.095	63.614.556.461	93%	53.632.489.623	9.982.066.838
500 Inversión Física		68.223.044.095	68.223.044.095	63.614.556.461	93%	53.632.489.623	9.982.066.838
520	Construcciones	68.223.044.095	68.223.044.095	63.614.556.461	93%	53.632.489.623	9.982.066.838
89	SP AP. Pre Prog. de Mod. del Sec. Tra. Py ATN/0C-11921-PR	351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	351.120.000	351.120.000	0	0%	0	0
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0	0
500 Inversión Física		44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0	0
520	Construcciones	44.643.760.981	44.643.760.981	0	0%	0	0
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	133.728.073.297	133.728.073.297	69.709.952.185	52%	66.208.195.056	3.501.757.129
200 Servicios No Personales		1.960.015.936	1.960.015.936	289.974.334	15%	289.974.334	0
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.925.015.936	1.925.015.936	289.974.334	15%	289.974.334	0
500 Inversión Física		127.928.057.361	127.928.057.361	68.774.633.644	54%	65.274.090.915	3.500.542.729
520	Construcciones	117.311.576.561	117.311.576.561	64.780.658.320	55%	64.561.740.145	218.918.175
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	10.616.480.800	10.616.480.800	3.993.975.324	38%	712.350.770	3.281.624.554

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	644.129.807	1.214.400
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.840.000.000	3.840.000.000	645.344.207	17%	644.129.807	1.214.400
93 Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	370.944.617.230	370.944.617.230	325.173.496.539	88%	286.436.476.293	38.737.020.246
100 Servicios Personales	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	288.000.000	288.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	369.656.617.230	369.656.617.230	325.173.496.539	88%	286.436.476.293	38.737.020.246
520 Construcciones	366.808.617.230	366.808.617.230	325.173.496.539	89%	286.436.476.293	38.737.020.246
580 Estudios y Proyectos de Inversión	2.128.000.000	2.128.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
94 Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	249.075.266.053	249.075.266.053	151.900.566.486	61%	151.817.231.612	83.334.874
100 Servicios Personales	811.000.000	811.000.000	459.000.000	57%	412.000.000	47.000.000
140 Personal Contratado	747.000.000	747.000.000	395.000.000	53%	348.000.000	47.000.000
190 Otros Gastos del Personal	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100%	64.000.000	0
200 Servicios No Personales	1.386.000.000	1.386.000.000	93.936.843	7%	57.601.969	36.334.874
230 Pasajes y Viáticos	250.000.000	250.000.000	93.936.843	38%	57.601.969	36.334.874
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.136.000.000	1.136.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	245.918.266.053	245.918.266.053	151.347.629.643	62%	151.347.629.643	0
520 Construcciones	245.918.266.053	245.918.266.053	151.347.629.643	62%	151.347.629.643	0
800 Transferencias	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
95 Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	361.110.195.294	361.110.195.294	191.035.876.210	53%	163.815.480.251	27.220.395.959
100 Servicios Personales	1.382.670.024	1.382.670.024	1.152.225.020	83%	1.037.002.518	115.222.502
140 Personal Contratado	1.382.670.024	1.382.670.024	1.152.225.020	83%	1.037.002.518	115.222.502
200 Servicios No Personales	1.578.000.000	1.578.000.000	225.601.133	14%	197.747.266	27.853.867
230 Pasajes y Viáticos	200.000.000	200.000.000	148.761.133	74%	120.907.266	27.853.867
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.378.000.000	1.378.000.000	76.840.000	6%	76.840.000	0
500 Inversión Física	358.149.525.270	358.149.525.270	189.658.050.057	53%	162.580.730.467	27.077.319.590
520 Construcciones	344.849.525.270	344.849.525.270	189.658.050.057	55%	162.580.730.467	27.077.319.590
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0%	0	0
96 SP. Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari- Carapegúa - Quiindy - Caap	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
500 Inversión Física	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
590 Gastos de Inversión y Reparac Mayores	544.888.302	544.888.302	0	0%	0	0
98 Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.224.289.044	0
500 Inversión Física	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.224.289.044	0
520 Construcciones	17.000.000.000	17.000.000.000	12.224.289.044	72%	12.224.289.044	0
99 Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	133.525.678.082	133.525.678.082	83.478.183.087	63%	75.981.221.020	7.496.962.067
200 Servicios No Personales	32.578.000.000	32.578.000.000	22.356.838.753	69%	22.282.425.446	74.413.307
230 Pasajes y Viáticos	2.900.000.000	2.900.000.000	500.923.439	17%	426.510.132	74.413.307
260 Servicios Técnicos y Profesionales	29.678.000.000	29.678.000.000	21.855.915.314	74%	21.855.915.314	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	24.897.843.471	24.897.843.471	10.529.100.000	42%	10.529.100.000	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	10.200.000.000	10.200.000.000	2.858.350.000	28%	2.858.350.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	14.597.843.471	14.597.843.471	7.670.750.000	53%	7.670.750.000	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	34.087.760.851	34.087.760.851	19.139.868.374	56%	19.139.868.374	0
520 Construcciones	34.087.760.851	34.087.760.851	19.139.868.374	56%	19.139.868.374	0
800 Transferencias	41.962.073.760	41.962.073.760	31.452.375.960	75%	24.029.827.200	7.422.548.760
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.580.000.000	11.580.000.000	2.171.227.200	19%	2.171.227.200	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	30.382.073.760	30.382.073.760	29.281.148.760	96%	21.858.600.000	7.422.548.760
002 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	646.318.072.641	646.318.072.641	397.744.506.144	62%	368.715.394.468	29.029.111.676
01 SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
500 Inversión Física	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
520 Construcciones	97.142.475	97.142.475	17.591.507	18%	17.591.507	0
02 Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
520 Construcciones	464.813.676	464.813.676	0	0%	0	0
03 Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	3.544.362.494	3.544.362.494	2.392.175.638	67%	2.392.175.638	0
200 Servicios No Personales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000.000	3.000.000.000	1.848.016.758	62%	1.848.016.758	0
500 Inversión Física	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
520 Construcciones	544.362.494	544.362.494	544.158.880	99%	544.158.880	0
04 Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	47.655.939.261	47.655.939.261	36.550.544.531	77%	29.010.506.970	7.540.037.561
100 Servicios Personales	2.583.170.000	2.583.170.000	1.949.998.000	75%	1.334.148.000	615.850.000
140 Personal Contratado	2.583.170.000	2.583.170.000	1.949.998.000	75%	1.334.148.000	615.850.000
200 Servicios No Personales	7.924.871.040	7.924.871.040	5.612.302.469	71%	5.612.302.469	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	7.924.871.040	7.924.871.040	5.612.302.469	71%	5.612.302.469	0
500 Inversión Física	37.147.898.221	37.147.898.221	28.988.244.062	78%	22.064.056.501	6.924.187.561
520 Construcciones	36.041.857.122	36.041.857.122	27.882.202.965	77%	20.958.015.404	6.924.187.561
580 Estudios y Proyectos de Inversión	1.106.041.099	1.106.041.099	1.106.041.097	99%	1.106.041.097	0
07 Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.546.133.008	1.546.133.008	1.514.834.965	98%	1.504.718.027	10.116.938
200 Servicios No Personales	1.363.584.472	1.363.584.472	1.332.286.429	98%	1.322.169.491	10.116.938
230 Pasejes y Viáticos	1.361.500.000	1.361.500.000	1.332.286.429	98%	1.322.169.491	10.116.938
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.084.472	2.084.472	0	0%	0	0
500 Inversión Física	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
520 Construcciones	182.548.536	182.548.536	182.548.536	100%	182.548.536	0
11 Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	87.964.010.469	87.964.010.469	65.673.843.294	75%	63.149.207.576	2.524.635.718
200 Servicios No Personales	5.753.613.077	5.753.613.077	3.106.097.114	54%	2.029.581.359	1.076.515.755
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.753.613.077	5.753.613.077	3.106.097.114	54%	2.029.581.359	1.076.515.755
500 Inversión Física	82.210.397.392	82.210.397.392	62.567.746.180	76%	61.119.626.217	1.448.119.963
520 Construcciones	81.897.695.129	81.897.695.129	62.377.246.180	76%	60.929.126.217	1.448.119.963
580 Estudios y Proyectos de Inversión	304.800.000	304.800.000	190.500.000	63%	190.500.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.902.263	7.902.263	0	0%	0	0
12 Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	122.574.035.629	122.574.035.629	52.044.578.291	42%	46.115.101.572	5.929.476.719
200 Servicios No Personales	17.491.919.300	17.491.919.300	9.109.566.919	52%	7.791.175.491	1.318.391.428
220 Transporte y Almacenaje	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
230 Pasejes y Viáticos	11.491.919.300	11.491.919.300	9.109.566.919	79%	7.791.175.491	1.318.391.428
240 Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	70.512.200.849	70.512.200.849	25.793.237.092	37%	24.438.198.319	1.355.038.773
320 Textiles y Vestuarios	105.000.000	105.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.300.000.000	4.300.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	56.000.000.000	56.000.000.000	22.619.353.253	40%	21.710.640.049	908.713.204
390 Otros Bienes de Consumo	10.107.200.849	10.107.200.849	3.173.883.839	31%	2.727.558.270	446.325.569
500 Inversión Física	34.569.915.480	34.569.915.480	17.141.774.280	50%	13.885.727.762	3.256.046.518
520 Construcciones	25.677.915.480	25.677.915.480	17.141.774.280	67%	13.885.727.762	3.256.046.518
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.692.000.000	4.692.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0%	0	0
15 Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú	48	48	0	0%	0	0
500 Inversión Física	48	48	0	0%	0	0
520 Construcciones	48	48	0	0%	0	0
16 Construcción Cam. Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
500 Inversión Física	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
520 Construcciones	236.793.677	236.793.677	0	0%	0	0
18 Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	41.643.305.955	41.643.305.955	21.460.097.128	52%	20.580.627.640	879.469.488
500 Inversión Física	41.643.305.955	41.643.305.955	21.460.097.128	52%	20.580.627.640	879.469.488
520 Construcciones	41.643.305.955	41.643.305.955	21.460.097.128	52%	20.580.627.640	879.469.488
19 Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	38.945.740.078	38.945.740.078	22.837.665.428	59%	22.837.665.428	0
500 Inversión Física	38.945.740.078	38.945.740.078	22.837.665.428	59%	22.837.665.428	0
520 Construcciones	38.945.740.078	38.945.740.078	22.837.665.428	59%	22.837.665.428	0
20 Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	38.662.468.358	38.662.468.358	21.411.701.215	55%	21.411.701.215	0
500 Inversión Física	38.662.468.358	38.662.468.358	21.411.701.215	55%	21.411.701.215	0
520 Construcciones	38.662.468.358	38.662.468.358	21.411.701.215	55%	21.411.701.215	0
21 Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	18.174.231.355	18.174.231.355	10.820.831.310	60%	8.960.833.622	1.859.997.688
500 Inversión Física	18.174.231.355	18.174.231.355	10.820.831.310	60%	8.960.833.622	1.859.997.688
520 Construcciones	18.174.231.355	18.174.231.355	10.820.831.310	60%	8.960.833.622	1.859.997.688
22 Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	15.757.084.249	15.757.084.249	9.583.271.880	61%	8.804.799.586	778.472.294
500 Inversión Física	15.757.084.249	15.757.084.249	9.583.271.880	61%	8.804.799.586	778.472.294
520 Construcciones	15.757.084.249	15.757.084.249	9.583.271.880	61%	8.804.799.586	778.472.294
23 Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	31.758.955.951	31.758.955.951	18.810.189.190	59%	18.810.189.190	0
500 Inversión Física	31.758.955.951	31.758.955.951	18.810.189.190	59%	18.810.189.190	0
520 Construcciones	31.758.955.951	31.758.955.951	18.810.189.190	59%	18.810.189.190	0
24 Mejoramiento de Caminos Distritales de Guaramaré	4.900.691.266	4.900.691.266	2.705.207.824	55%	2.240.208.402	464.999.422
500 Inversión Física	4.900.691.266	4.900.691.266	2.705.207.824	55%	2.240.208.402	464.999.422
520 Construcciones	4.900.691.266	4.900.691.266	2.705.207.824	55%	2.240.208.402	464.999.422
27 Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"	47.941.807.501	47.941.807.501	36.521.585.407	76%	33.819.983.565	2.701.601.842
500 Inversión Física	47.941.807.501	47.941.807.501	36.521.585.407	76%	33.819.983.565	2.701.601.842
520 Construcciones	47.941.807.501	47.941.807.501	36.521.585.407	76%	33.819.983.565	2.701.601.842
29 Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	29.384.670.602	29.384.670.602	18.732.179.551	64%	18.732.179.551	0
500 Inversión Física	29.384.670.602	29.384.670.602	18.732.179.551	64%	18.732.179.551	0
520 Construcciones	29.384.670.602	29.384.670.602	18.732.179.551	64%	18.732.179.551	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	36.735.427.725	36.735.427.725	24.635.427.724	67%	24.635.427.724
500	Inversión Física	36.735.427.725	36.735.427.725	24.635.427.724	67%	24.635.427.724
520	Construcciones	36.735.427.725	36.735.427.725	24.635.427.724	67%	24.635.427.724
31	Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	18.937.402.576	18.937.402.576	13.013.918.709	69%	12.898.706.649
500	Inversión Física	18.937.402.576	18.937.402.576	13.013.918.709	69%	12.898.706.649
520	Construcciones	18.937.402.576	18.937.402.576	13.013.918.709	69%	12.898.706.649
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	57.763.556.288	57.763.556.288	39.018.862.552	68%	32.793.770.606
500	Inversión Física	57.763.556.288	57.763.556.288	39.018.862.552	68%	32.793.770.606
520	Construcciones	57.763.556.288	57.763.556.288	39.018.862.552	68%	32.793.770.606
36	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itaguá	435.500.000	435.500.000	0	0%	0
500	Inversión Física	435.500.000	435.500.000	0	0%	0
520	Construcciones	435.500.000	435.500.000	0	0%	0
37	Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré	495.000.000	495.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	495.000.000	495.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	495.000.000	495.000.000	0	0%	0
38	Mejoramiento de Caminos Distritales de Ypacaraí	216.000.000	216.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	216.000.000	216.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	216.000.000	216.000.000	0	0%	0
39	Mejoramiento de Caminos Distritales de Luque	223.000.000	223.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	223.000.000	223.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	223.000.000	223.000.000	0	0%	0
44	Mejoramiento de Caminos Distritales de Presidente Hayes	260.000.000	260.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	260.000.000	260.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	260.000.000	260.000.000	0	0%	0
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	363.305.298.862	363.305.298.862	78.193.367.801	22%	74.137.678.503
01	SP Proyecto Acueducto	13.487.527	13.487.527	8.610.160	64%	8.610.160
200	Servicios No Personales	9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160
230	Pasejes y Viáticos	9.000.000	9.000.000	8.610.160	96%	8.610.160
500	Inversión Física	4.487.527	4.487.527	0	0%	0
520	Construcciones	4.487.527	4.487.527	0	0%	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	31.406.764.427	31.406.764.427	15.294.969.913	49%	13.058.289.379
100	Servicios Personales	975.312.852	975.312.852	630.633.333	65%	570.633.333
140	Personal Contratado	975.312.852	975.312.852	630.633.333	65%	570.633.333
200	Servicios No Personales	1.635.000.000	1.635.000.000	597.122.638	37%	597.122.638
230	Pasejes y Viáticos	460.000.000	460.000.000	312.871.689	68%	312.871.689
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.175.000.000	1.175.000.000	284.250.949	24%	284.250.949
500	Inversión Física	28.796.451.575	28.796.451.575	14.067.213.942	49%	11.890.533.408
520	Construcciones	28.796.451.575	28.796.451.575	14.067.213.942	49%	11.890.533.408
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	32.784.751.271	32.784.751.271	6.716.393.062	20%	6.716.393.062
200	Servicios No Personales	480.000.000	480.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	480.000.000	480.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	32.304.751.271	32.304.751.271	6.716.393.062	21%	6.716.393.062
520	Construcciones	32.304.751.271	32.304.751.271	6.716.393.062	21%	6.716.393.062

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	19.674.921.234	19.674.921.234	6.460.987.318	33%	1.210.933.153
200	Servicios No Personales	1.556.313.080	1.556.313.080	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.556.313.080	1.556.313.080	0	0%	0
500	Inversión Física	18.118.608.154	18.118.608.154	6.460.987.318	36%	1.210.933.153
520	Construcciones	18.118.608.154	18.118.608.154	6.460.987.318	36%	1.210.933.153
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	62.469.736.001	62.469.736.001	2.079.850.000	3%	337.700.000
100	Servicios Personales	376.200.000	376.200.000	344.850.000	92%	62.700.000
130	Asignaciones Complementarias	376.200.000	376.200.000	344.850.000	92%	62.700.000
200	Servicios No Personales	6.146.215.840	6.146.215.840	1.735.000.000	28%	275.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.146.215.840	6.146.215.840	1.735.000.000	28%	275.000.000
500	Inversión Física	54.870.920.161	54.870.920.161	0	0%	0
520	Construcciones	54.870.920.161	54.870.920.161	0	0%	0
800	Transferencias	1.076.400.000	1.076.400.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.076.400.000	1.076.400.000	0	0%	0
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	76.412.638.835	76.412.638.835	0	0%	0
200	Servicios No Personales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.504.001.254	12.504.001.254	0	0%	0
500	Inversión Física	63.908.637.581	63.908.637.581	0	0%	0
510	Adquisición de Inmuebles	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	56.408.637.581	56.408.637.581	0	0%	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	42.642.167.399	42.642.167.399	0	0%	0
100	Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.423.881.304	3.423.881.304	0	0%	0
500	Inversión Física	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0
520	Construcciones	33.116.386.895	33.116.386.895	0	0%	0
700	Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	5.122.699.200	5.122.699.200	0	0%	0
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	22.702.078.556	22.702.078.556	12.108.361.585	53%	188.545.959
200	Servicios No Personales	810.258.226	810.258.226	188.545.959	23%	188.545.959
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	666.258.226	666.258.226	188.545.959	28%	188.545.959
500	Inversión Física	21.455.163.850	21.455.163.850	11.919.815.626	56%	0
520	Construcciones	21.455.163.850	21.455.163.850	11.919.815.626	56%	0
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	16.170.339.015	16.170.339.015	8.723.424.309	54%	8.723.424.309
200	Servicios No Personales	810.258.226	810.258.226	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	666.258.226	666.258.226	0	0%	0
500	Inversión Física	14.923.424.309	14.923.424.309	8.723.424.309	58%	8.723.424.309
520	Construcciones	14.923.424.309	14.923.424.309	8.723.424.309	58%	8.723.424.309
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	18.639.766.400	18.639.766.400	9.259.810.733	50%	9.177.981.081
200	Servicios No Personales	810.258.226	810.258.226	81.829.652	10%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	666.258.226	666.258.226	81.829.652	12%	81.829.652
500	Inversión Física	17.392.851.694	17.392.851.694	9.177.981.081	53%	9.177.981.081
520	Construcciones	17.392.851.694	17.392.851.694	9.177.981.081	53%	9.177.981.081
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	11.539.369.937	11.539.369.937	7.982.452.231	69%	7.982.452.231
200	Servicios No Personales	810.258.226	810.258.226	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	144.000.000	144.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	666.258.226	666.258.226	0	0%	0
500	Inversión Física	10.292.455.231	10.292.455.231	7.982.452.231	78%	7.982.452.231
520	Construcciones	10.292.455.231	10.292.455.231	7.982.452.231	78%	7.982.452.231
700	Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda Pública	436.656.480	436.656.480	0	0%	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	18.844.278.260	18.844.278.260	6.615.927.755	35%	6.615.927.755
500	Inversión Física	18.844.278.260	18.844.278.260	6.615.927.755	35%	6.615.927.755
520	Construcciones	18.844.278.260	18.844.278.260	6.615.927.755	35%	6.615.927.755
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
500	Inversión Física	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
520	Construcciones	10.005.000.000	10.005.000.000	2.942.580.735	29%	2.942.580.735
SUBTOTAL		5.377.839.108.730	5.377.839.108.730	3.430.889.698.889	64%	3.159.035.104.699

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	73.369.169.926	73.369.169.926	48.553.844.050	66%	42.350.085.860
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	73.369.169.926	73.369.169.926	48.553.844.050	66%	42.350.085.860
800	Transferencias	73.369.169.926	73.369.169.926	48.553.844.050	66%	42.350.085.860
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	71.199.169.926	71.199.169.926	47.924.801.793	67%	41.821.268.360
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	2.170.000.000	2.170.000.000	629.042.257	29%	528.817.500
SUBTOTAL		73.369.169.926	73.369.169.926	48.553.844.050	66%	42.350.085.860
TOTAL ENTIDAD		7.316.492.737.009	7.316.492.737.009	4.479.388.505.427	61%	4.104.357.838.387

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 09/12/2025

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2025

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
