



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	281.479.936.524	0	281.479.936.524	52.107.495.436	229.372.441.088
200 Servicios No Personales	311.436.518.621	-9.762.855.505	301.673.663.116	32.249.774.040	269.423.889.076
300 Bienes de Consumo e Insumos	87.049.682.064	13.935.557.574	100.985.239.638	2.871.861.737	98.113.377.901
500 Inversión Física	4.766.576.936.854	-4.651.844.439	4.761.925.092.415	793.033.102.963	3.968.891.989.452
600 Inversión Financiera	981.768.260.335	0	981.768.260.335	346.189.320.071	635.578.940.264
800 Transferencias	493.332.906.252	479.142.370	493.812.048.622	140.861.419.140	352.950.629.482
900 Otros Gastos	6.417.045.000	0	6.417.045.000	1.894.297.694	4.522.747.306
TOTAL ENTIDAD	6.928.061.285.650	0	6.928.061.285.650	1.369.207.271.081	5.558.854.014.569


Fuente: MEF - SIAF, cifras al 10/04/2026 * Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

Participación Presupuestaria

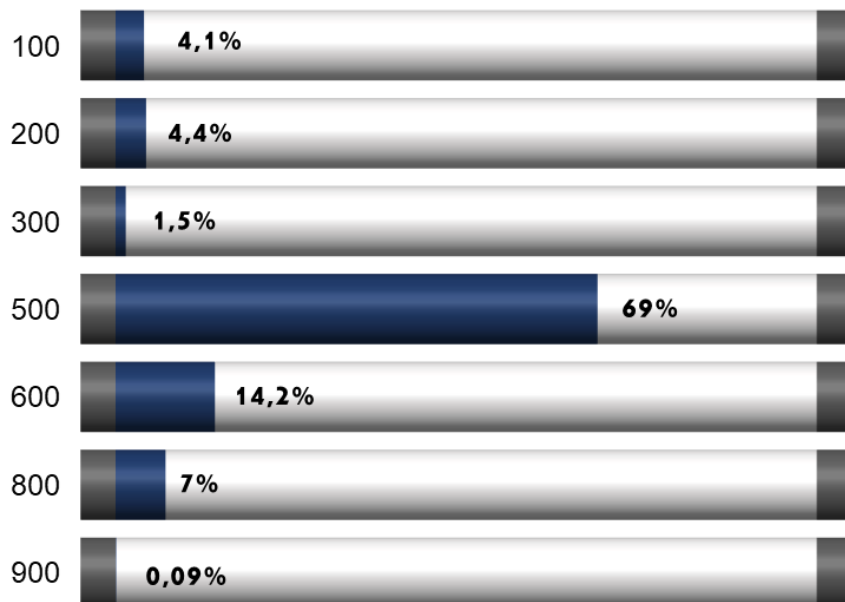


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

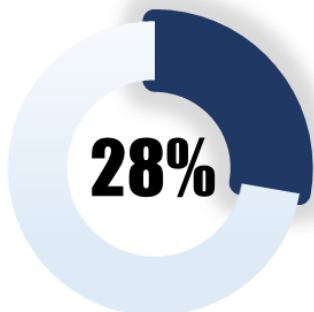


Presupuesto: ₡ 634.150.068.701
Ejecutado: ₡ 175.985.386.318

Recursos del Crédito Público

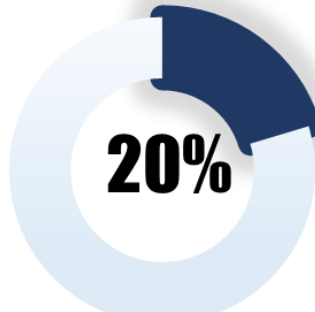

Presupuesto: ₡ 5.491.711.357.834
Ejecutado: ₡ 1.117.427.134.126

Recursos Institucionales

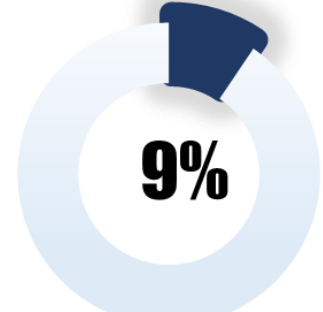

Presupuesto: ₡ 802.199.859.115
Ejecutado: ₡ 75.794.750.637

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.564.452.292.649	1.607.414.868.742	435.319.716.324	27%	233.730.613.694	201.589.102.630
01	Gestión Administrativa Financiera	402.355.397.220	402.355.397.220	68.018.735.643	17%	18.102.920.987	49.915.814.656
100 Servicios Personales		209.954.730.549	209.954.730.549	41.736.273.874	20%	184.340.000	41.551.933.874
110	Remuneraciones Básicas	157.767.348.011	157.767.348.011	31.309.875.301	20%	0	31.309.875.301
120	Remuneraciones Temporales	12.232.766.933	12.232.766.933	1.201.286.899	10%	0	1.201.286.899
130	Asignaciones Complementarias	26.306.369.064	26.306.369.064	6.072.583.563	23%	0	6.072.583.563
140	Personal Contratado	12.119.144.928	12.119.144.928	2.810.543.102	23%	184.340.000	2.626.203.102
190	Otros Gastos del Personal	1.529.101.613	1.529.101.613	341.985.009	22%	0	341.985.009
200 Servicios No Personales		100.391.893.517	100.391.893.517	23.938.254.545	24%	16.899.997.987	7.038.256.558
210	Servicios Básicos	10.267.000.000	10.267.000.000	7.410.530.172	72%	6.050.692.986	1.359.837.186
220	Transporte y Almacenaje	784.478.556	784.478.556	81.980.318	10%	81.980.318	0
230	Pasajes y Viáticos	5.738.095.961	5.738.095.961	945.045.685	16%	120.702.668	824.343.017
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	27.286.000.000	27.286.000.000	1.916.574.279	7%	1.317.873.496	598.700.783
250	Alquileres y Derechos	3.365.360.000	3.365.360.000	186.666.666	6%	186.666.666	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.238.959.000	14.238.959.000	685.387.969	5%	679.699.549	5.688.420
270	Servicio Social	30.000.000.000	30.000.000.000	10.035.000.000	33%	6.695.000.000	3.340.000.000
280	Otros Servicios en General	8.217.000.000	8.217.000.000	2.677.069.456	33%	1.767.382.304	909.687.152
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		38.569.939.324	38.569.939.324	74.637.000	0,19%	43.727.000	30.910.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.392.239.324	1.392.239.324	19.160.000	1%	0	19.160.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.841.300.000	5.841.300.000	55.477.000	1%	43.727.000	11.750.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	23.206.400.000	23.206.400.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.990.000.000	7.990.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		47.064.063.421	47.064.063.421	375.737.500	1%	0	375.737.500
520	Construcciones	12.000.000.000	12.000.000.000	375.737.500	3%	0	375.737.500
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.784.063.421	10.784.063.421	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.860.000.000	3.860.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	20.420.000.000	20.420.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		6.374.770.409	6.374.770.409	1.893.832.724	30%	974.856.000	918.976.724
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	6.374.770.409	6.374.770.409	1.893.832.724	30%	974.856.000	918.976.724
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	364.844.000.000	364.844.000.000	123.156.132.078	34%	73.519.634.609	49.636.497.469
800 Transferencias		364.844.000.000	364.844.000.000	123.156.132.078	34%	73.519.634.609	49.636.497.469
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		364.844.000.000	364.844.000.000	123.156.132.078	34%	73.519.634.609	49.636.497.469
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	9.294.653.007	9.294.653.007	1.165.585.349	13%	19.300.979	1.146.284.370
100 Servicios Personales		6.683.956.520	6.683.956.520	1.136.479.223	17%	17.221.604	1.119.257.619
110	Remuneraciones Básicas	3.452.259.564	3.452.259.564	673.904.964	20%	0	673.904.964
120	Remuneraciones Temporales	135.624.300	135.624.300	30.432.730	22%	0	30.432.730
130	Asignaciones Complementarias	831.823.512	831.823.512	201.025.624	24%	0	201.025.624
140	Personal Contratado	2.121.249.120	2.121.249.120	226.771.422	11%	17.221.604	209.549.818
190	Otros Gastos del Personal	143.000.024	143.000.024	4.344.483	3%	0	4.344.483

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	1.610.848.104	1.610.848.104	28.641.156	2%	1.614.405	27.026.751
230 Pasajes y Viáticos	144.419.604	144.419.604	9.059.891	6%	1.614.405	7.445.486
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	269.428.500	269.428.500	19.581.265	7%	0	19.581.265
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.197.000.000	1.197.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	136.298.113	136.298.113	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	6.917.625	6.917.625	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	41.748.300	41.748.300	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	87.632.188	87.632.188	0	0%	0	0
500 Inversión Física	374.407.900	374.407.900	0	0%	0	0
520 Construcciones	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	237.307.900	237.307.900	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	42.100.000	42.100.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	479.142.370	479.142.370	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	479.142.370	479.142.370	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	464.970	5%	464.970	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	464.970	5%	464.970	0
04 Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.861.880.753	7.861.880.753	300.206.700	4%	0	300.206.700
100 Servicios Personales	3.278.262.156	3.278.262.156	300.206.700	9%	0	300.206.700
110 Remuneraciones Básicas	1.300.895.700	1.300.895.700	300.206.700	23%	0	300.206.700
120 Remuneraciones Temporales	394.767.132	394.767.132	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	758.482.956	758.482.956	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	661.265.364	661.265.364	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	162.851.004	162.851.004	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.204.882.484	2.204.882.484	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	990.000.000	990.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	878.282.484	878.282.484	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	188.100.000	188.100.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	212.336.113	212.336.113	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	23.760.000	23.760.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.432.853	26.432.853	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	56.653.740	56.653.740	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	27.225.000	27.225.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.626.400.000	1.626.400.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	306.400.000	306.400.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	540.000.000	540.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	540.000.000	540.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	60.258.708.831	60.258.708.831	10.338.739.849	17%	1.178.370.140	9.160.369.709
100 Servicios Personales		42.084.437.694	42.084.437.694	8.484.249.713	20%	11.225.124	8.473.024.589
110	Remuneraciones Básicas	34.928.058.685	34.928.058.685	7.449.165.464	21%	0	7.449.165.464
120	Remuneraciones Temporales	1.082.042.724	1.082.042.724	53.014.707	5%	0	53.014.707
130	Asignaciones Complementarias	3.200.000.004	3.200.000.004	730.000.073	23%	0	730.000.073
140	Personal Contratado	2.756.987.940	2.756.987.940	252.069.469	9%	11.225.124	240.844.345
190	Otros Gastos del Personal	117.348.341	117.348.341	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		7.422.146.518	7.422.146.518	210.467.715	3%	178.764.130	31.703.585
230	Pasajes y Viáticos	1.078.038.720	1.078.038.720	1.808.134	0,17%	0	1.808.134
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	4.468.057.798	4.468.057.798	104.145.451	2%	74.250.000	29.895.451
250	Alquileres y Derechos	163.350.000	163.350.000	8.014.130	5%	8.014.130	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.683.000.000	1.683.000.000	96.500.000	6%	96.500.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	29.700.000	29.700.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.599.850.000	4.599.850.000	1.644.022.421	36%	988.380.886	655.641.535
320	Textiles y Vestuarios	990.000.000	990.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	339.000.000	339.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	170.850.000	170.850.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	3.100.000.000	3.100.000.000	1.644.022.421	53%	988.380.886	655.641.535
500 Inversión Física		6.000.000.028	6.000.000.028	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.300.000.028	5.300.000.028	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		32.274.591	32.274.591	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.274.591	32.274.591	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.319.340.068	2.319.340.068	251.115.078	11%	0	251.115.078
100 Servicios Personales		1.818.386.800	1.818.386.800	155.263.126	9%	0	155.263.126
120	Remuneraciones Temporales	460.000.007	460.000.007	22.834.034	5%	0	22.834.034
130	Asignaciones Complementarias	615.000.000	615.000.000	121.122.806	20%	0	121.122.806
140	Personal Contratado	597.386.789	597.386.789	11.306.286	2%	0	11.306.286
190	Otros Gastos del Personal	146.000.004	146.000.004	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		500.953.268	500.953.268	95.851.952	19%	0	95.851.952
230	Pasajes y Viáticos	500.953.268	500.953.268	95.851.952	19%	0	95.851.952
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	2.324.074.388	2.324.074.388	16.228.318	1%	0	16.228.318
200 Servicios No Personales		1.238.174.388	1.238.174.388	16.228.318	1%	0	16.228.318
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.000.574.388	1.000.574.388	16.228.318	2%	0	16.228.318
260	Servicios Técnicos y Profesionales	237.600.000	237.600.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		405.900.000	405.900.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	198.000.000	198.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	29.700.000	29.700.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	680.000.000	680.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
08 Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.234.020.800	2.234.020.800	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.234.020.800	2.234.020.800	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	193.050.000	193.050.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.826.470.800	1.826.470.800	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	214.500.000	214.500.000	0	0%	0	0
09 Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	63.028.283.955	42.062.865.638	36.538.833.430	87%	11.896.841.074	24.641.992.356
200 Servicios No Personales	207.159.480	207.159.480	23.776.870	11%	0	23.776.870
230 Pasajes y Viáticos	68.163.480	68.163.480	19.975.570	29%	0	19.975.570
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	138.996.000	138.996.000	3.801.300	3%	0	3.801.300
300 Bienes de Consumo e Insumos	895.706.158	895.706.158	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	56.650.958	56.650.958	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.900.000	9.900.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	180.655.200	180.655.200	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	648.500.000	648.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	60.965.418.317	40.000.000.000	36.515.056.560	91%	11.896.841.074	24.618.215.486
520 Construcciones	60.965.418.317	40.000.000.000	36.515.056.560	91%	11.896.841.074	24.618.215.486
800 Transferencias	960.000.000	960.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	0	0%	0	0
10 Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	31.715.031.960	9.684.428.053	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	66.727.138	66.727.138	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	66.727.138	66.727.138	0	0%	0	0
500 Inversión Física	31.648.304.822	9.617.700.915	0	0%	0	0
520 Construcciones	31.498.304.822	9.467.700.915	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
14 Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	2.260.667.042	2.260.667.042	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
800 Transferencias	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
20 Construcción del CIRS de Emboscada	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
500 Inversión Física	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
520 Construcciones	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
23 Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	6.850.000.000	6.850.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	4.907.695.597	4.907.695.597	0	0%	0
200	Servicios No Personales	4.491.597.006	4.491.597.006	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.491.597.006	4.491.597.006	0	0%	0
500	Inversión Física	416.098.591	416.098.591	0	0%	0
520	Construcciones	416.098.591	416.098.591	0	0%	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	7.910.391.731	1.357.905.728	0	0%	0
500	Inversión Física	7.882.302.188	1.357.905.728	0	0%	0
520	Construcciones	5.080.348.744	1.357.905.728	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.801.953.444	0	0	0%	0
800	Transferencias	28.089.543	0	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.089.543	0	0	0%	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	159.961.511.688	20.000.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	159.961.511.688	20.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	159.961.511.688	20.000.000.000	0	0%	0
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	107.748.481.035	40.000.000.000	34.134.032.735	85%	7.672.845.755
500	Inversión Física	107.748.481.035	40.000.000.000	34.134.032.735	85%	7.672.845.755
520	Construcciones	107.748.481.035	40.000.000.000	34.134.032.735	85%	7.672.845.755
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	265.530.743.746	108.477.868.892	40.395.946.509	37%	39.520.206.283
100	Servicios Personales	3.974.156.004	3.974.156.004	8.576.000	0,22%	0
140	Personal Contratado	3.974.156.004	3.974.156.004	8.576.000	0,22%	0
200	Servicios No Personales	19.064.404.817	19.064.404.817	514.688.479	3%	301.488.479
260	Servicios Técnicos y Profesionales	19.064.404.817	19.064.404.817	514.688.479	3%	301.488.479
500	Inversión Física	235.894.682.925	85.439.308.071	39.872.682.030	47%	39.218.717.804
520	Construcciones	234.972.182.925	85.439.308.071	39.872.682.030	47%	39.218.717.804
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	922.500.000	0	0	0%	0
800	Transferencias	6.597.500.000	0	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.797.500.000	0	0	0%	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	3.800.000.000	0	0	0%	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	4.154.944.127	4.154.944.127	0	0%	0
500	Inversión Física	4.154.944.127	4.154.944.127	0	0%	0
520	Construcciones	4.154.944.127	4.154.944.127	0	0%	0
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	13.817.726.482	13.817.726.482	7.081.729.993	51%	0
500	Inversión Física	13.817.726.482	13.817.726.482	7.081.729.993	51%	0
520	Construcciones	13.817.726.482	13.817.726.482	7.081.729.993	51%	7.081.729.993
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	134.371.669	134.371.669	0	0%	0
500	Inversión Física	134.371.669	134.371.669	0	0%	0
520	Construcciones	134.371.669	134.371.669	0	0%	0
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	1.737.846.000	1.737.846.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.737.846.000	1.737.846.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.737.846.000	1.737.846.000	0	0%	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	33.694.040.816	22.694.040.816	15.663.900.000	69%	3.335.576.054
200	Servicios No Personales	7.694.040.816	7.694.040.816	663.900.000	9%	309.800.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.694.040.816	7.694.040.816	663.900.000	9%	309.800.000
500	Inversión Física	26.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	3.025.776.054
520	Construcciones	24.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	11.974.223.946
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.500.000.000	0	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	30.415.134.251	30.415.134.251	6.688.056.967	22%	359.175.769
200	Servicios No Personales	2.571.450.751	2.571.450.751	514.375.769	20%	359.175.769
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.571.450.751	2.571.450.751	514.375.769	20%	359.175.769
500	Inversión Física	27.843.683.500	27.843.683.500	6.173.681.198	22%	0
520	Construcciones	23.957.110.000	23.957.110.000	6.173.681.198	26%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	3.886.573.500	3.886.573.500	0	0%	0
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	15.698.736.215	7.480.779.416	3.250.769.948	43%	673.499.997
200	Servicios No Personales	3.886.005.750	3.886.005.750	199.500.000	5%	110.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.886.005.750	3.886.005.750	199.500.000	5%	110.500.000
500	Inversión Física	11.812.730.465	3.594.773.666	3.051.269.948	85%	562.999.997
520	Construcciones	11.248.835.000	3.030.878.201	2.488.269.951	82%	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	563.895.465	563.895.465	562.999.997	99%	562.999.997
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	145.737.521.202	53.850.865.116	36.217.933.328	67%	9.446.293.098
500	Inversión Física	145.737.521.202	53.850.865.116	36.217.933.328	67%	9.446.293.098
520	Construcciones	145.737.521.202	53.850.865.116	36.217.933.328	67%	9.446.293.098
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	8.000.000.000	3.492.437.462	0	0%	0
500	Inversión Física	8.000.000.000	3.492.437.462	0	0%	0
520	Construcciones	8.000.000.000	3.492.437.462	0	0%	0
54	Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	75.821.585.200	46.936.085.200	194.000.000	0,41%	194.000.000
100	Servicios Personales	166.036.000	166.036.000	0	0%	0
120	Remuneraciones Temporales	93.730.000	93.730.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	72.306.000	72.306.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.674.961.200	1.674.961.200	194.000.000	12%	194.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.674.961.200	1.674.961.200	194.000.000	12%	194.000.000
500	Inversión Física	73.980.588.000	45.095.088.000	0	0%	0
520	Construcciones	73.980.588.000	45.095.088.000	0	0%	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	65.041.840.034	2.784.187.058	0	0%	0
500	Inversión Física	65.041.840.034	2.784.187.058	0	0%	0
520	Construcciones	65.041.840.034	2.784.187.058	0	0%	0
56	Construcción Gran Hospital General	167.365.599.996	167.365.599.996	4.669.458.689	3%	0
500	Inversión Física	167.365.599.996	167.365.599.996	4.669.458.689	3%	0
520	Construcciones	167.365.599.996	167.365.599.996	4.669.458.689	3%	0
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	241.170.175.981	23.356.530.702	8.501.482.630	36%	664.089.297
100	Servicios Personales	678.240.000	678.240.000	0	0%	0
120	Remuneraciones Temporales	337.440.000	337.440.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	273.600.000	273.600.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	67.200.000	67.200.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	9.070.383.459	9.070.383.459	1.001.482.630	11%	664.089.297
230	Pasajes y Viáticos	399.168.000	399.168.000	22.189.297	6%	22.189.297
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.671.215.459	8.671.215.459	979.293.333	11%	641.900.000
500	Inversión Física	231.421.552.522	13.607.907.243	7.500.000.000	55%	0
520	Construcciones	230.671.552.522	13.607.907.243	7.500.000.000	55%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	750.000.000	0	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
58	Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón	69.690.283.025	57.008.206.488	0	0%	0
200 Servicios No Personales		5.127.107.738	5.127.107.738	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	51.464.388	51.464.388	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.075.643.350	5.075.643.350	0	0%	0
500 Inversión Física		64.563.175.287	51.881.098.750	0	0%	0
520	Construcciones	64.236.805.287	51.554.728.750	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	118.680.000	118.680.000	0	0%	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	207.690.000	207.690.000	0	0%	0
59	Mantenimiento y Conservación de Rutas	96.246.328.323	50.099.000.000	20.293.655.326	41%	20.293.655.326
200 Servicios No Personales		99.000.000	99.000.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	99.000.000	99.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		96.147.328.323	50.000.000.000	20.293.655.326	41%	20.293.655.326
520	Construcciones	96.147.328.323	50.000.000.000	20.293.655.326	41%	20.293.655.326
60	Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes	54.348.352.431	10.000.000.000	8.436.554.668	84%	8.436.554.668
500 Inversión Física		54.348.352.431	10.000.000.000	8.436.554.668	84%	8.436.554.668
520	Construcciones	54.348.352.431	10.000.000.000	8.436.554.668	84%	8.436.554.668
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	2.090.160.396	925.153.838	0	0%	0
500 Inversión Física		2.090.160.396	925.153.838	0	0%	0
520	Construcciones	2.090.160.396	925.153.838	0	0%	0
62	Ampliación de la Defensa Costera de Concepción	20.000.000.000	16.975.467.530	8.880.964.099	52%	8.880.964.099
500 Inversión Física		20.000.000.000	16.975.467.530	8.880.964.099	52%	8.880.964.099
520	Construcciones	20.000.000.000	16.975.467.530	8.880.964.099	52%	8.880.964.099
63	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	17.389.778.106	6.600.000.000	991.654.987	15%	991.654.987
500 Inversión Física		17.389.778.106	6.600.000.000	991.654.987	15%	991.654.987
520	Construcciones	17.389.778.106	6.600.000.000	991.654.987	15%	991.654.987
SUBTOTAL		2.564.452.292.649	1.607.414.868.742	435.319.716.324	27%	233.730.613.694
						201.589.102.630

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	3.452.170.068.923	2.209.532.043.377	838.259.225.192	38%	722.285.436.498
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemit	100.397.131	100.397.131	0	0%	0
500 Inversión Física		100.397.131	100.397.131	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.397.131	100.397.131	0	0%	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	9.437.722.995	9.437.722.995	0	0%	0
200 Servicios No Personales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0
500 Inversión Física		9.387.722.995	9.387.722.995	0	0%	0
520	Construcciones	9.387.722.995	9.387.722.995	0	0%	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	114.037.079.480	38.460.942.948	1.216.330.322	3%	1.216.330.322
200 Servicios No Personales		6.449.057.998	6.449.057.998	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.449.057.998	6.449.057.998	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.900.000	9.900.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	4.950.000	4.950.000	0	0%	0
390	Otros Bienes De Consumo	4.950.000	4.950.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	106.578.121.482	31.647.474.850	1.216.330.322	4%	0	1.216.330.322
520 Construcciones	104.841.723.777	30.394.738.695	1.216.330.322	4%	0	1.216.330.322
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.000.000	0	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	231.397.705	152.736.155	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.500.000.000	1.100.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.000.000.000	354.510.100	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	354.510.100	0	0%	0	0
08 Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	34.746.362.770	27.230.511.940	16.663.325.804	61%	9.974.973.691	6.688.352.113
200 Servicios No Personales	237.600.000	237.600.000	21.525.400	9%	0	21.525.400
230 Pasajes y Viáticos	237.600.000	237.600.000	21.525.400	9%	0	21.525.400
500 Inversión Física	34.508.762.770	26.992.911.940	16.641.800.404	62%	9.974.973.691	6.666.826.713
520 Construcciones	34.508.762.770	26.992.911.940	16.641.800.404	62%	9.974.973.691	6.666.826.713
09 Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	20.142.255.946	7.517.922.192	2.011.099.813	27%	0	2.011.099.813
500 Inversión Física	20.142.255.946	7.517.922.192	2.011.099.813	27%	0	2.011.099.813
520 Construcciones	20.142.255.946	7.517.922.192	2.011.099.813	27%	0	2.011.099.813
10 Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	11.752.000.000	6.163.308.835	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	4.752.000.000	4.752.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	4.752.000.000	4.752.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	7.000.000.000	1.411.308.835	0	0%	0	0
520 Construcciones	6.000.000.000	411.308.835	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
12 Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	25.477.939.004	16.821.625.008	4.126.352.154	25%	4.047.460.936	78.891.218
200 Servicios No Personales	108.899.990	108.899.990	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	69.299.990	69.299.990	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	39.600.000	39.600.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	25.369.039.014	16.712.725.018	4.126.352.154	25%	4.047.460.936	78.891.218
520 Construcciones	25.369.039.014	16.712.725.018	4.126.352.154	25%	4.047.460.936	78.891.218
13 Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	7.049.500.000	4.799.442.957	2.321.027.515	48%	1.909.318.011	411.709.504
200 Servicios No Personales	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	7.000.000.000	4.749.942.957	2.321.027.515	49%	1.909.318.011	411.709.504
520 Construcciones	6.000.000.000	3.749.942.957	2.321.027.515	62%	1.909.318.011	411.709.504
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
14 Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	6.945.353.788	2.212.364.262	307.401.782	14%	176.860.363	130.541.419
500 Inversión Física	6.945.353.788	2.212.364.262	307.401.782	14%	176.860.363	130.541.419
520 Construcciones	6.945.353.788	2.212.364.262	307.401.782	14%	176.860.363	130.541.419
15 Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	76.828.602.646	56.371.117.720	37.353.120.519	66%	30.949.431.003	6.403.689.516
100 Servicios Personales	158.400.000	158.400.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	158.400.000	158.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.832.985.000	1.832.985.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	95.040.000	95.040.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.737.945.000	1.737.945.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	74.837.217.646	54.379.732.720	37.353.120.519	69%	30.949.431.003	6.403.689.516
520 Construcciones	74.837.217.646	54.379.732.720	37.353.120.519	69%	30.949.431.003	6.403.689.516

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	43.608.706.189	32.762.636.543	10.251.398.403	31%	9.655.340.080	596.058.323
200 Servicios No Personales		1.758.566.957	1.758.566.957	193.000.000	11%	16.000.000	177.000.000
230	Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	1.616.006.957	1.616.006.957	193.000.000	12%	16.000.000	177.000.000
500 Inversión Física		41.850.139.232	31.004.069.586	10.058.398.403	32%	9.639.340.080	419.058.323
520	Construcciones	35.662.139.232	26.878.736.254	10.058.398.403	37%	9.639.340.080	419.058.323
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.188.000.000	4.125.333.332	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	1.296.712.708	1.296.712.708	196.505.376	15%	0	196.505.376
200 Servicios No Personales		1.158.029.080	1.158.029.080	196.505.376	17%	0	196.505.376
230	Pasajes y Viáticos	1.158.029.080	1.158.029.080	196.505.376	17%	0	196.505.376
300 Bienes de Consumo e Insumos		138.683.628	138.683.628	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	138.683.628	138.683.628	0	0%	0	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	4.831.873.770	4.831.873.770	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.831.873.770	4.831.873.770	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.831.873.770	4.831.873.770	0	0%	0	0
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	3.564.922.212	3.564.922.212	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.564.922.212	3.564.922.212	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.564.922.212	3.564.922.212	0	0%	0	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	2.427.736.739	2.427.736.739	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.427.736.739	2.427.736.739	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.427.736.739	2.427.736.739	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	3.386.343.105	687.427.650	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.386.343.105	687.427.650	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.386.343.105	687.427.650	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. sobre Empedrados en Región Este	4.236.373.954	859.983.913	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.236.373.954	859.983.913	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.236.373.954	859.983.913	0	0%	0	0
41	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur	2.500.000.000	507.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.500.000.000	507.500.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.500.000.000	507.500.000	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	2.600.000.000	614.408.309	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.600.000.000	614.408.309	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.600.000.000	614.408.309	0	0%	0	0
45	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	3.000.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.000.000.000	0	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	988.318.260.335	988.318.260.335	346.189.320.071	35%	346.189.320.071	0
500 Inversión Física		4.200.000.000	4.200.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		981.768.260.335	981.768.260.335	346.189.320.071	35%	346.189.320.071	0
630	Préstamos al Sector Privado	981.768.260.335	981.768.260.335	346.189.320.071	35%	346.189.320.071	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	2.350.000.000	2.350.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
50 Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	1.546.433.354	297.527.145	0	0%	0	0
500 Inversión Física	850.077.559	297.527.145	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	850.077.559	297.527.145	0	0%	0	0
800 Transferencias	696.355.795	0	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	696.355.795	0	0	0%	0	0
52 Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	1.689.284.709	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.689.284.709	0	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.689.284.709	0	0	0%	0	0
53 Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	5.174.588.544	5.174.588.544	0	0%	0	0
500 Inversión Física	5.174.588.544	5.174.588.544	0	0%	0	0
520 Construcciones	5.174.588.544	5.174.588.544	0	0%	0	0
55 Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	13.979.000.000	4.234.801.887	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	495.000.000	495.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	13.484.000.000	3.739.801.887	0	0%	0	0
520 Construcciones	12.484.000.000	2.739.801.887	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
56 Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	252.312.627.205	60.923.860.556	27.273.361.774	45%	19.055.963.704	8.217.398.070
200 Servicios No Personales	13.000.397.160	13.000.397.160	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	49.500.013	49.500.013	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	12.950.897.147	12.950.897.147	0	0%	0	0
500 Inversión Física	239.312.230.045	47.923.463.396	27.273.361.774	57%	19.055.963.704	8.217.398.070
520 Construcciones	239.312.230.045	47.923.463.396	27.273.361.774	57%	19.055.963.704	8.217.398.070
57 Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	47.743.815.359	26.243.815.359	12.708.224.391	48%	0	12.708.224.391
200 Servicios No Personales	6.243.815.359	6.243.815.359	935.227.796	15%	0	935.227.796
230 Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.193.815.359	6.193.815.359	935.227.796	15%	0	935.227.796
500 Inversión Física	41.500.000.000	20.000.000.000	11.772.996.595	59%	0	11.772.996.595
520 Construcciones	41.500.000.000	20.000.000.000	11.772.996.595	59%	0	11.772.996.595
58 Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	5.236.478.671	5.236.478.671	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	24.750.000	24.750.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	24.750.000	24.750.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.211.728.671	5.211.728.671	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	5.211.728.671	5.211.728.671	0	0%	0	0
59 Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	47.725.629.293	47.725.629.293	14.358.687.336	30%	11.052.229.716	3.306.457.620
100 Servicios Personales	673.200.000	673.200.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	673.200.000	673.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.201.751.446	1.201.751.446	6.457.620	1%	0	6.457.620
220 Transporte y Almacenaje	197.516.348	197.516.348	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	457.535.260	457.535.260	6.457.620	1%	0	6.457.620
260 Servicios Técnicos y Profesionales	546.699.838	546.699.838	0	0%	0	0
500 Inversión Física	45.850.677.847	45.850.677.847	14.352.229.716	31%	11.052.229.716	3.300.000.000
520 Construcciones	45.709.164.699	45.709.164.699	14.352.229.716	31%	11.052.229.716	3.300.000.000
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	141.513.148	141.513.148	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	23.139.392.189	9.307.171.158	0	0%	0	0
500	Inversión Física	23.139.392.189	9.307.171.158	0	0%	0	0
520	Construcciones	23.139.392.189	9.307.171.158	0	0%	0	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	13.500.000.000	913.500.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	13.500.000.000	913.500.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	13.500.000.000	913.500.000	0	0%	0	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	2.000.000.000	406.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.000.000.000	406.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	406.000.000	0	0%	0	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	150.000.000	53.314.083	0	0%	0	0
500	Inversión Física	150.000.000	53.314.083	0	0%	0	0
520	Construcciones	150.000.000	53.314.083	0	0%	0	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	5.565.000.000	0	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.565.000.000	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.565.000.000	0	0	0%	0	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	5.000.000.000	1.506.170.031	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.000.000.000	1.506.170.031	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.000.000.000	1.506.170.031	0	0%	0	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	4.000.000.000	1.084.369.978	0	0%	0	0
500	Inversión Física	4.000.000.000	1.084.369.978	0	0%	0	0
520	Construcciones	4.000.000.000	1.084.369.978	0	0%	0	0
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	5.000.000.000	3.007.500.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	5.000.000.000	3.007.500.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.000.000.000	3.007.500.000	0	0%	0	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	45.000.000.000	25.000.000.000	5.040.473.674	20%	0	5.040.473.674
500	Inversión Física	45.000.000.000	25.000.000.000	5.040.473.674	20%	0	5.040.473.674
520	Construcciones	45.000.000.000	25.000.000.000	5.040.473.674	20%	0	5.040.473.674
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	2.496.437.410	2.496.437.410	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.496.437.410	2.496.437.410	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.496.437.410	2.496.437.410	0	0%	0	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	221.890.520.829	135.833.344.347	20.903.344.503	15%	13.736.606.100	7.166.738.403
200	Servicios No Personales	4.578.016.337	4.578.016.337	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	24.750.000	24.750.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.553.266.337	4.553.266.337	0	0%	0	0
500	Inversión Física	215.812.504.492	129.755.328.010	20.903.344.503	16%	13.736.606.100	7.166.738.403
520	Construcciones	201.312.504.492	118.199.876.066	18.398.142.321	16%	13.736.606.100	4.661.536.221
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	14.500.000.000	11.555.451.944	2.505.202.182	22%	0	2.505.202.182
800	Transferencias	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	6.393.500.000	1.984.661.010	0	0%	0
200	Servicios No Personales	643.500.000	643.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	643.500.000	643.500.000	0	0%	0
500	Inversión Física	5.500.000.000	1.091.161.010	0	0%	0
520	Construcciones	5.000.000.000	591.161.010	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	19.620.763.405	17.377.278.951	7.559.151.698	44%	6.646.484.065
200	Servicios No Personales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	18.620.763.405	16.377.278.951	7.559.151.698	46%	6.646.484.065
520	Construcciones	14.217.720.000	11.974.235.546	7.113.352.867	59%	6.646.484.065
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.403.043.405	4.403.043.405	445.798.831	10%	445.798.831
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	47.351.719.261	27.854.127.710	19.967.510.257	72%	18.884.070.598
200	Servicios No Personales	1.188.000.000	1.188.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.188.000.000	1.188.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	46.163.719.261	26.666.127.710	19.967.510.257	75%	18.884.070.598
520	Construcciones	43.600.000.000	24.102.408.449	19.967.510.257	83%	18.884.070.598
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.563.719.261	2.563.719.261	0	0%	0
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	20.000.000.000	0	0	0%	0
500	Inversión Física	20.000.000.000	0	0	0%	0
520	Construcciones	20.000.000.000	0	0	0%	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	36.879.098.588	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	14.152.620.795
500	Inversión Física	36.879.098.588	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	14.152.620.795
520	Construcciones	36.879.098.588	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	14.152.620.795
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	31.621.219.777	16.270.819.777	12.383.091.476	76%	0
500	Inversión Física	31.621.219.777	16.270.819.777	12.383.091.476	76%	0
520	Construcciones	31.621.219.777	16.270.819.777	12.383.091.476	76%	12.383.091.476
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	44.700.000.000	44.700.000.000	44.643.760.980	99%	44.643.760.980
500	Inversión Física	44.700.000.000	44.700.000.000	44.643.760.980	99%	44.643.760.980
520	Construcciones	44.700.000.000	44.700.000.000	44.643.760.980	99%	44.643.760.980
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	87.867.730.450	23.873.790.775	10.033.787.668	42%	5.428.830.083
200	Servicios No Personales	3.529.789.961	3.529.789.961	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	59.400.000	59.400.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.470.389.961	3.470.389.961	0	0%	0
500	Inversión Física	81.037.940.489	18.779.536.084	10.033.787.668	53%	5.428.830.083
520	Construcciones	63.770.772.802	13.557.954.117	9.910.417.752	73%	4.481.587.669
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.267.167.687	5.221.581.967	123.369.916	2%	123.369.916
800	Transferencias	3.300.000.000	1.564.464.730	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.300.000.000	1.564.464.730	0	0%	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	245.354.435.814	139.692.331.648	72.759.319.812	52%	60.167.493.125
200	Servicios No Personales	1.188.000.000	1.188.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.188.000.000	1.188.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	244.166.435.814	138.504.331.648	72.759.319.812	53%	60.167.493.125
520	Construcciones	244.166.435.814	138.504.331.648	72.759.319.812	53%	12.591.826.687

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	210.058.548.092	83.050.644.287	34.122.416.900	41%	27.104.227.382	7.018.189.518
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	94.000.000	12%	0	94.000.000
140	Personal Contratado	780.000.000	780.000.000	94.000.000	12%	0	94.000.000
200 Servicios No Personales		6.593.400.000	6.593.400.000	25.399.972	0,39%	0	25.399.972
230	Pasajes y Viáticos	198.000.000	198.000.000	25.399.972	13%	0	25.399.972
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.395.400.000	6.395.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		201.685.148.092	74.677.244.287	34.003.016.928	46%	27.104.227.382	6.898.789.546
520	Construcciones	195.185.148.092	70.677.244.287	34.003.016.928	48%	27.104.227.382	6.898.789.546
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.500.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	497.861.824.891	207.044.279.597	99.611.934.994	48%	92.937.087.233	6.674.847.761
100 Servicios Personales		1.440.000.000	1.440.000.000	108.346.800	8%	0	108.346.800
140	Personal Contratado	1.440.000.000	1.440.000.000	108.346.800	8%	0	108.346.800
200 Servicios No Personales		10.553.400.000	10.553.400.000	32.761.659	0,31%	0	32.761.659
230	Pasajes y Viáticos	198.000.000	198.000.000	32.761.659	17%	0	32.761.659
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.355.400.000	10.355.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		484.368.424.891	195.050.879.597	99.470.826.535	51%	92.937.087.233	6.533.739.302
520	Construcciones	467.368.424.891	181.050.879.597	99.470.826.535	55%	92.937.087.233	6.533.739.302
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.000.000.000	14.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.500.000.000	0	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.500.000.000	0	0	0%	0	0
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	12.520.753.523	12.520.753.523	1.314.034.396	10%	0	1.314.034.396
500 Inversión Física		12.520.753.523	12.520.753.523	1.314.034.396	10%	0	1.314.034.396
520	Construcciones	12.520.753.523	12.520.753.523	1.314.034.396	10%	0	1.314.034.396
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	117.073.124.787	75.302.029.470	14.944.243.574	20%	5.573.358.562	9.370.885.012
200 Servicios No Personales		1.791.900.000	1.791.900.000	312.411.529	17%	73.358.562	239.052.967
230	Pasajes y Viáticos	643.500.000	643.500.000	312.411.529	49%	73.358.562	239.052.967
240	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.098.900.000	1.098.900.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		29.851.750.000	29.851.750.000	1.153.202.316	4%	0	1.153.202.316
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	27.051.750.000	27.051.750.000	1.153.202.316	4%	0	1.153.202.316
500 Inversión Física		57.371.095.317	15.600.000.000	7.978.629.729	51%	0	7.978.629.729
520	Construcciones	56.771.095.317	15.000.000.000	7.978.629.729	53%	0	7.978.629.729
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		28.058.379.470	28.058.379.470	5.500.000.000	20%	5.500.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	375.000.000	375.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	27.683.379.470	27.683.379.470	5.500.000.000	20%	5.500.000.000	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	229.577.539.424	173.322.318.460	55.731.790.621	32%	47.256.207.292
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	903.869.509	183.485.510	0	0%	0
500	Inversión Física	903.869.509	183.485.510	0	0%	0
520	Construcciones	903.869.509	183.485.510	0	0%	0
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	450.250.775	440.981.537	0	0%	0
200	Servicios No Personales	122.791.755	122.791.755	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	122.791.755	122.791.755	0	0%	0
500	Inversión Física	327.459.020	318.189.782	0	0%	0
520	Construcciones	327.459.020	318.189.782	0	0%	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	8.787.256.362	8.285.868.988	2.239.330.162	27%	974.954.998
100	Servicios Personales	853.800.000	853.800.000	84.100.000	10%	84.100.000
140	Personal Contratado	853.800.000	853.800.000	84.100.000	10%	84.100.000
200	Servicios No Personales	762.300.000	762.300.000	207.827.207	27%	207.827.207
260	Servicios Técnicos y Profesionales	762.300.000	762.300.000	207.827.207	27%	207.827.207
500	Inversión Física	7.171.156.362	6.669.768.988	1.947.402.955	29%	767.127.791
520	Construcciones	7.171.156.362	6.669.768.988	1.947.402.955	29%	767.127.791
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	683.100.000	683.100.000	574.350.556	84%	574.350.556
200	Servicios No Personales	683.100.000	683.100.000	574.350.556	84%	574.350.556
230	Pasejes y Viáticos	683.100.000	683.100.000	574.350.556	84%	574.350.556
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	61.289.571.521	33.875.676.301	8.434.938.946	25%	7.376.857.280
200	Servicios No Personales	14.124.236.540	14.124.236.540	501.734.613	4%	351.655.891
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.124.236.540	14.124.236.540	501.734.613	4%	351.655.891
500	Inversión Física	47.165.334.981	19.751.439.761	7.933.204.333	40%	7.025.201.389
520	Construcciones	47.054.505.005	19.751.439.761	7.933.204.333	40%	7.025.201.389
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	110.829.976	0	0	0%	0
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	25.551.147.631	25.525.147.631	954.085.566	4%	123.771.051
200	Servicios No Personales	2.772.000.000	2.772.000.000	954.085.566	34%	123.771.051
230	Pasejes y Viáticos	990.000.000	990.000.000	949.334.708	96%	123.771.051
240	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.782.000.000	1.782.000.000	4.750.858	0,27%	4.750.858
300	Bienes de Consumo e Insumos	20.953.147.631	20.953.147.631	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	20.953.147.631	20.953.147.631	0	0%	0
500	Inversión Física	1.826.000.000	1.800.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.826.000.000	1.800.000.000	0	0%	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	3.000.000.000	3.000.000.000	1.009.618.174	34%	0
500	Inversión Física	3.000.000.000	3.000.000.000	1.009.618.174	34%	0
520	Construcciones	3.000.000.000	3.000.000.000	1.009.618.174	34%	0
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0
20	Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
21	Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	5.000.000.000	3.890.264.964	2.497.874.705	64%	2.497.874.705
500	Inversión Física	5.000.000.000	3.890.264.964	2.497.874.705	64%	2.497.874.705
520	Construcciones	5.000.000.000	3.890.264.964	2.497.874.705	64%	2.497.874.705
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	8.522.382.687	8.522.382.687	0	0%	0
500	Inversión Física	8.522.382.687	8.522.382.687	0	0%	0
520	Construcciones	8.522.382.687	8.522.382.687	0	0%	0
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	7.421.524.290	7.421.524.290	0	0%	0
500	Inversión Física	7.421.524.290	7.421.524.290	0	0%	0
520	Construcciones	7.421.524.290	7.421.524.290	0	0%	0
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	168.368.000	168.368.000	0	0%	0
500	Inversión Física	168.368.000	168.368.000	0	0%	0
520	Construcciones	168.368.000	168.368.000	0	0%	0
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"	21.425.769.881	20.728.179.281	5.465.169.315	26%	5.465.169.315
500	Inversión Física	21.425.769.881	20.728.179.281	5.465.169.315	26%	5.465.169.315
520	Construcciones	21.425.769.881	20.728.179.281	5.465.169.315	26%	5.465.169.315
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	10.000.000.000	0	0	0%	0
500	Inversión Física	10.000.000.000	0	0	0%	0
520	Construcciones	10.000.000.000	0	0	0%	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	5.935.643.263	5.935.643.263	517.839.322	9%	517.839.322
500	Inversión Física	5.935.643.263	5.935.643.263	517.839.322	9%	517.839.322
520	Construcciones	5.935.643.263	5.935.643.263	517.839.322	9%	517.839.322
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	20.262.853.554	17.836.251.389	12.837.052.231	72%	12.837.052.231
500	Inversión Física	20.262.853.554	17.836.251.389	12.837.052.231	72%	12.837.052.231
520	Construcciones	20.262.853.554	17.836.251.389	12.837.052.231	72%	12.837.052.231
31	Mejoramiento Quayquyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	10.817.377.667	9.391.790.494	7.265.358.667	77%	7.265.358.667
500	Inversión Física	10.817.377.667	9.391.790.494	7.265.358.667	77%	7.265.358.667
520	Construcciones	10.817.377.667	9.391.790.494	7.265.358.667	77%	7.265.358.667
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	29.358.424.284	17.433.654.125	13.936.172.977	80%	13.936.172.977
500	Inversión Física	29.358.424.284	17.433.654.125	13.936.172.977	80%	13.936.172.977
520	Construcciones	29.358.424.284	17.433.654.125	13.936.172.977	80%	13.936.172.977
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	609.388.345.138	212.249.367.012	27.825.251.882	13%	14.621.702.043
01	SP Proyecto Acueducto	1.333.153.197	0	0	0%	0
500	Inversión Física	1.333.153.197	0	0	0%	0
520	Construcciones	1.333.153.197	0	0	0%	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	51.622.377.546	15.310.187.663	93.140.406	1%	21.848.281
100	Servicios Personales	606.000.000	606.000.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	606.000.000	606.000.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	336.600.000	336.600.000	93.140.406	28%	21.848.281
230	Pasejes y Viáticos	237.600.000	237.600.000	93.140.406	39%	21.848.281
260	Servicios Técnicos y Profesionales	99.000.000	99.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	50.679.777.546	14.367.587.663	0	0%	0
520	Construcciones	50.679.777.546	14.367.587.663	0	0%	0
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	17.915.754.230	17.915.754.230	0	0%	0
100	Servicios Personales	120.393.000	120.393.000	0	0%	0
140	Personal Contratado	120.393.000	120.393.000	0	0%	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	624.620.269	624.620.269	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	624.620.269	624.620.269	0	0%	0	0
500 Inversión Física	17.170.740.961	17.170.740.961	0	0%	0	0
520 Construcciones	17.170.740.961	17.170.740.961	0	0%	0	0
04 Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	5.993.699.129	5.993.699.129	0	0%	0	0
100 Servicios Personales	120.393.000	120.393.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	120.393.000	120.393.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	511.052.948	511.052.948	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	511.052.948	511.052.948	0	0%	0	0
500 Inversión Física	5.362.253.181	5.362.253.181	0	0%	0	0
520 Construcciones	5.362.253.181	5.362.253.181	0	0%	0	0
05 Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	130.982.554.253	18.049.462.774	537.000.000	3%	219.000.000	318.000.000
100 Servicios Personales	684.000.000	684.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	684.000.000	684.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	10.348.332.435	10.348.332.435	537.000.000	5%	219.000.000	318.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.348.332.435	10.348.332.435	537.000.000	5%	219.000.000	318.000.000
500 Inversión Física	119.179.346.932	6.246.255.453	0	0%	0	0
520 Construcciones	119.179.346.932	6.246.255.453	0	0%	0	0
800 Transferencias	770.874.886	770.874.886	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	770.874.886	770.874.886	0	0%	0	0
06 Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	147.122.562.004	34.184.969.391	0	0%	0	0
100 Servicios Personales	1.448.744.801	1.448.744.801	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	1.448.744.801	1.448.744.801	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	18.497.385.734	18.497.385.734	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	18.497.385.734	18.497.385.734	0	0%	0	0
500 Inversión Física	127.176.431.469	14.238.838.856	0	0%	0	0
510 Adquisición de Inmuebles	6.721.375.000	3.700.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	120.455.056.469	10.538.838.856	0	0%	0	0
07 Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	152.635.127.866	68.896.966.139	257.178.906	0,37%	257.178.906	0
100 Servicios Personales	2.040.000.000	2.040.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	6.015.188.939	6.015.188.939	257.178.906	4%	257.178.906	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.015.188.939	6.015.188.939	257.178.906	4%	257.178.906	0
500 Inversión Física	144.579.938.927	60.841.777.200	0	0%	0	0
520 Construcciones	144.579.938.927	60.841.777.200	0	0%	0	0
08 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	27.235.648.858	14.974.130.397	9.157.505.583	61%	6.060.785.949	3.096.719.634
100 Servicios Personales	979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	3.518.056.515	3.518.056.515	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.375.496.515	3.375.496.515	0	0%	0	0
500 Inversión Física	22.738.392.343	10.476.873.882	9.157.505.583	87%	6.060.785.949	3.096.719.634
520 Construcciones	22.738.392.343	10.476.873.882	9.157.505.583	87%	6.060.785.949	3.096.719.634

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	18.107.753.784	8.701.281.368	3.543.159.680	41%	3.543.159.680	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.217.331.866	1.217.331.866	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.074.771.866	1.074.771.866	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.911.221.918	6.504.749.502	3.543.159.680	54%	3.543.159.680	0
520	Construcciones	15.911.221.918	6.504.749.502	3.543.159.680	54%	3.543.159.680	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	18.350.640.769	8.795.945.750	3.132.568.747	36%	2.988.170.636	144.398.111
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.242.661.481	1.242.661.481	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.100.101.481	1.100.101.481	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.128.779.288	6.574.084.269	3.132.568.747	48%	2.988.170.636	144.398.111
520	Construcciones	16.128.779.288	6.574.084.269	3.132.568.747	48%	2.988.170.636	144.398.111
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	17.037.660.298	4.020.970.171	1.531.558.591	38%	1.531.558.591	0
100 Servicios Personales		979.200.000	979.200.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	806.400.000	806.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.176.042.112	1.176.042.112	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.033.482.112	1.033.482.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.882.418.186	1.865.728.059	1.531.558.591	82%	1.531.558.591	0
520	Construcciones	14.882.418.186	1.865.728.059	1.531.558.591	82%	1.531.558.591	0
26	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	16.051.413.204	10.406.000.000	7.296.576.363	70%	0	7.296.576.363
500 Inversión Física		16.051.413.204	10.406.000.000	7.296.576.363	70%	0	7.296.576.363
520	Construcciones	16.051.413.204	10.406.000.000	7.296.576.363	70%	0	7.296.576.363
27	Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	5.000.000.000	5.000.000.000	2.276.563.606	46%	0	2.276.563.606
500 Inversión Física		5.000.000.000	5.000.000.000	2.276.563.606	46%	0	2.276.563.606
520	Construcciones	5.000.000.000	5.000.000.000	2.276.563.606	46%	0	2.276.563.606
SUBTOTAL		4.291.135.953.485	2.595.103.728.849	921.816.267.695	36%	745.382.721.870	176.433.545.825

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	72.473.039.516	72.473.039.516	12.071.287.062	17%	10.458.296.445	1.612.990.617
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	72.473.039.516	72.473.039.516	12.071.287.062	17%	10.458.296.445	1.612.990.617
800	Transferencias	72.473.039.516	72.473.039.516	12.071.287.062	17%	10.458.296.445	1.612.990.617
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	72.026.539.516	72.026.539.516	12.071.287.062	17%	10.458.296.445	1.612.990.617
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	446.500.000	446.500.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		72.473.039.516	72.473.039.516	12.071.287.062	17%	10.458.296.445	1.612.990.617
TOTAL ENTIDAD		6.928.061.285.650	4.274.991.637.107	1.369.207.271.081	32%	989.571.632.009	379.635.639.072

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 10/04/2026 * Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

Ley N° 7.609/2025 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

DECRETO N° 5.311/2026 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.609 del 31 de diciembre de 2025, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.

DECRETO N° 5.443/2026 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley N° 7.609/2025.

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
