



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026


GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	281.479.936.524	-4.836.586.000	276.643.350.524	126.053.829.606	150.589.520.918
200 Servicios No Personales	311.436.518.621	32.010.614.625	343.447.133.246	121.826.356.500	221.620.776.746
300 Bienes de Consumo e Insumos	87.049.682.064	61.633.369.829	148.683.051.893	20.565.634.317	128.117.417.576
500 Inversión Física	4.766.576.936.854	150.309.651.102	4.916.886.587.956	2.648.785.368.553	2.268.101.219.403
600 Inversión Financiera	981.768.260.335	0	981.768.260.335	419.076.887.146	562.691.373.189
700 Servicio de la Deuda Pública	0	9.245.407.500	9.245.407.500	0	9.245.407.500
800 Transferencias	493.332.906.252	18.049.135.040	511.382.041.292	356.222.248.204	155.159.793.088
900 Otros Gastos	6.417.045.000	2.501.000.000	8.918.045.000	4.451.278.455	4.466.766.545
TOTAL ENTIDAD	6.928.061.285.650	268.912.592.096	7.196.973.877.746	3.696.981.602.781	3.499.992.274.965


FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/08/2026 *Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

Participación Presupuestaria

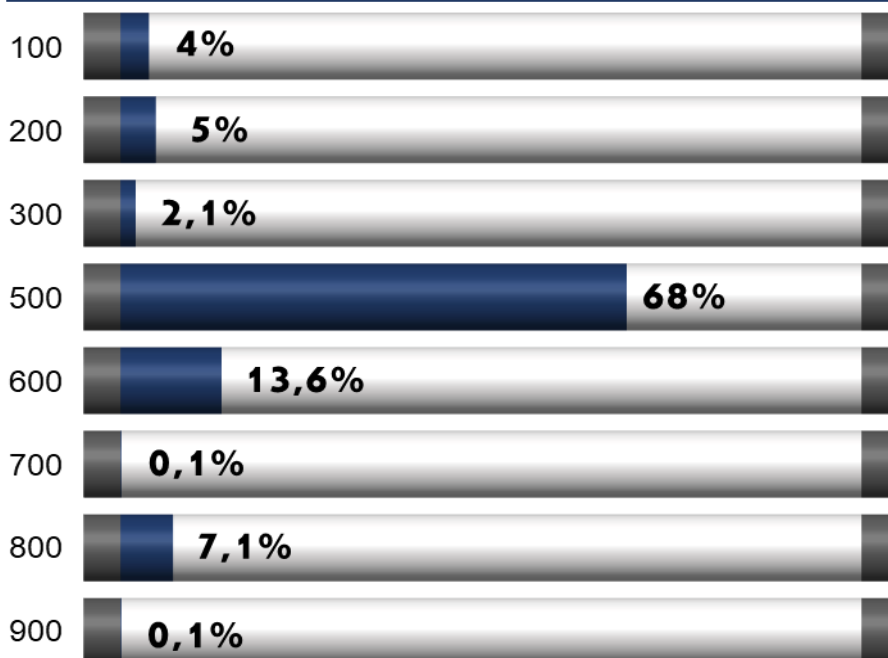


EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro

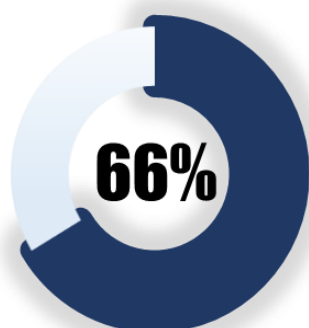


Presupuesto: ₡ 635.650.068.701
Ejecutado: ₡ 421.795.044.989

Recursos del Crédito Público

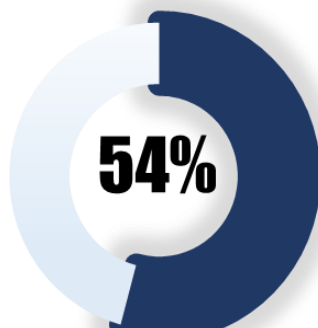

Presupuesto: ₡ 5.720.049.272.327
Ejecutado: ₡ 3.097.577.933.065

Recursos Institucionales

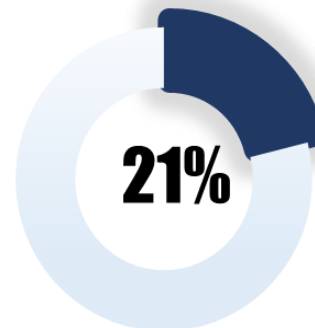

Presupuesto: ₡ 841.274.536.718
Ejecutado: ₡ 177.608.624.727

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.470.649.794.109	2.470.649.794.109	1.309.701.644.262	53%	848.232.664.335	461.468.979.927
01	Gestión Administrativa Financiera	434.780.397.220	434.780.397.220	172.908.789.714	40%	52.526.115.950	120.382.673.764
100 Servicios Personales		209.954.730.549	209.954.730.549	98.344.446.863	47%	184.340.000	98.160.106.863
110 Remuneraciones Básicas		157.767.348.011	157.767.348.011	72.526.292.521	46%	0	72.526.292.521
120 Remuneraciones Temporales		12.232.766.933	12.232.766.933	4.427.329.248	36%	0	4.427.329.248
130 Asignaciones Complementarias		26.306.369.064	26.306.369.064	14.013.852.924	53%	0	14.013.852.924
140 Personal Contratado		12.119.144.928	12.119.144.928	6.532.465.465	54%	184.340.000	6.348.125.465
190 Otros Gastos del Personal		1.529.101.613	1.529.101.613	844.506.705	55%	0	844.506.705
200 Servicios No Personales		129.972.744.517	129.972.744.517	59.676.575.141	46%	46.346.317.014	13.330.258.127
210 Servicios Básicos		16.667.000.000	16.667.000.000	9.247.032.372	55%	9.211.194.342	35.838.030
220 Transporte y Almacenaje		784.478.556	784.478.556	292.390.083	37%	214.527.935	77.862.148
230 Pasajes y Viáticos		5.538.095.961	5.538.095.961	3.016.624.723	54%	1.997.514.745	1.019.109.978
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		31.184.000.000	31.184.000.000	6.660.282.361	21%	3.746.243.012	2.914.039.349
250 Alquileres y Derechos		3.662.360.000	3.662.360.000	2.248.545.317	61%	1.186.463.264	1.062.082.053
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.422.310.000	15.422.310.000	5.464.214.721	35%	1.352.955.689	4.111.259.032
270 Servicio Social		46.545.000.000	46.545.000.000	26.637.000.000	57%	23.334.000.000	3.303.000.000
280 Otros Servicios en General		9.674.500.000	9.674.500.000	6.064.485.564	63%	5.281.418.027	783.067.537
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		495.000.000	495.000.000	46.000.000	9%	22.000.000	24.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		38.913.088.324	38.913.088.324	7.861.551.445	20%	2.873.900.121	4.987.651.324
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.961.188.324	1.961.188.324	461.592.580	24%	30.806.580	430.786.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		5.426.300.000	5.426.300.000	396.048.286	7%	118.998.286	277.050.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		184.000.000	184.000.000	3.483.800	2%	3.483.800	0
360 Combustibles y Lubricantes		23.256.400.000	23.256.400.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		8.085.200.000	8.085.200.000	7.000.426.779	87%	2.720.611.455	4.279.815.324
500 Inversión Física		47.064.063.421	47.064.063.421	2.575.402.780	5%	731.792.500	1.843.610.280
520 Construcciones		12.000.000.000	12.000.000.000	595.737.500	5%	375.737.500	220.000.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		10.134.063.421	10.134.063.421	118.000.000	1%	118.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.510.000.000	4.510.000.000	254.553.900	6%	238.055.000	16.498.900
570 Adquisición de Activos Intangibles		18.606.836.592	18.606.836.592	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		1.813.163.408	1.813.163.408	1.607.111.380	89%	0	1.607.111.380
900 Otros Gastos		8.875.770.409	8.875.770.409	4.450.813.485	50%	2.389.766.315	2.061.047.170
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		8.854.770.409	8.854.770.409	4.429.813.485	50%	2.368.766.315	2.061.047.170
920 Devolución de Impuestos y otros Ingresos no Tributarios		21.000.000	21.000.000	21.000.000	100%	21.000.000	0
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	364.844.000.000	364.844.000.000	291.803.236.529	80%	206.014.774.823	85.788.461.706
800 Transferencias		364.844.000.000	364.844.000.000	291.803.236.529	80%	206.014.774.823	85.788.461.706
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		364.844.000.000	364.844.000.000	291.803.236.529	80%	206.014.774.823	85.788.461.706
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	9.294.653.007	9.294.653.007	3.518.879.783	38%	768.569.800	2.750.309.983
100 Servicios Personales		6.683.956.520	6.683.956.520	2.754.287.587	41%	17.221.604	2.737.065.983
110 Remuneraciones Básicas		3.452.259.564	3.452.259.564	1.621.129.516	47%	0	1.621.129.516
120 Remuneraciones Temporales		135.624.300	135.624.300	100.695.285	74%	0	100.695.285
130 Asignaciones Complementarias		831.823.512	831.823.512	496.935.070	60%	0	496.935.070
140 Personal Contratado		2.121.249.120	2.121.249.120	518.401.010	24%	17.221.604	501.179.406
190 Otros Gastos del Personal		143.000.024	143.000.024	17.126.706	12%	0	17.126.706

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	1.649.215.601	1.649.215.601	313.258.056	19%	300.014.056	13.244.000
230 Pasajes y Viáticos	104.419.604	104.419.604	27.808.891	27%	14.564.891	13.244.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	269.428.500	269.428.500	19.581.265	7%	19.581.265	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.275.367.497	1.275.367.497	265.867.900	21%	265.867.900	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	97.930.616	97.930.616	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	6.917.625	6.917.625	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	41.748.300	41.748.300	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.264.691	49.264.691	0	0%	0	0
500 Inversión Física	374.407.900	374.407.900	0	0%	0	0
520 Construcciones	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	237.307.900	237.307.900	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	42.100.000	42.100.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	479.142.370	479.142.370	450.869.170	94%	450.869.170	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	479.142.370	479.142.370	450.869.170	94%	450.869.170	0
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	464.970	5%	464.970	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	464.970	5%	464.970	0
04 Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	7.288.580.753	7.288.580.753	1.173.669.534	16%	245.864.437	927.805.097
100 Servicios Personales	3.278.262.156	3.278.262.156	700.482.300	21%	0	700.482.300
110 Remuneraciones Básicas	1.300.895.700	1.300.895.700	700.482.300	54%	0	700.482.300
120 Remuneraciones Temporales	394.767.132	394.767.132	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	758.482.956	758.482.956	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	661.265.364	661.265.364	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	162.851.004	162.851.004	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.601.582.484	1.601.582.484	226.171.284	14%	187.889.437	38.281.847
230 Pasajes y Viáticos	990.000.000	990.000.000	74.976.440	8%	39.389.440	35.587.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	224.982.484	224.982.484	2.694.847	1%	0	2.694.847
250 Alquileres y Derechos	198.500.000	198.500.000	148.499.997	75%	148.499.997	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	188.100.000	188.100.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	242.336.113	242.336.113	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	23.760.000	23.760.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	56.432.853	56.432.853	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	56.653.740	56.653.740	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	73.264.520	73.264.520	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	27.225.000	27.225.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.626.400.000	1.626.400.000	62.163.000	4%	57.975.000	4.188.000
520 Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	306.400.000	306.400.000	62.163.000	20%	57.975.000	4.188.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	540.000.000	540.000.000	184.852.950	34%	0	184.852.950
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	540.000.000	540.000.000	184.852.950	34%	0	184.852.950

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	58.448.008.831	58.448.008.831	23.556.916.193	40%	2.533.441.412
100	Servicios Personales	42.084.437.694	42.084.437.694	19.860.271.871	47%	18.169.115
110	Remuneraciones Básicas	34.928.058.685	34.928.058.685	17.370.419.416	50%	17.370.419.416
120	Remuneraciones Temporales	1.082.042.724	1.082.042.724	199.995.680	18%	199.995.680
130	Asignaciones Complementarias	3.200.000.004	3.200.000.004	1.696.308.927	53%	1.696.308.927
140	Personal Contratado	2.756.987.940	2.756.987.940	586.603.857	21%	11.225.124
190	Otros Gastos del Personal	117.348.341	117.348.341	6.943.991	6%	6.943.991
200	Servicios No Personales	5.801.446.518	5.801.446.518	1.153.252.604	20%	337.459.029
230	Pasajes y Viáticos	1.078.038.720	1.078.038.720	12.958.334	1%	12.958.334
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.976.557.798	2.976.557.798	726.929.711	24%	164.650.225
250	Alquileres y Derechos	163.350.000	163.350.000	82.388.830	50%	24.750.470
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.553.800.000	1.553.800.000	330.975.729	21%	135.100.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	29.700.000	29.700.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.409.850.000	4.409.850.000	2.345.725.718	53%	1.980.147.268
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	339.000.000	339.000.000	119.998.650	35%	119.998.650
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	70.850.000	70.850.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	4.000.000.000	4.000.000.000	2.225.727.068	56%	1.980.147.268
500	Inversión Física	6.000.000.028	6.000.000.028	197.666.000	3%	197.666.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.300.000.028	5.300.000.028	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	700.000.000	700.000.000	197.666.000	28%	197.666.000
800	Transferencias	120.000.000	120.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	120.000.000	120.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	32.274.591	32.274.591	0	0%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	32.274.591	32.274.591	0	0%	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio - Marítimo	2.319.340.068	2.319.340.068	653.344.601	28%	118.453.622
100	Servicios Personales	1.818.386.800	1.818.386.800	402.412.585	22%	0
120	Remuneraciones Temporales	460.000.007	460.000.007	88.903.751	19%	0
130	Asignaciones Complementarias	615.000.000	615.000.000	287.997.214	47%	0
140	Personal Contratado	597.386.789	597.386.789	25.511.620	4%	0
190	Otros Gastos del Personal	146.000.004	146.000.004	0	0%	0
200	Servicios No Personales	500.953.268	500.953.268	250.932.016	50%	118.453.622
230	Pasajes y Viáticos	500.953.268	500.953.268	250.932.016	50%	118.453.622
07	Regulación del Transporte Fluvio - Marítimo	2.324.074.388	2.324.074.388	21.500.622	1%	21.500.622
200	Servicios No Personales	1.158.174.388	1.158.174.388	21.500.622	2%	21.500.622
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.000.574.388	1.000.574.388	21.500.622	2%	21.500.622
260	Servicios Técnicos y Profesionales	157.600.000	157.600.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	485.900.000	485.900.000	0	0%	0
320	Textiles y Vestuarios	198.000.000	198.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	159.200.000	159.200.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.000.000	99.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	29.700.000	29.700.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	680.000.000	680.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
08 Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.234.020.800	2.234.020.800	643.123.382	29%	214.907.552	428.215.830
200 Servicios No Personales	2.234.020.800	2.234.020.800	643.123.382	29%	214.907.552	428.215.830
230 Pasajes y Viáticos	243.050.000	243.050.000	155.671.172	64%	115.575.052	40.096.120
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.561.970.800	1.561.970.800	272.952.210	17%	13.532.500	259.419.710
250 Alquileres y Derechos	429.000.000	429.000.000	214.500.000	50%	85.800.000	128.700.000
09 Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	79.369.853.886	79.369.853.886	77.923.864.764	98%	75.961.373.201	1.962.491.563
200 Servicios No Personales	287.570.288	287.570.288	191.571.558	67%	127.197.977	64.373.581
230 Pasajes y Viáticos	148.574.288	148.574.288	121.372.838	82%	56.999.257	64.373.581
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	138.996.000	138.996.000	70.198.720	51%	70.198.720	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	815.295.350	815.295.350	25.305.000	3%	0	25.305.000
310 Productos Alimenticios	150	150	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.900.000	9.900.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	156.895.200	156.895.200	25.305.000	16%	0	25.305.000
360 Combustibles y Lubricantes	648.500.000	648.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	77.306.988.248	77.306.988.248	77.306.988.206	99%	75.834.175.224	1.472.812.982
520 Construcciones	77.306.988.248	77.306.988.248	77.306.988.206	99%	75.834.175.224	1.472.812.982
800 Transferencias	960.000.000	960.000.000	400.000.000	42%	0	400.000.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	460.000.000	460.000.000	400.000.000	87%	0	400.000.000
10 Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	19.534.428.053	19.534.428.053	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	66.727.138	66.727.138	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	66.727.138	66.727.138	0	0%	0	0
500 Inversión Física	19.467.700.915	19.467.700.915	0	0%	0	0
520 Construcciones	19.467.700.915	19.467.700.915	0	0%	0	0
14 Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	12.146.799.160	12.146.799.160	0	0%	0	0
500 Inversión Física	269.185.482	269.185.482	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	269.185.482	269.185.482	0	0%	0	0
800 Transferencias	11.877.613.678	11.877.613.678	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	360.667.042	360.667.042	0	0%	0	0
880 Transferencias de Capital al Sector Externo	11.516.946.636	11.516.946.636	0	0%	0	0
15 Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edificios Históricos	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
800 Transferencias	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100%	134.000.000	0
20 Construcción del CIRS de Emboscada	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
500 Inversión Física	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
520 Construcciones	358.986.574	358.986.574	0	0%	0	0
21 SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	1.135.738.895	1.135.738.895	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.135.738.895	1.135.738.895	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.135.738.895	1.135.738.895	0	70%	0	0
23 Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	6.850.000.000	6.850.000.000	3.000.000.000	44%	3.000.000.000	0
800 Transferencias	6.850.000.000	6.850.000.000	3.000.000.000	44%	3.000.000.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	6.850.000.000	6.850.000.000	3.000.000.000	44%	3.000.000.000	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	8.529.123.905	8.529.123.905	2.867.095.742	34%	1.975.435.456
200 Servicios No Personales		3.883.681.424	3.883.681.424	1.506.756.363	39%	615.096.077
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.883.681.424	3.883.681.424	1.506.756.363	39%	615.096.077
500 Inversión Física		4.645.442.481	4.645.442.481	1.360.339.379	29%	1.360.339.379
520	Construcciones	4.645.442.481	4.645.442.481	1.360.339.379	29%	1.360.339.379
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	1.078.616.468	1.078.616.468	223.482.279	21%	223.482.279
500 Inversión Física		1.072.215.885	1.072.215.885	217.081.696	20%	217.081.696
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.072.215.885	1.072.215.885	217.081.696	20%	217.081.696
800 Transferencias		6.400.583	6.400.583	6.400.583	100%	6.400.583
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.400.583	6.400.583	6.400.583	100%	6.400.583
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	9.222.694.822	9.222.694.822	3.824.090.382	41%	2.466.184.654
500 Inversión Física		9.172.960.979	9.172.960.979	3.802.446.082	41%	2.444.540.354
520	Construcciones	5.080.348.744	5.080.348.744	2.566.950.240	51%	1.209.044.512
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.092.612.235	4.092.612.235	1.235.495.842	30%	1.235.495.842
800 Transferencias		49.733.843	49.733.843	21.644.300	44%	21.644.300
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.733.843	49.733.843	21.644.300	44%	21.644.300
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	201.203.065.426	201.203.065.426	149.119.129.717	74%	57.931.581.818
500 Inversión Física		201.203.065.426	201.203.065.426	149.119.129.717	74%	57.931.581.818
510	Adquisición de Inmuebles	201.250.000	201.250.000	0	0%	0
520	Construcciones	194.961.511.688	194.961.511.688	149.119.129.717	76%	57.931.581.818
580	Estudios y Proyectos de Inversión	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	3.940.303.738	3.940.303.738	0	0%	0
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	197.748.481.035	197.748.481.035	188.534.117.715	95%	53.438.359.361
500 Inversión Física		197.748.481.035	197.748.481.035	188.534.117.715	95%	53.438.359.361
520	Construcciones	197.748.481.035	197.748.481.035	188.534.117.715	95%	53.438.359.361
34	Sp Const. de Autopista Ñu Guasu Asunción - Luque 6,30 Km	20.712.467.902	20.712.467.902	0	0%	0
500 Inversión Física		20.712.467.902	20.712.467.902	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	20.712.467.902	20.712.467.902	0	0%	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	188.278.417.575	188.278.417.575	79.252.355.236	42%	12.618.612.114
100 Servicios Personales		3.974.156.004	3.974.156.004	1.270.328.000	32%	416.776.000
140	Personal Contratado	3.974.156.004	3.974.156.004	1.270.328.000	32%	416.776.000
200 Servicios No Personales		10.966.261.187	10.966.261.187	2.984.344.657	27%	1.090.190.886
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.966.261.187	10.966.261.187	2.984.344.657	27%	1.090.190.886
500 Inversión Física		173.338.000.384	173.338.000.384	74.997.682.579	43%	11.111.645.228
520	Construcciones	173.338.000.384	173.338.000.384	74.997.682.579	43%	11.111.645.228
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	10.320.929.806	10.320.929.806	7.054.470.390	68%	1.999.275.730
200 Servicios No Personales		23.776.256	23.776.256	13.899.383	58%	0
230	Pasajes y Viáticos	23.776.256	23.776.256	13.899.383	58%	0
500 Inversión Física		10.297.153.550	10.297.153.550	7.040.571.007	68%	1.999.275.730
520	Construcciones	10.297.153.550	10.297.153.550	7.040.571.007	68%	1.999.275.730
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	30.330.604.271	30.330.604.271	23.617.749.560	78%	12.709.775.405
200 Servicios No Personales		645.762	645.762	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	645.762	645.762	0	0%	0
500 Inversión Física		30.329.958.509	30.329.958.509	23.617.749.560	78%	12.709.775.405
520	Construcciones	30.329.958.509	30.329.958.509	23.617.749.560	78%	12.709.775.405
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	134.371.669	134.371.669	0	0%	0
500 Inversión Física		134.371.669	134.371.669	0	0%	0
520	Construcciones	134.371.669	134.371.669	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
47	Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
48	Construcción del Distrito Eco-Inclusivo de Asunción	68.977.903.180	68.977.903.180	35.295.841.352	51%	17.269.579.765
200	Servicios No Personales	3.787.816.666	3.787.816.666	1.538.416.667	41%	1.294.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.787.816.666	3.787.816.666	1.538.416.667	41%	1.294.500.000
500	Inversión Física	65.190.086.514	65.190.086.514	33.757.424.685	52%	15.975.079.765
520	Construcciones	63.690.086.514	63.690.086.514	33.757.424.685	53%	15.975.079.765
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0
49	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Chaco	26.963.313.960	26.963.313.960	8.160.959.516	30%	7.923.110.176
200	Servicios No Personales	2.031.450.751	2.031.450.751	1.012.525.109	50%	774.675.769
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.031.450.751	2.031.450.751	1.012.525.109	50%	774.675.769
500	Inversión Física	24.931.863.209	24.931.863.209	7.148.434.407	29%	7.148.434.407
520	Construcciones	23.957.110.000	23.957.110.000	6.173.681.198	26%	6.173.681.198
580	Estudios y Proyectos de Inversión	974.753.209	974.753.209	974.753.209	100%	974.753.209
50	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción	11.321.547.666	11.321.547.666	4.404.305.633	39%	3.526.563.282
200	Servicios No Personales	2.086.005.750	2.086.005.750	557.033.334	27%	392.133.334
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.086.005.750	2.086.005.750	557.033.334	27%	392.133.334
500	Inversión Física	9.235.541.916	9.235.541.916	3.847.272.299	42%	3.134.429.948
520	Construcciones	7.656.646.451	7.656.646.451	2.866.582.302	37%	2.571.429.951
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.578.895.465	1.578.895.465	980.689.997	62%	562.999.997
51	Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar	125.854.164.181	125.854.164.181	66.685.975.467	53%	51.786.103.726
500	Inversión Física	125.854.164.181	125.854.164.181	66.685.975.467	53%	51.786.103.726
520	Construcciones	125.854.164.181	125.854.164.181	66.685.975.467	53%	51.786.103.726
52	Mantenimiento de las Defensas Costeras sobre el Río Paraguay	3.492.437.462	3.492.437.462	0	0%	0
500	Inversión Física	3.492.437.462	3.492.437.462	0	0%	0
520	Construcciones	3.492.437.462	3.492.437.462	0	0%	0
54	Construcción y Equipamiento Hospital Gral. San Estanislao	45.821.585.200	45.821.585.200	1.232.674.971	3%	426.000.000
100	Servicios Personales	166.036.000	166.036.000	0	0%	0
120	Remuneraciones Temporales	93.730.000	93.730.000	0	0%	0
130	Asignaciones Complementarias	72.306.000	72.306.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.674.961.200	1.674.961.200	497.000.000	30%	426.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.674.961.200	1.674.961.200	497.000.000	30%	426.000.000
500	Inversión Física	43.980.588.000	43.980.588.000	735.674.971	2%	0
520	Construcciones	43.980.588.000	43.980.588.000	735.674.971	2%	0
55	SP Reconstrucción de la Academia Militar - Capiatá	45.041.840.034	45.041.840.034	27.868.203.332	62%	26.755.305.308
500	Inversión Física	45.041.840.034	45.041.840.034	27.868.203.332	62%	26.755.305.308
520	Construcciones	45.041.840.034	45.041.840.034	27.868.203.332	62%	26.755.305.308
56	Construcción Gran Hospital General	151.703.706.233	151.703.706.233	6.192.841.539	4%	4.669.458.689
500	Inversión Física	151.703.706.233	151.703.706.233	6.192.841.539	4%	4.669.458.689
520	Construcciones	151.703.706.233	151.703.706.233	6.192.841.539	4%	4.669.458.689

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Ampliación de Establecimientos Educativos e IDF	124.481.615.935	124.481.615.935	10.593.336.607	9%	9.378.605.674	1.214.730.933
100 Servicios Personales		678.240.000	678.240.000	0	0%	0	0
120	Remuneraciones Temporales	337.440.000	337.440.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	273.600.000	273.600.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	67.200.000	67.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		9.070.383.459	9.070.383.459	2.345.515.734	26%	1.878.605.674	466.910.060
230	Pasajes y Viáticos	399.168.000	399.168.000	50.105.734	13%	39.312.341	10.793.393
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.671.215.459	8.671.215.459	2.295.410.000	26%	1.839.293.333	456.116.667
500 Inversión Física		114.732.992.476	114.732.992.476	8.247.820.873	7%	7.500.000.000	747.820.873
520	Construcciones	113.982.992.476	113.982.992.476	8.247.820.873	7%	7.500.000.000	747.820.873
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
58	Mejoramiento Centro de Frontera de Puerto Falcón	17.395.406.488	17.395.406.488	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		387.200.000	387.200.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	387.200.000	387.200.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		5.127.107.738	5.127.107.738	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	51.464.388	51.464.388	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.075.643.350	5.075.643.350	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.881.098.750	11.881.098.750	0	0%	0	0
520	Construcciones	11.554.728.750	11.554.728.750	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	118.680.000	118.680.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	207.690.000	207.690.000	0	0%	0	0
59	Mantenimiento y Conservación de Rutas	94.146.328.323	94.146.328.323	56.817.510.399	60%	38.399.575.138	18.417.935.261
200 Servicios No Personales		99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		94.047.328.323	94.047.328.323	56.817.510.399	60%	38.399.575.138	18.417.935.261
520	Construcciones	94.047.328.323	94.047.328.323	56.817.510.399	60%	38.399.575.138	18.417.935.261
60	Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes	54.348.352.431	54.348.352.431	48.703.475.225	90%	24.886.087.648	23.817.387.577
500 Inversión Física		54.348.352.431	54.348.352.431	48.703.475.225	90%	24.886.087.648	23.817.387.577
520	Construcciones	54.348.352.431	54.348.352.431	48.703.475.225	90%	24.886.087.648	23.817.387.577
61	Construcción de la Sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú	2.090.160.396	2.090.160.396	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.090.160.396	2.090.160.396	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.090.160.396	2.090.160.396	0	0%	0	0
62	Ampliación de la Defensa Costera de Concepción	20.000.000.000	20.000.000.000	11.335.998.488	57%	9.480.387.869	1.855.610.619
500 Inversión Física		20.000.000.000	20.000.000.000	11.335.998.488	57%	9.480.387.869	1.855.610.619
520	Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	11.335.998.488	57%	9.480.387.869	1.855.610.619
63	Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes	10.089.778.106	10.089.778.106	2.580.705.590	26%	1.063.101.437	1.517.604.153
500 Inversión Física		10.089.778.106	10.089.778.106	2.580.705.590	26%	1.063.101.437	1.517.604.153
520	Construcciones	10.089.778.106	10.089.778.106	2.580.705.590	26%	1.063.101.437	1.517.604.153
SUBTOTAL		2.470.649.794.109	2.470.649.794.109	1.309.701.644.262	53%	848.232.664.335	461.468.979.927

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	3.645.119.502.315	3.645.119.502.315	1.990.103.892.615	55%	1.594.285.212.589	395.818.680.026
04	SP FOCER-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemito	998.437.700	998.437.700	81.324.255	8%	0	81.324.255
500 Inversión Física		998.437.700	998.437.700	81.324.255	8%	0	81.324.255
520	Construcciones	852.719.095	852.719.095	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	145.718.605	145.718.605	81.324.255	56%	0	81.324.255
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	62.938.258.602	62.938.258.602	27.638.156.220	44%	19.221.404.858	8.416.751.362
200 Servicios No Personales		50.000.000	50.000.000	24.216.075	48%	19.588.114	4.627.961
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	24.216.075	48%	19.588.114	4.627.961
500 Inversión Física		62.788.258.602	62.788.258.602	27.613.940.145	44%	19.201.816.744	8.412.123.401
520	Construcciones	62.388.258.602	62.388.258.602	27.334.910.207	44%	19.201.816.744	8.133.093.463
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	400.000.000	400.000.000	279.029.938	70%	0	279.029.938
800 Transferencias		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	119.056.154.202	119.056.154.202	45.799.804.486	38%	39.214.614.739	6.585.189.747
200 Servicios No Personales		6.449.057.998	6.449.057.998	1.134.071.084	18%	841.571.084	292.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.449.057.998	6.449.057.998	1.134.071.084	18%	841.571.084	292.500.000
500 Inversión Física		111.906.606.304	111.906.606.304	44.621.835.402	40%	38.373.043.655	6.248.791.747
520	Construcciones	110.677.170.032	110.677.170.032	44.166.374.269	40%	38.280.222.170	5.886.152.099
580	Estudios y Proyectos de Inversión	210.361.550	210.361.550	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.019.074.722	1.019.074.722	455.461.133	45%	92.821.485	362.639.648
800 Transferencias		700.489.900	700.489.900	43.898.000	6%	0	43.898.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	700.489.900	700.489.900	43.898.000	6%	0	43.898.000
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	42.200.387.990	42.200.387.990	36.576.059.221	87%	27.681.842.393	8.894.216.828
200 Servicios No Personales		317.600.000	317.600.000	58.028.225	18%	47.188.025	10.840.200
230	Pasajes y Viáticos	317.600.000	317.600.000	58.028.225	18%	47.188.025	10.840.200
500 Inversión Física		41.882.787.990	41.882.787.990	36.518.030.996	87%	27.634.654.368	8.883.376.628
520	Construcciones	41.882.787.990	41.882.787.990	36.518.030.996	87%	27.634.654.368	8.883.376.628
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	7.517.922.192	7.517.922.192	2.892.695.717	38%	2.892.695.717	0
500 Inversión Física		7.517.922.192	7.517.922.192	2.892.695.717	38%	2.892.695.717	0
520	Construcciones	7.517.922.192	7.517.922.192	2.892.695.717	38%	2.892.695.717	0
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	8.167.000.000	8.167.000.000	491.828.835	6%	411.308.835	80.520.000
200 Servicios No Personales		2.052.000.000	2.052.000.000	80.520.000	4%	0	80.520.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.052.000.000	2.052.000.000	80.520.000	4%	0	80.520.000
500 Inversión Física		6.115.000.000	6.115.000.000	411.308.835	7%	411.308.835	0
520	Construcciones	6.000.000.000	6.000.000.000	411.308.835	7%	411.308.835	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	115.000.000	115.000.000	0	0%	0	0
12	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag.	39.297.939.004	39.297.939.004	16.612.356.028	42%	12.704.587.659	3.907.768.369
200 Servicios No Personales		1.928.899.990	1.928.899.990	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	69.299.990	69.299.990	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.859.600.000	1.859.600.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		37.369.039.014	37.369.039.014	16.612.356.028	44%	12.704.587.659	3.907.768.369
520	Construcciones	37.369.039.014	37.369.039.014	16.612.356.028	44%	12.704.587.659	3.907.768.369

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	11.049.500.000	11.049.500.000	4.370.808.407	40%	4.264.829.265
200	Servicios No Personales	49.500.000	49.500.000	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	49.500.000	49.500.000	0	0%	0
500	Inversión Física	11.000.000.000	11.000.000.000	4.370.808.407	40%	4.264.829.265
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	3.527.467.965	35%	3.527.467.965
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	843.340.442	84%	105.979.142
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	20.210.827.520	20.210.827.520	3.920.746.778	19%	2.574.524.810
500	Inversión Física	20.210.827.520	20.210.827.520	3.920.746.778	19%	2.574.524.810
520	Construcciones	20.210.827.520	20.210.827.520	3.920.746.778	19%	2.574.524.810
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	76.828.602.646	76.828.602.646	60.338.861.422	79%	58.007.401.297
100	Servicios Personales	158.400.000	158.400.000	79.200.000	50%	52.800.000
140	Personal Contratado	158.400.000	158.400.000	79.200.000	50%	52.800.000
200	Servicios No Personales	1.832.985.000	1.832.985.000	69.688.583	4%	67.458.543
230	Pasajes y Viáticos	95.040.000	95.040.000	6.152.583	6%	3.922.543
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.737.945.000	1.737.945.000	63.536.000	4%	63.536.000
500	Inversión Física	74.837.217.646	74.837.217.646	60.189.972.839	80%	57.887.142.754
520	Construcciones	74.837.217.646	74.837.217.646	60.189.972.839	80%	57.887.142.754
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	43.608.706.189	43.608.706.189	18.032.062.957	41%	14.783.826.573
200	Servicios No Personales	1.758.566.957	1.758.566.957	397.000.000	23%	338.000.000
230	Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos Y Profesionales	1.616.006.957	1.616.006.957	397.000.000	25%	338.000.000
500	Inversión Física	41.850.139.232	41.850.139.232	17.635.062.957	42%	14.445.826.573
520	Construcciones	34.479.923.398	34.479.923.398	14.846.548.623	43%	14.445.826.573
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.370.215.834	7.370.215.834	2.788.514.334	38%	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	8.658.441.379	8.658.441.379	1.888.121.979	22%	1.280.244.688
200	Servicios No Personales	8.519.757.751	8.519.757.751	1.888.121.979	22%	1.280.244.688
230	Pasajes y Viáticos	8.519.757.751	8.519.757.751	1.888.121.979	22%	1.280.244.688
300	Bienes de Consumo e Insumos	138.683.628	138.683.628	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	138.683.628	138.683.628	0	0%	0
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	7.300.041.917	7.300.041.917	1.126.596.565	15%	1.126.596.565
500	Inversión Física	7.300.041.917	7.300.041.917	1.126.596.565	15%	1.126.596.565
520	Construcciones	7.300.041.917	7.300.041.917	1.126.596.565	15%	1.126.596.565
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
500	Inversión Física	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
520	Construcciones	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	989.387.695	989.387.695	0	0%	0
500	Inversión Física	989.387.695	989.387.695	0	0%	0
520	Construcciones	989.387.695	989.387.695	0	0%	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	1.072.645.709	1.072.645.709	440.358.188	41%	0
500	Inversión Física	699.033.559	699.033.559	84.625.250	12%	0
520	Construcciones	614.408.309	614.408.309	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	84.625.250	84.625.250	84.625.250	100%	84.625.250

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	373.612.150	373.612.150	355.732.938	95%	0	355.732.938
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	373.612.150	373.612.150	355.732.938	95%	0	355.732.938
45 Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
46 Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	1.830.554.015	1.830.554.015	630.554.015	34%	0	630.554.015
500 Inversión Física	1.830.554.015	1.830.554.015	630.554.015	34%	0	630.554.015
520 Construcciones	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	630.554.015	630.554.015	630.554.015	100%	0	630.554.015
49 Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	988.318.260.335	988.318.260.335	423.168.656.091	43%	419.707.164.509	3.461.491.582
500 Inversión Física	4.200.000.000	4.200.000.000	3.252.918.877	77%	630.277.363	2.622.641.514
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.200.000.000	4.200.000.000	3.252.918.877	77%	630.277.363	2.622.641.514
600 Inversión Financiera	981.768.260.335	981.768.260.335	419.076.887.146	43%	419.076.887.146	0
630 Préstamos al Sector Privado	981.768.260.335	981.768.260.335	419.076.887.146	43%	419.076.887.146	0
800 Transferencias	2.350.000.000	2.350.000.000	838.850.068	36%	0	838.850.068
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	850.000.000	850.000.000	838.850.068	99%	0	838.850.068
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
50 Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	2.234.117.324	2.234.117.324	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.537.761.529	1.537.761.529	0	0%	0	0
520 Construcciones	687.683.970	687.683.970	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	850.077.559	850.077.559	0	0%	0	0
800 Transferencias	696.355.795	696.355.795	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	696.355.795	696.355.795	0	0%	0	0
52 Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	1.689.284.709	1.689.284.709	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.689.284.709	1.689.284.709	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.689.284.709	1.689.284.709	0	0%	0	0
53 Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	5.334.588.544	5.334.588.544	4.083.223.659	77%	0	4.083.223.659
200 Servicios No Personales	160.000.000	160.000.000	72.441.600	45%	0	72.441.600
260 Servicios Técnicos y Profesionales	160.000.000	160.000.000	72.441.600	45%	0	72.441.600
500 Inversión Física	5.174.588.544	5.174.588.544	4.010.782.059	78%	0	4.010.782.059
520 Construcciones	5.174.588.544	5.174.588.544	4.010.782.059	78%	0	4.010.782.059
54 Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	2.942.934.290	2.942.934.290	0	0%	0	0
800 Transferencias	2.942.934.290	2.942.934.290	0	0%	0	0
880 Transferencias de Capital al Sector Externo	2.942.934.290	2.942.934.290	0	0%	0	0
55 Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	20.779.000.000	20.779.000.000	6.970.525.462	34%	4.418.624.295	2.551.901.167
200 Servicios No Personales	1.795.000.000	1.795.000.000	359.069.600	20%	0	359.069.600
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.795.000.000	1.795.000.000	359.069.600	20%	0	359.069.600
500 Inversión Física	18.984.000.000	18.984.000.000	6.611.455.862	35%	4.418.624.295	2.192.831.567
520 Construcciones	17.984.000.000	17.984.000.000	5.659.324.504	31%	3.704.525.777	1.954.798.727
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	1.000.000.000	1.000.000.000	952.131.358	95%	714.098.518	238.032.840
56 Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	201.106.980.210	201.106.980.210	151.018.233.323	75%	57.586.313.422	93.431.919.901
200 Servicios No Personales	9.000.397.160	9.000.397.160	4.712.564.164	52%	790.094.319	3.922.469.845
230 Pasajes y Viáticos	49.500.013	49.500.013	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	8.950.897.147	8.950.897.147	4.712.564.164	53%	790.094.319	3.922.469.845
500 Inversión Física	192.106.583.050	192.106.583.050	146.305.669.159	76%	56.796.219.103	89.509.450.056
520 Construcciones	192.106.583.050	192.106.583.050	146.305.669.159	76%	56.796.219.103	89.509.450.056

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	110.069.455.359	110.069.455.359	102.097.457.187	93%	74.619.480.260	27.477.976.927
200 Servicios No Personales		10.184.455.359	10.184.455.359	7.566.079.412	74%	5.053.172.575	2.512.906.837
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	24.108.448	48%	22.171.162	1.937.286
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.134.455.359	10.134.455.359	7.541.970.964	74%	5.031.001.413	2.510.969.551
500 Inversión Física		99.885.000.000	99.885.000.000	94.531.377.775	95%	69.566.307.685	24.965.070.090
520	Construcciones	99.600.000.000	99.600.000.000	94.531.377.775	95%	69.566.307.685	24.965.070.090
580	Estudios y Proyectos de Inversión	285.000.000	285.000.000	0	0%	0	0
58	Construcción Ruta N° 9 y Rafael Franco	2.024.750.000	2.024.750.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		24.750.000	24.750.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	24.750.000	24.750.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	100.753.279.779	100.753.279.779	37.054.272.965	37%	25.788.849.814	11.265.423.151
100 Servicios Personales		787.600.000	787.600.000	365.200.000	46%	245.280.000	119.920.000
140	Personal Contratado	787.600.000	787.600.000	365.200.000	46%	245.280.000	119.920.000
200 Servicios No Personales		1.432.925.395	1.432.925.395	51.264.944	4%	18.511.844	32.753.100
220	Transporte y Almacenaje	439.073.189	439.073.189	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	457.535.260	457.535.260	51.264.944	11%	18.511.844	32.753.100
260	Servicios Técnicos y Profesionales	536.316.946	536.316.946	0	0%	0	0
500 Inversión Física		98.532.754.384	98.532.754.384	36.637.808.021	37%	25.525.057.970	11.112.750.051
520	Construcciones	98.391.241.236	98.391.241.236	36.637.808.021	37%	25.525.057.970	11.112.750.051
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	141.513.148	141.513.148	0	0%	0	0
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	5.382.998.569	5.382.998.569	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.382.998.569	5.382.998.569	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.382.998.569	5.382.998.569	0	0%	0	0
62	Sp. FOCEM - ASF. R.8.S. Salvador - Borja - Iturbe y Ramos a Rojas Pot.	90.956.276	90.956.276	0	0%	0	0
800 Transferencias		90.956.276	90.956.276	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	90.956.276	90.956.276	0	0%	0	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
67	Sp. Focem - Recapado Ruta 1 - La Paz	1.043.587.598	1.043.587.598	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.043.587.598	1.043.587.598	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.043.587.598	1.043.587.598	0	0%	0	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	59.819.669	59.819.669	0	0%	0
500	Inversión Física	59.819.669	59.819.669	0	0%	0
520	Construcciones	59.819.669	59.819.669	0	0%	0
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0%	0
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	61.954.842.941	61.954.842.941	27.966.680.798	45%	21.579.474.659
500	Inversión Física	61.954.842.941	61.954.842.941	27.966.680.798	45%	21.579.474.659
520	Construcciones	61.954.842.941	61.954.842.941	27.966.680.798	45%	21.579.474.659
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	2.496.437.410	2.496.437.410	2.496.437.410	100%	2.496.437.410
500	Inversión Física	2.496.437.410	2.496.437.410	2.496.437.410	100%	2.496.437.410
520	Construcciones	2.496.437.410	2.496.437.410	2.496.437.410	100%	2.496.437.410
74	Sp. Focem - Rehabilitación Corredores Viales	4.370.655.856	4.370.655.856	0	0%	0
800	Transferencias	4.370.655.856	4.370.655.856	0	0%	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	4.370.655.856	4.370.655.856	0	0%	0
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	221.770.520.829	221.770.520.829	64.276.506.938	29%	53.790.797.899
200	Servicios No Personales	6.958.016.337	6.958.016.337	4.406.703.811	63%	1.827.648.947
230	Pasajes y Viáticos	24.750.000	24.750.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.933.266.337	6.933.266.337	4.406.703.811	64%	1.827.648.947
500	Inversión Física	211.812.504.492	211.812.504.492	59.504.143.143	28%	51.934.503.243
520	Construcciones	191.312.504.492	191.312.504.492	49.576.847.466	26%	45.813.160.594
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	20.500.000.000	20.500.000.000	9.927.295.677	48%	6.121.342.649
800	Transferencias	3.000.000.000	3.000.000.000	365.659.984	12%	28.645.709
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.000.000.000	3.000.000.000	365.659.984	12%	28.645.709
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	6.553.500.000	6.553.500.000	478.832.750	7%	280.479.660
200	Servicios No Personales	643.500.000	643.500.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	643.500.000	643.500.000	0	0%	0
500	Inversión Física	5.660.000.000	5.660.000.000	478.832.750	8%	280.479.660
520	Construcciones	5.000.000.000	5.000.000.000	280.479.660	6%	280.479.660
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	660.000.000	660.000.000	198.353.090	30%	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
77	Construcción Rehab. Ruta Py 10 San Crist. Paso Yobai 79,75 Km	2.904.647.465	2.904.647.465	0	0%	0
500	Inversión Física	2.904.647.465	2.904.647.465	0	0%	0
520	Construcciones	2.904.647.465	2.904.647.465	0	0%	0
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	19.620.763.405	19.620.763.405	13.154.334.273	67%	10.120.247.662
200	Servicios No Personales	1.000.000.000	1.000.000.000	375.000.000	38%	231.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000.000	1.000.000.000	375.000.000	38%	231.000.000
500	Inversión Física	18.620.763.405	18.620.763.405	12.779.334.273	69%	9.889.247.662
520	Construcciones	14.217.720.000	14.217.720.000	9.183.108.145	65%	8.522.015.689
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.403.043.405	4.403.043.405	3.596.226.128	82%	1.367.231.973
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	46.321.167.017	46.321.167.017	29.070.680.273	63%	25.855.753.314
200	Servicios No Personales	2.361.500.000	2.361.500.000	194.652.000	8%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.361.500.000	2.361.500.000	194.652.000	8%	0
500	Inversión Física	43.959.667.017	43.959.667.017	28.876.028.273	66%	25.855.753.314
520	Construcciones	39.900.000.000	39.900.000.000	26.884.755.988	67%	25.018.857.002
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	4.059.667.017	4.059.667.017	1.991.272.285	49%	836.896.312
81	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nva. Esperanza - Pto. Marangatu	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0%	0
500	Inversión Física	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0%	0
520	Construcciones	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
83	Mejoramiento Rehabilitación y Mantenimiento Py 22 Concepción - Vallemi	106.315.801.939	106.315.801.939	0	0%	0
200	Servicios No Personales	113.535.000	113.535.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	113.535.000	113.535.000	0	0%	0
500	Inversión Física	96.956.859.439	96.956.859.439	0	0%	0
520	Construcciones	96.956.859.439	96.956.859.439	0	0%	0
700	Servicio de la Deuda Pública	9.245.407.500	9.245.407.500	0	0%	0
760	Otros Gastos del Servicio de la Deuda	9.245.407.500	9.245.407.500	0	0%	0
84	Construcción y Mejoramiento Zona Franca Concepción	31.529.644.652	31.529.644.652	0	0%	0
500	Inversión Física	31.529.644.652	31.529.644.652	0	0%	0
520	Construcciones	31.529.644.652	31.529.644.652	0	0%	0
86	SP Mej. Gestión y Mant de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
500	Inversión Física	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
520	Construcciones	1.096.754.065	1.096.754.065	0	0%	0
87	Mejoramiento Travesía Urbana de Coronel Oviedo	37.179.098.588	37.179.098.588	22.602.696.695	61%	22.602.696.695
500	Inversión Física	37.179.098.588	37.179.098.588	22.602.696.695	61%	22.602.696.695
520	Construcciones	37.179.098.588	37.179.098.588	22.602.696.695	61%	22.602.696.695
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	28.621.219.777	28.621.219.777	13.500.764.013	47%	13.031.494.713
500	Inversión Física	28.621.219.777	28.621.219.777	13.500.764.013	47%	13.031.494.713
520	Construcciones	28.621.219.777	28.621.219.777	13.500.764.013	47%	13.031.494.713
90	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar- Humaita - Paso Patria	49.700.000.000	49.700.000.000	49.377.227.124	99%	48.222.326.490
500	Inversión Física	49.700.000.000	49.700.000.000	49.377.227.124	99%	48.222.326.490
520	Construcciones	49.700.000.000	49.700.000.000	49.377.227.124	99%	48.222.326.490
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	72.467.730.450	72.467.730.450	44.461.358.725	61%	26.342.890.282
200	Servicios No Personales	5.029.789.961	5.029.789.961	2.574.402.680	51%	1.257.650.841
230	Pasajes y Viáticos	59.400.000	59.400.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.970.389.961	4.970.389.961	2.574.402.680	52%	1.257.650.841
500	Inversión Física	65.537.940.489	65.537.940.489	41.711.642.021	64%	25.055.160.601
520	Construcciones	56.270.772.802	56.270.772.802	38.235.977.667	68%	24.931.790.685
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	9.267.167.687	9.267.167.687	3.475.664.354	38%	123.369.916
800	Transferencias	1.900.000.000	1.900.000.000	175.314.024	9%	30.078.840
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.900.000.000	1.900.000.000	175.314.024	9%	30.078.840
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'í - Gral. Bruguez	269.378.769.568	269.378.769.568	248.045.237.303	92%	204.659.455.817
200	Servicios No Personales	1.188.000.000	1.188.000.000	1.123.210.365	95%	1.123.210.365
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.188.000.000	1.188.000.000	1.123.210.365	95%	1.123.210.365
500	Inversión Física	268.190.769.568	268.190.769.568	246.922.026.938	92%	203.536.245.452
520	Construcciones	268.190.769.568	268.190.769.568	246.922.026.938	92%	203.536.245.452
94	Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Cap Bado - Ypejhu	199.614.871.665	199.614.871.665	140.864.168.334	71%	107.209.293.906
100	Servicios Personales	948.200.000	948.200.000	378.000.000	40%	252.000.000
140	Personal Contratado	930.000.000	930.000.000	378.000.000	41%	252.000.000
190	Otros Gastos del Personal	18.200.000	18.200.000	0	0%	0
200	Servicios No Personales	1.568.400.000	1.568.400.000	133.724.474	9%	97.725.318
230	Pasajes y Viáticos	198.000.000	198.000.000	133.724.474	68%	97.725.318
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.370.400.000	1.370.400.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	196.098.271.665	196.098.271.665	140.352.443.860	72%	106.859.568.588	33.492.875.272
520 Construcciones	189.598.271.665	189.598.271.665	140.352.443.860	74%	106.859.568.588	33.492.875.272
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
95 Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 Km.	420.897.624.891	420.897.624.891	299.335.203.303	71%	242.740.463.887	56.594.739.416
100 Servicios Personales	1.440.000.000	1.440.000.000	587.840.400	41%	391.893.600	195.946.800
140 Personal Contratado	1.440.000.000	1.440.000.000	587.840.400	41%	391.893.600	195.946.800
200 Servicios No Personales	1.553.400.000	1.553.400.000	195.969.636	13%	64.317.895	131.651.741
230 Pasajes y Viáticos	198.000.000	198.000.000	119.129.636	60%	64.317.895	54.811.741
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.355.400.000	1.355.400.000	76.840.000	6%	0	76.840.000
500 Inversión Física	416.404.224.891	416.404.224.891	298.551.393.267	72%	242.284.252.392	56.267.140.875
520 Construcciones	399.404.224.891	399.404.224.891	298.551.393.267	75%	242.284.252.392	56.267.140.875
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	17.000.000.000	17.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
98 Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy - San José de los Arroyos	11.520.753.523	11.520.753.523	8.083.413.752	70%	7.768.230.703	315.183.049
500 Inversión Física	11.520.753.523	11.520.753.523	8.083.413.752	70%	7.768.230.703	315.183.049
520 Construcciones	11.520.753.523	11.520.753.523	8.083.413.752	70%	7.768.230.703	315.183.049
99 Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	132.073.124.787	132.073.124.787	81.157.647.164	61%	41.300.859.793	39.856.787.371
200 Servicios No Personales	1.302.598.116	1.302.598.116	456.136.463	35%	359.401.315	96.735.148
230 Pasajes y Viáticos	643.500.000	643.500.000	456.136.463	71%	359.401.315	96.735.148
240 Gastos por Servico de Aseo, Mantenimiento y Reparación	659.098.116	659.098.116	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	45.341.051.884	45.341.051.884	7.983.432.384	18%	7.983.432.384	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	12.989.301.884	12.989.301.884	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	32.051.750.000	32.051.750.000	7.983.432.384	25%	7.983.432.384	0
500 Inversión Física	52.969.396.317	52.969.396.317	45.399.939.837	86%	16.458.026.094	28.941.913.743
520 Construcciones	52.369.396.317	52.369.396.317	44.802.756.671	86%	15.860.842.928	28.941.913.743
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	600.000.000	600.000.000	597.183.166	99%	597.183.166	0
800 Transferencias	32.460.078.470	32.460.078.470	27.318.138.480	84%	16.500.000.000	10.818.138.480
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.776.699.000	4.776.699.000	4.668.138.480	98%	0	4.668.138.480
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	27.683.379.470	27.683.379.470	22.650.000.000	82%	16.500.000.000	6.150.000.000
002 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	500.600.679.296	500.600.679.296	245.211.746.579	49%	188.416.138.646	56.795.607.933
01 SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	7.927.050.968	7.927.050.968	0	0%	0	0
500 Inversión Física	7.927.050.968	7.927.050.968	0	0%	0	0
520 Construcciones	7.927.050.968	7.927.050.968	0	0%	0	0
03 Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	5.409.520.013	5.409.520.013	809.329.964	15%	0	809.329.964
200 Servicios No Personales	1.422.791.755	1.422.791.755	610.106.647	43%	0	610.106.647
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.422.791.755	1.422.791.755	610.106.647	43%	0	610.106.647
500 Inversión Física	3.986.728.258	3.986.728.258	199.223.317	5%	0	199.223.317
520 Construcciones	3.986.728.258	3.986.728.258	199.223.317	5%	0	199.223.317

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	35.939.328.601	35.939.328.601	5.537.628.684	15%	4.413.424.245	1.124.204.439
100 Servicios Personales		853.800.000	853.800.000	782.010.000	92%	782.010.000	0
140 Personal Contratado		827.700.000	827.700.000	782.010.000	94%	782.010.000	0
190 Otros Gastos del Personal		26.100.000	26.100.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.262.300.000	2.262.300.000	1.077.946.989	48%	394.690.806	683.256.183
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.262.300.000	2.262.300.000	1.077.946.989	48%	394.690.806	683.256.183
500 Inversión Física		32.823.228.601	32.823.228.601	3.677.671.695	11%	3.236.723.439	440.948.256
520 Construcciones		32.823.228.601	32.823.228.601	3.677.671.695	11%	3.236.723.439	440.948.256
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	683.100.000	683.100.000	591.463.249	87%	591.247.995	215.254
200 Servicios No Personales		683.100.000	683.100.000	591.463.249	87%	591.247.995	215.254
230 Pasejes y Viáticos		683.100.000	683.100.000	591.463.249	87%	591.247.995	215.254
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	61.721.730.221	61.721.730.221	26.818.273.328	43%	14.703.917.633	12.114.355.695
200 Servicios No Personales		14.124.236.540	14.124.236.540	3.081.718.228	22%	770.671.049	2.311.047.179
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.124.236.540	14.124.236.540	3.081.718.228	22%	770.671.049	2.311.047.179
500 Inversión Física		47.597.493.681	47.597.493.681	23.736.555.100	50%	13.933.246.584	9.803.308.516
520 Construcciones		47.486.663.705	47.486.663.705	23.736.555.100	50%	13.933.246.584	9.803.308.516
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		110.829.976	110.829.976	0	0%	0	0
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	81.008.406.558	81.008.406.558	11.204.725.310	14%	5.412.566.154	5.792.159.156
200 Servicios No Personales		21.272.000.000	21.272.000.000	7.072.711.937	33%	3.630.172.551	3.442.539.386
230 Pasejes y Viáticos		17.990.000.000	17.990.000.000	7.072.711.937	39%	3.630.172.551	3.442.539.386
240 Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.282.000.000	3.282.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		56.238.915.978	56.238.915.978	2.349.619.770	4%	0	2.349.619.770
320 Textiles y Vestuarios		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		49.953.147.631	49.953.147.631	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		5.285.768.347	5.285.768.347	2.349.619.770	44%	0	2.349.619.770
500 Inversión Física		3.497.490.580	3.497.490.580	1.782.393.603	51%	1.782.393.603	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		3.497.490.580	3.497.490.580	1.782.393.603	51%	1.782.393.603	0
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	19.051.265.693	19.051.265.693	17.339.977.109	91%	15.605.807.218	1.734.169.891
500 Inversión Física		19.051.265.693	19.051.265.693	17.339.977.109	91%	15.605.807.218	1.734.169.891
520 Construcciones		19.051.265.693	19.051.265.693	17.339.977.109	91%	15.605.807.218	1.734.169.891
19	Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá	30.552.813.654	30.552.813.654	23.805.134.072	78%	23.682.160.647	122.973.425
500 Inversión Física		30.552.813.654	30.552.813.654	23.805.134.072	78%	23.682.160.647	122.973.425
520 Construcciones		30.552.813.654	30.552.813.654	23.805.134.072	78%	23.682.160.647	122.973.425
20	Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo	16.124.961.633	16.124.961.633	11.058.856.492	69%	10.743.755.400	315.101.092
500 Inversión Física		16.124.961.633	16.124.961.633	11.058.856.492	69%	10.743.755.400	315.101.092
520 Construcciones		16.124.961.633	16.124.961.633	11.058.856.492	69%	10.743.755.400	315.101.092
21	Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby	10.285.125.196	10.285.125.196	7.931.679.639	77%	7.694.599.045	237.080.594
500 Inversión Física		10.285.125.196	10.285.125.196	7.931.679.639	77%	7.694.599.045	237.080.594
520 Construcciones		10.285.125.196	10.285.125.196	7.931.679.639	77%	7.694.599.045	237.080.594
22	Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá	24.779.216.128	24.779.216.128	16.725.298.489	67%	14.102.921.035	2.622.377.454
500 Inversión Física		24.779.216.128	24.779.216.128	16.725.298.489	67%	14.102.921.035	2.622.377.454
520 Construcciones		24.779.216.128	24.779.216.128	16.725.298.489	67%	14.102.921.035	2.622.377.454
23	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá	18.997.121.589	18.997.121.589	12.931.471.289	68%	12.075.597.299	855.873.990
500 Inversión Física		18.997.121.589	18.997.121.589	12.931.471.289	68%	12.075.597.299	855.873.990
520 Construcciones		18.997.121.589	18.997.121.589	12.931.471.289	68%	12.075.597.299	855.873.990

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré	2.571.281.301	2.571.281.301	2.261.165.080	88%	1.315.687.637	945.477.443
500	Inversión Física	2.571.281.301	2.571.281.301	2.261.165.080	88%	1.315.687.637	945.477.443
520	Construcciones	2.571.281.301	2.571.281.301	2.261.165.080	88%	1.315.687.637	945.477.443
27	Mejoramiento del Tramo "Casilla 2- Tembiapora"	32.904.492.800	32.904.492.800	27.521.499.097	84%	15.197.844.514	12.323.654.583
500	Inversión Física	32.904.492.800	32.904.492.800	27.521.499.097	84%	15.197.844.514	12.323.654.583
520	Construcciones	32.904.492.800	32.904.492.800	27.521.499.097	84%	15.197.844.514	12.323.654.583
28	Mejoramiento Caminos Distritales de Villeta, Departamento Central	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
29	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora - Santa Inés	16.855.353.000	16.855.353.000	12.734.271.665	76%	9.583.575.573	3.150.696.092
500	Inversión Física	16.855.353.000	16.855.353.000	12.734.271.665	76%	9.583.575.573	3.150.696.092
520	Construcciones	16.855.353.000	16.855.353.000	12.734.271.665	76%	9.583.575.573	3.150.696.092
30	Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá	25.633.733.590	25.633.733.590	23.312.397.203	91%	19.484.633.198	3.827.764.005
500	Inversión Física	25.633.733.590	25.633.733.590	23.312.397.203	91%	19.484.633.198	3.827.764.005
520	Construcciones	25.633.733.590	25.633.733.590	23.312.397.203	91%	19.484.633.198	3.827.764.005
31	Mejoramiento Quyuqyho - María Antonia - Ñandu Rugua - Mbuyapey	12.274.634.192	12.274.634.192	11.661.460.434	95%	10.046.578.874	1.614.881.560
500	Inversión Física	12.274.634.192	12.274.634.192	11.661.460.434	95%	10.046.578.874	1.614.881.560
520	Construcciones	12.274.634.192	12.274.634.192	11.661.460.434	95%	10.046.578.874	1.614.881.560
32	Mejoramiento Tramo Juan E. Oleary - San Cristobal	35.345.247.918	35.345.247.918	28.510.860.908	81%	23.761.822.179	4.749.038.729
500	Inversión Física	35.345.247.918	35.345.247.918	28.510.860.908	81%	23.761.822.179	4.749.038.729
520	Construcciones	35.345.247.918	35.345.247.918	28.510.860.908	81%	23.761.822.179	4.749.038.729
36	Mejoramiento de Caminos Distritales de Itaguá	1.546.000.000	1.546.000.000	1.045.999.999	68%	0	1.045.999.999
500	Inversión Física	1.546.000.000	1.546.000.000	1.045.999.999	68%	0	1.045.999.999
520	Construcciones	1.546.000.000	1.546.000.000	1.045.999.999	68%	0	1.045.999.999
37	Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré	935.000.000	935.000.000	934.470.900	99%	0	934.470.900
500	Inversión Física	935.000.000	935.000.000	934.470.900	99%	0	934.470.900
520	Construcciones	935.000.000	935.000.000	934.470.900	99%	0	934.470.900
39	Mejoramiento de Caminos Distritales de Luque	1.965.000.000	1.965.000.000	487.453.509	25%	0	487.453.509
500	Inversión Física	1.965.000.000	1.965.000.000	487.453.509	25%	0	487.453.509
520	Construcciones	1.965.000.000	1.965.000.000	487.453.509	25%	0	487.453.509
44	Mejoramiento de Caminos Distritales de Presidente Hayes	2.455.296.241	2.455.296.241	1.988.330.159	81%	0	1.988.330.159
500	Inversión Física	2.455.296.241	2.455.296.241	1.988.330.159	81%	0	1.988.330.159
520	Construcciones	2.455.296.241	2.455.296.241	1.988.330.159	81%	0	1.988.330.159
47	Mejoramiento Inmaculada - Fondo San Blas- Potrero Naranjo	27.038.000.000	27.038.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	2.680.000.000	2.680.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.680.000.000	2.680.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	24.358.000.000	24.358.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	24.358.000.000	24.358.000.000	0	0%	0	0
48	Mejoramiento San Dionisio- San Estanislao	8.142.000.000	8.142.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.142.000.000	8.142.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	8.142.000.000	8.142.000.000	0	0%	0	0
49	Mejoramiento del Tramo General Artigas - Fram	10.455.000.000	10.455.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.455.000.000	10.455.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	10.455.000.000	10.455.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	509.114.131.543	509.114.131.543	121.279.116.647	24%	69.557.645.747	51.721.470.900
01	SP Proyecto Acueducto	1.333.153.197	1.333.153.197	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.333.153.197	1.333.153.197	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.333.153.197	1.333.153.197	0	0%	0	0
02	SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	24.419.124.305	24.419.124.305	3.890.706.467	16%	1.686.128.297	2.204.578.170
100	Servicios Personales	606.000.000	606.000.000	270.000.000	45%	180.000.000	90.000.000
140	Personal Contratado	606.000.000	606.000.000	270.000.000	45%	180.000.000	90.000.000
200	Servicios No Personales	1.289.687.003	1.289.687.003	219.156.661	17%	206.086.421	13.070.240
230	Pasejes y Viáticos	689.687.003	689.687.003	219.156.661	32%	206.086.421	13.070.240
260	Servicios Técnicos y Profesionales	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	22.523.437.302	22.523.437.302	3.401.549.806	15%	1.300.041.876	2.101.507.930
520	Construcciones	22.523.437.302	22.523.437.302	3.401.549.806	15%	1.300.041.876	2.101.507.930
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	25.588.358.209	25.588.358.209	25.464.270.605	99%	0	25.464.270.605
500	Inversión Física	25.588.358.209	25.588.358.209	25.464.270.605	99%	0	25.464.270.605
520	Construcciones	25.588.358.209	25.588.358.209	25.464.270.605	99%	0	25.464.270.605
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	14.519.870.489	14.519.870.489	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	1.556.093.761	1.556.093.761	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.556.093.761	1.556.093.761	0	0%	0	0
500	Inversión Física	12.963.776.728	12.963.776.728	0	0%	0	0
520	Construcciones	12.963.776.728	12.963.776.728	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré	100.359.715.658	100.359.715.658	5.327.442.886	5%	1.354.607.040	3.972.835.846
100	Servicios Personales	684.000.000	684.000.000	139.650.000	20%	0	139.650.000
130	Asignaciones Complementarias	684.000.000	684.000.000	139.650.000	20%	0	139.650.000
200	Servicios No Personales	9.066.497.321	9.066.497.321	1.253.000.000	14%	1.074.000.000	179.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	9.066.497.321	9.066.497.321	1.253.000.000	14%	1.074.000.000	179.000.000
500	Inversión Física	89.356.508.337	89.356.508.337	3.496.344.386	4%	0	3.496.344.386
520	Construcciones	89.356.508.337	89.356.508.337	3.496.344.386	4%	0	3.496.344.386
800	Transferencias	1.252.710.000	1.252.710.000	438.448.500	35%	280.607.040	157.841.460
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.252.710.000	1.252.710.000	438.448.500	35%	280.607.040	157.841.460
06	Mejoramiento de Sist. de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	123.701.187.004	123.701.187.004	3.819.700.000	3%	3.700.000.000	119.700.000
100	Servicios Personales	1.448.744.801	1.448.744.801	119.700.000	8%	0	119.700.000
130	Asignaciones Complementarias	1.448.744.801	1.448.744.801	119.700.000	8%	0	119.700.000
200	Servicios No Personales	23.097.385.734	23.097.385.734	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	23.097.385.734	23.097.385.734	0	0%	0	0
500	Inversión Física	99.155.056.469	99.155.056.469	3.700.000.000	4%	3.700.000.000	0
510	Adquisición de Inmuebles	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	100%	3.700.000.000	0
520	Construcciones	95.455.056.469	95.455.056.469	0	0%	0	0
07	Construcción Alcantarillado y Ptar para la Cuenca Mariano Roque Alonso	98.202.559.411	98.202.559.411	4.227.710.769	4%	1.235.165.888	2.992.544.881
200	Servicios No Personales	6.015.188.939	6.015.188.939	4.227.710.769	70%	1.235.165.888	2.992.544.881
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.015.188.939	6.015.188.939	4.227.710.769	70%	1.235.165.888	2.992.544.881

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	92.187.370.472	92.187.370.472	0	0%	0	0
520 Construcciones	92.187.370.472	92.187.370.472	0	0%	0	0
08 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	28.469.248.858	28.469.248.858	21.849.401.535	77%	20.997.261.399	852.140.136
100 Servicios Personales	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	3.518.056.515	3.518.056.515	1.045.361.654	30%	301.244.571	744.117.083
230 Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.375.496.515	3.375.496.515	1.045.361.654	31%	301.244.571	744.117.083
500 Inversión Física	24.778.392.343	24.778.392.343	20.804.039.881	84%	20.696.016.828	108.023.053
520 Construcciones	24.778.392.343	24.778.392.343	20.804.039.881	84%	20.696.016.828	108.023.053
09 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	18.376.953.784	18.376.953.784	15.178.530.502	83%	10.004.589.436	5.173.941.066
100 Servicios Personales	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.292.931.866	2.292.931.866	1.345.180.700	59%	290.505.458	1.054.675.242
230 Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.150.371.866	2.150.371.866	1.345.180.700	63%	290.505.458	1.054.675.242
500 Inversión Física	15.911.221.918	15.911.221.918	13.833.349.802	87%	9.714.083.978	4.119.265.824
520 Construcciones	15.911.221.918	15.911.221.918	13.833.349.802	87%	9.714.083.978	4.119.265.824
10 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	18.594.240.769	18.594.240.769	10.737.138.826	58%	7.703.481.129	3.033.657.697
100 Servicios Personales	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.292.661.481	2.292.661.481	1.263.351.048	55%	204.461.369	1.058.889.679
230 Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.150.101.481	2.150.101.481	1.263.351.048	59%	204.461.369	1.058.889.679
500 Inversión Física	16.128.779.288	16.128.779.288	9.473.787.778	59%	7.499.019.760	1.974.768.018
520 Construcciones	16.128.779.288	16.128.779.288	9.473.787.778	59%	7.499.019.760	1.974.768.018
11 Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	17.331.260.298	17.331.260.298	8.314.794.161	48%	6.139.211.123	2.175.583.038
100 Servicios Personales	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	172.800.000	172.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.276.042.112	2.276.042.112	1.233.907.613	54%	204.461.369	1.029.446.244
230 Pasajes y Viáticos	142.560.000	142.560.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.133.482.112	2.133.482.112	1.233.907.613	58%	204.461.369	1.029.446.244
500 Inversión Física	14.882.418.186	14.882.418.186	7.080.886.548	48%	5.934.749.754	1.146.136.794
520 Construcciones	14.882.418.186	14.882.418.186	7.080.886.548	48%	5.934.749.754	1.146.136.794
26 Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo	26.051.413.204	26.051.413.204	16.770.232.425	64%	12.288.526.952	4.481.705.473
500 Inversión Física	26.051.413.204	26.051.413.204	16.770.232.425	64%	12.288.526.952	4.481.705.473
520 Construcciones	26.051.413.204	26.051.413.204	16.770.232.425	64%	12.288.526.952	4.481.705.473
27 Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal	12.167.046.357	12.167.046.357	5.699.188.471	47%	4.448.674.483	1.250.513.988
500 Inversión Física	12.167.046.357	12.167.046.357	5.699.188.471	47%	4.448.674.483	1.250.513.988
520 Construcciones	12.167.046.357	12.167.046.357	5.699.188.471	47%	4.448.674.483	1.250.513.988
SUBTOTAL	4.654.834.313.154	4.654.834.313.154	2.356.594.755.841	51%	1.852.258.996.982	504.335.758.859

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	71.489.770.483	71.489.770.483	30.685.202.678	43%	27.904.248.805	2.780.953.873
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	71.489.770.483	71.489.770.483	30.685.202.678	43%	27.904.248.805	2.780.953.873
800	Transferencias	71.489.770.483	71.489.770.483	30.685.202.678	43%	27.904.248.805	2.780.953.873
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	71.043.270.483	71.043.270.483	30.685.202.678	43%	27.904.248.805	2.780.953.873
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	446.500.000	446.500.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		71.489.770.483	71.489.770.483	30.685.202.678	43%	27.904.248.805	2.780.953.873
TOTAL ENTIDAD		7.196.973.877.746	7.196.973.877.746	3.696.981.602.781	51%	2.728.395.910.122	968.585.692.659

FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/08/2026 *Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

Ley N° 7.609/2025 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

DECRETO N° 5.311/2026 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.609 del 31 de diciembre de 2025, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.

DECRETO N° 5.443/2026 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley N° 7.609/2025.

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py
