



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

INFORME TÉCNICO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO


500 INVERSIÓN FÍSICA - 520 CONSTRUCCIONES

ENERO A JUNIO 2018 – ENERO A JUNIO 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

Enero a Junio
2018

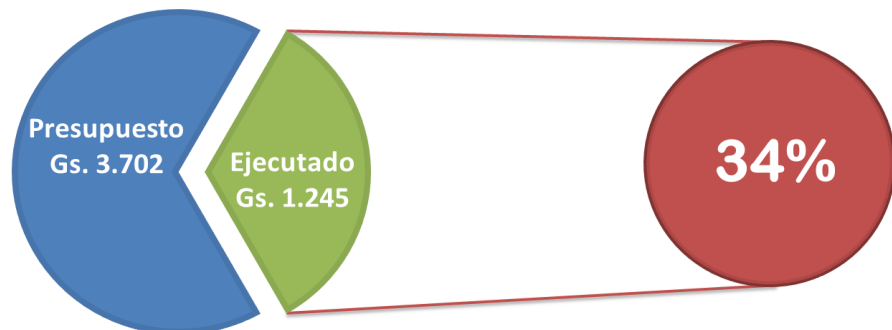


PRESUPUESTO VIGENTE: Gs. 3.702.417.889.383

EJECUTADO: Gs. 1.245.417.832.066

PAGADO: Gs. 910.177.257.184

DEUDA FLOTANTE: Gs. 335.240.574.882

Enero a Junio
2019

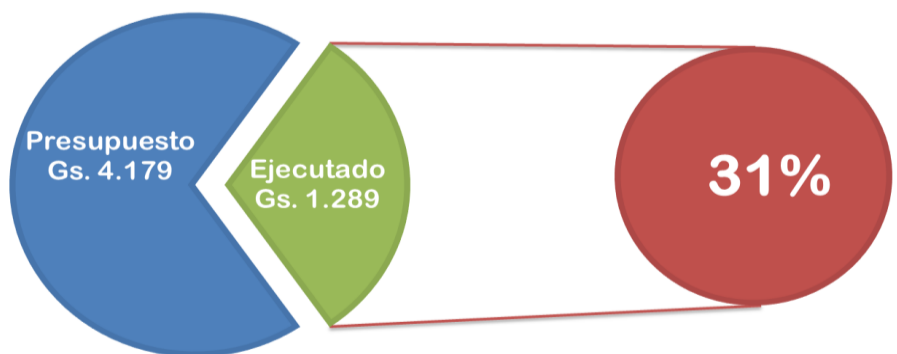

PRESUPUESTO VIGENTE: Gs. 4.179.175.158.399

EJECUTADO: Gs. 1.289.498.002.008

PAGADO: Gs. 971.359.740.076

DEUDA FLOTANTE: Gs. 318.138.261.932

**En Miles de Millones de Guaraníes*

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10 RECURSOS DEL TESORO	225.715.005.541	153.670.103.940	68%	144.294.208.176	9.375.895.764	133.732.926.522	81.060.387.138	61%	72.013.727.431	9.046.659.707
20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	3.196.570.531.677	1.048.083.237.546	33%	726.726.190.399	321.357.047.147	3.765.309.879.712	1.164.773.124.290	31%	860.189.154.036	304.583.970.254
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	280.132.352.165	43.664.490.580	16%	39.156.858.609	4.507.631.971	280.132.352.165	43.664.490.580	16%	39.156.858.609	4.507.631.971
TOTAL	3.702.417.889.383	1.245.417.832.066	34%	910.177.257.184	335.240.574.882	4.179.175.158.399	1.289.498.002.008	31%	971.359.740.076	318.138.261.932

FUENTE: SIAF; 02/07/2019 – GRUPO: INVERSIÓN FÍSICA; SUB GRUPO: CONSTRUCCIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE ACCIÓN	33.809.477.792	29.742.235.060	88%	29.637.257.690	104.977.370	21.000.000.000	14.934.452.837	71%	14.244.009.504	690.443.333
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	1.975.345.500	0	0%	0	0					
SubPrograma Regulación del Transporte Público	1.975.345.500	0	0%	0	0					
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	31.834.132.292	29.742.235.060	93%	29.637.257.690	104.977.370	21.000.000.000	14.934.452.837	71%	14.244.009.504	690.443.333
Preservación de Cursos Hídricos	22.834.132.292	21.408.869.320	94%	21.408.869.320	0	12.000.000.000	11.999.999.999	100%	11.834.999.999	165.000.000
Control de Cursos Hídricos	9.000.000.000	8.333.365.740	93%	8.228.388.370	104.977.370	9.000.000.000	2.934.452.838	33%	2.409.009.505	525.443.333

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN	191.905.527.749	123.927.868.880	65%	114.656.950.486	9.270.918.394	112.732.926.522	66.125.934.301	59%	57.769.717.927	8.356.216.374
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	10.021.326.876	941.667.043	9%	941.667.043	0	13.183.097.295	6.947.921.338	53%	6.947.921.338	0
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	10.021.326.876	941.667.043	9%	941.667.043	0	0	0	0%	0	0
SP Proyecto Acueducto	10.021.326.876	941.667.043	9%	941.667.043	0	13.183.097.295	6.947.921.338	53%	6.947.921.338	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	167.638.323.681	120.984.044.221	72%	111.948.546.008	9.035.498.213	82.391.108.780	51.955.508.617	63%	45.931.697.629	6.023.810.988
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	146.844.549.113	105.588.062.769	72%	100.138.775.490	5.449.287.279	76.578.436.383	47.249.696.122	62%	41.741.498.210	5.508.197.912
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa	9.650.320.938	9.157.490.510	95%	7.456.690.923	1.700.799.587	5.208.161.930	2.309.921.043	44%	500.000.000	1.809.921.043
SP Mej., Travesías Urb. Cdad. Paraguari - Carapegua - Quiindy - Caap.	1.288.431.958	1.195.311.678	93%	368.460.033	826.851.645	0	0	0%	0	0
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	8.143.032.243	8.092.343.020	99%	8.092.343.020	0	2.423.214.305	0	0%	0	0
SP FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	14.129.566.262	7.814.414.554	55%	7.814.414.554	0	4.727.333.224	4.701.141.127	99%	4.701.141.127	0
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	3.715.061.117	3.300.661.023	89%	3.300.661.023	0	3.913.028.847	3.541.468.106	91%	3.541.468.106	0
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial.	7.826.057.694	7.647.563.723	98%	7.641.354.066	6.209.657	4.421.057.694	4.153.030.493	94%	4.099.775.675	53.254.818
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	4.199.255.600	919.275.371	22%	919.275.371	0	6.630.000.000	3.504.835.831	53%	2.532.114.169	972.721.662
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	2.221.953.803	329.810.909	15%	181.396.500	148.414.409	1.000.000.000	955.100.177	96%	955.100.177	0
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	3.066.328.394	1.406.528.691	46%	1.290.173.691	116.355.000	3.400.000.000	1.916.553.517	56%	1.024.160.948	892.392.569
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.381.070.299	919.445.971	39%	742.092.996	177.352.975	1.500.000.000	1.331.565.851	89%	1.331.565.851	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	1.362.642.653	458.018.331	34%	274.128.702	183.889.629	2.117.500.000	1.603.145.532	76%	1.235.366.274	367.779.258
Mejoramiento de la señalización Horizontal y Vertical Este	0	0	0%	0	0	350.528.242	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	1.780.000.000	1.779.991.000	100%	464.279.020	1.315.711.980	2.250.528.242	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	0	0	0%	0	0	396.329.132	0	0%	0	0
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	6.311.715.766	5.640.681.316	89%	5.590.681.316	50.000.000	0	0	0%	0	0
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	6.573.888.463	5.145.785.558	78%	4.222.083.161	923.702.397	6.573.888.463	6.336.203.685	96%	6.336.203.685	0
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	6.754.683.196	6.695.209.889	99%	6.695.209.889	0	6.754.683.196	6.668.063.327	99%	5.636.286.013	1.031.777.314
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	13.471.523.502	5.471.523.502	41%	5.471.523.502	0	3.209.571.333	1.827.889.526	57%	1.447.538.278	380.351.248
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	3.325.581.232	1.449.848.157	44%	1.449.848.157	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	391.761.327	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	44.815.461	44.815.461	100%	44.815.461	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	69.128.022	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pasos a Desnivel- Central	394.885.806	389.078.850	99%	389.078.850	0	600.000.000	557.232.000	93%	557.232.000	0
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	298.057.577	298.057.577	100%	298.057.577	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	2.989.891.242	2.989.891.242	100%	2.989.891.242	0	2.989.891.242	2.954.317.006	99%	2.954.317.006	0
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	1.600.000.000	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	1.671.316.537	1.671.316.537	100%	1.671.316.537	0	1.231.316.537	0	0%	0	0
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	0
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	3.831.403.996	3.831.403.996	100%	3.831.403.996	0	3.831.403.996	3.389.228.901	88%	3.389.228.901	0
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	0	0	0%	0	0	50.000.000	0	0%	0	0
Construcción de Pavimentacion S/Empedrados en Región Centro	26.352.176.025	25.939.595.903	98%	25.939.595.903	0	0	0	0%	0	0
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	10.000.000.000	0	0%	0	0	10.000.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	16.789.868.814	13.049.510.687	78%	9.527.794.396	3.521.716.291	2.905.200.000	2.263.409.774	78%	1.991.409.774	272.000.000
SP Const. Avda Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	0	0	0%	0	0	105.200.000	0	0%	0	0
SP Construcción Avda Costanera Norte 2da Etapa	0	0	0%	0	0	2.000.000.000	1.871.409.774	94%	1.871.409.774	0
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	10.000.000.000	6.262.425.733	63%	2.740.709.442	3.521.716.291	0	0	0%	0	0
SP Const. Terminal Port.Mult. En Pilar - Fonplata	0	0	0%	0	0	800.000.000	392.000.000	49%	120.000.000	272.000.000
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	6.789.868.814	6.787.084.954	100%	6.787.084.954	0	0	0	0%	0	0
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	4.003.905.754	2.346.470.765	59%	2.281.976.122	64.494.643	2.907.472.397	2.442.402.721	84%	2.198.789.645	243.613.076
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	2.085.050.532	1.800.111.405	86%	1.735.616.762	64.494.643	2.521.472.397	2.198.789.645	87%	2.198.789.645	0
Conservación Caminos Vecinales por Administración	1.918.855.222	546.359.360	28%	546.359.360	0	0	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	0	0	0%	0	0	386.000.000	243.613.076	63%	0	243.613.076

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	14.245.877.192	2.002.157.616	14%	1.766.737.435	235.420.181	17.158.720.447	7.222.504.346	42%	4.890.098.960	2.332.405.386
Infraestructura del Patrimonio Cultural	14.245.877.192	2.002.157.616	14%	1.766.737.435	235.420.181	17.158.720.447	7.222.504.346	42%	4.890.098.960	2.332.405.386
Restauración de edificios Patrimoniales	14.245.877.192	2.002.157.616	14%	1.766.737.435	235.420.181	17.158.720.447	7.222.504.346	42%	4.890.098.960	2.332.405.386
TOTAL DE ENTIDAD	225.715.005.541	153.670.103.940	68%	144.294.208.176	9.375.895.764	133.732.926.522	81.060.387.138	61%	72.013.727.431	9.046.659.707

Fuente MH-SIAF, Fecha: 02/07/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario N° 1.145/19

Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE ACCIÓN	58.907.012.681	21.947.619.303	37%	11.769.720.106	10.177.899.197	135.429.092.938	68.175.790.763	50%	51.836.393.069	16.339.397.694
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	58.907.012.681	21.947.619.303	37%	11.769.720.106	10.177.899.197	135.429.092.938	68.175.790.763	50%	51.836.393.069	16.339.397.694
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	44.416.300.518	14.020.843.125	32%	4.547.895.790	9.472.947.335	98.574.690.152	68.175.790.763	69%	51.836.393.069	16.339.397.694
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	14.490.712.163	7.926.776.178	55%	7.221.824.316	704.951.862	36.854.402.786	0	0%	0	0

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN	3.137.663.518.996	1.026.135.618.243	33%	714.956.470.293	311.179.147.950	3.629.880.786.774	1.096.597.333.527	30%	808.352.760.967	288.244.572.560
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	178.873.662.482	19.904.116.629	11%	10.774.259.912	9.129.856.717	227.746.814.202	64.485.519.661	28%	58.338.061.332	6.147.458.329
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	178.873.662.482	19.904.116.629	11%	10.774.259.912	9.129.856.717	227.746.814.202	64.485.519.661	28%	58.338.061.332	6.147.458.329

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
SP Proyecto Acueducto	28.781.833.519	0	0%	0	0	33.962.246.935	0	0%	0	0
SP Modern. Del Sector Agua Y de Saneamiento-BIRF 7710-PA						0	0	0%	0	0
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. Re.	70.651.443.034	12.487.514.978	18%	7.051.920.256	5.435.594.722	50.373.224.482	24.277.388.275	48%	24.035.632.642	241.755.633
Mejoramiento del Serv. de Alcant. De la Bah. Asunción	46.847.534.706	794.023.373	2%	338.478.791	455.544.582	93.057.109.427	31.142.306.812	33%	26.924.098.340	4.218.208.472
Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	32.592.851.223	6.622.578.278	20%	3.383.860.865	3.238.717.413	50.354.233.358	9.065.824.574	18%	7.378.330.350	1.687.494.224
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	2.956.289.856.514	1.006.231.501.614	34%	704.182.210.381	302.049.291.233	3.291.576.928.113	1.032.111.813.866	31%	750.014.699.635	282.097.114.231
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	2.002.234.824.078	710.856.066.686	36%	511.980.863.929	198.875.202.757	2.289.075.550.817	714.717.010.025	31%	516.451.294.696	198.265.715.329
Mej. Gestion y Mant. De la Red Vial del PY(BIRF 7406PA)	11.619.062.889	0	0%	0	0	3.680.479.755	0	0%	0	0
Mejoramiento de 151 KM Capitan Bado-Santa Rosa	9.368.311.539	613.274.996	7%	613.274.996	0	50.152.733.106	19.397.639.392	39%	11.594.958.060	7.802.681.332
SP Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caap	7.606.000.965	2.197.829.182	29%	428.461.896	1.769.367.286	9.500.000.000	0	0%	0	0
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	26.564.881.788	11.699.481.081	44%	4.342.762.388	7.356.718.693	10.012.786.611	6.484.887.997	65%	5.967.938.808	516.949.189
SP FOCEM - Rehab. Y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	35.836.032.404	14.469.450.301	40%	7.511.923.156	6.957.527.145	29.991.468.429	29.135.688.374	97%	21.499.325.415	7.636.362.959

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
SP Pav. Corred. De Integ. Rehab. Y Mant. Red. Vial (BID 1822/OC-PR)	5.625.000.000	0	0%	0	0	5.600.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	173.393.000.000	95.580.465.099	55%	56.442.546.993	39.137.918.106	161.990.952.063	18.643.221.547	12%	15.557.019.593	3.086.201.954
SP Pav. Asf. Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque	5.441.608.614	1.991.480.311	37%	1.903.701.533	87.778.778	8.826.927.593	213.774.952	2%	213.774.952	0
Mejoramiento Corredores de Integración y Reconst.	282.828.390.939	131.706.885.651	47%	99.237.634.373	32.469.251.278	185.600.228.014	109.966.568.412	59%	68.404.887.010	41.561.681.402
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	174.848.336.295	100.785.062.483	58%	92.825.405.671	7.959.656.812	220.202.974.028	96.149.832.057	44%	77.706.769.516	18.443.062.541
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Rita VI	64.820.000.000	24.275.429.998	37%	10.781.696.052	13.493.733.946	98.644.300.000	39.941.575.481	40%	33.525.682.998	6.415.892.483
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	227.514.713.972	40.053.734.763	18%	33.231.943.218	6.821.791.545	188.740.446.136	46.971.927.134	25%	40.521.648.084	6.450.279.050
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	16.829.332.953	0	0%	0	0	3.093.912.181	0	0%	0	0
Habilitación de la Defensa Costanera en Fuerte Olimpo	151.176.423	0	0%	0	0	151.176.423	151.176.423	100%	0	151.176.423
Construcción y Mejoramiento de Rutas II PG P13						21.822.987.709	21.510.835.948	99%	0	21.510.835.948
Habilitación de la Red Vial Pav. En COR, PAR, CAG, GUA, CAZ.	32.399.866.474	0	0%	0	0	146.119.516.707	10.174.628.446	7%	9.193.149.614	981.478.832

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dpto. de San Pedro	4.005.879.200	0	0%	0	0	122.378.902.671	0	0%	0	0
Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	16.882.958.400	0	0%	0	0	116.960.393.207	6.135.747.227	5%	5.513.810.960	621.936.267
Habilitación de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapúa	18.500.000.000	0	0%	0	0	68.850.000.000	0	0%	0	0
Habilitación de la Red Pav. Dptos S. Pedro, Caag. Y Canind.						84.900.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	3.006.227.173	837.766.800	28%	0	837.766.800					0
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	446.966.141	0	0%	0	0	2.557.750.000	779.170.194	30%	589.069.724	190.100.470
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	1.420.000.000	287.918.182	20%	0	287.918.182	1.221.000.000	583.323.172	48%	403.891.832	179.431.340
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	2.110.000.000	0	0%	0	0	538.974.332	487.404.762	90%	324.936.508	162.468.254
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este						1.000.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	3.400.000.000	0	0%	0	0	3.078.881.075	1.065.370.049	35%	1.065.370.049	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur						1.000.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	20.690.715.261	15.498.878.736	75%	7.017.469.093	8.481.409.643					0
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	23.894.191.080	7.888.439.645	33%	3.633.103.272	4.255.336.373	9.313.689.230	4.158.811.305	45%	3.051.056.204	1.107.755.101
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	21.000.000.000	12.058.000.255	57%	8.617.195.734	3.440.804.521	8.431.069.535	2.814.615.069	33%	234.615.069	2.580.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	33.781.256.810	5.894.085.057	17%	1.881.805.800	4.012.279.257	9.200.000.000	2.822.809.090	31%	2.822.809.090	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	8.500.000.000	1.028.480.200	12%	0	1.028.480.200	500.000.000	149.538.508	30%	88.411.644	61.126.864
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	5.135.897.322	135.897.322	3%	0	135.897.322	1.000.000.000	0	0%	0	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	29.489.681.724	11.948.002.636	41%	9.386.667.217	2.561.335.419	9.500.000.000	4.143.187.459	44%	1.864.448.812	2.278.738.647
Construcción Pav. Tipo Emp. Y Puentes - Región Sur	25.362.338.238	10.999.640.308	43%	6.206.548.012	4.793.092.296	11.000.000.000	4.111.922.437	37%	3.440.109.265	671.813.172
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	22.904.959.003	9.757.836.017	43%	9.757.836.017	0	11.000.000.000	2.842.813.649	26%	1.877.335.567	965.478.082
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	20.500.000.000	7.526.099.614	37%	5.805.765.669	1.720.333.945	2.000.000.000	1.899.942.779	95%	274.632.323	1.625.310.456
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco						380.390.359	0	0%	0	0
Construcción Pav. Tipo Adoquin - Region Sur	0	0	0%	0	0	500.000.000	0	0%	0	0
Construcción Paso a Desnivel- Central	750.000.000	0	0%	0	0	4.300.000.000	630.493.410	15%	235.714.950	394.778.460
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	82.934.824	0	0%	0	0	600.000.000	0	0%	0	0
Construcción Pav. S/ Empedrados en Región Centro Este	0	0	0%	0	0	1.897.694.431	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	48.270.878.180	3.933.081.626	8%	1.864.065.343	2.069.016.283	48.641.236.727	16.326.243.750	34%	14.563.818.882	1.762.424.868
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	8.257.438.680	2.454.859.990	30%	2.454.859.990	0	19.500.000.000	5.605.206.914	29%	2.339.756.416	3.265.450.498
Construcción Asfalto s/ Empedrado Región Sur	6.098.799.084	0	0%	0	0	22.042.907.792	1.012.367.502	5%	1.012.367.502	0
Construccion de Pav. s/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct)	0	0	0%	0	0	500.000.000	0	0%	0	0
Construccion y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Region Noreste	58.670.777.020	28.989.383.395	49%	28.989.383.395	0	71.854.294.528	48.495.114.112	67%	31.458.100.660	17.037.013.452
Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	25.179.969.849	1.667.513.339	7%	0	1.667.513.339	40.259.532.506	37.039.843.279	92%	25.006.376.069	12.033.467.210
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	41.854.574.031	13.021.489.288	31%	8.818.327.730	4.203.161.558	84.649.148.738	49.798.370.332	59%	34.447.384.418	15.350.985.914
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	185.247.913.524	42.706.519.759	23%	30.382.002.536	12.324.517.223	138.582.700.004	99.529.101.418	72%	79.944.391.034	19.584.710.384
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Chaco	0	0	0%	0	0	600.000.000	0	0%	0	0
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 Y 7						0	0	0%	0	0
Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta						0	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción de Pavimentacion S/Empedrados en Región Centro	261.593.991.598	98.993.383.586	38%	75.379.340.779	23.614.042.807	42.806.096.847	25.543.857.445	60%	21.707.733.668	3.836.123.777
Mej. Y Conserv. Tramo Caaguazu- Yhu- Empalme Ruta 10						5.900.000.000	0	0%	0	0
Mej. Y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 6						6.000.000.000	0	0%	0	0
Habilitación y Mant. De Vías de Acc. Al Area Metrop. De As.						8.076.092.640	0	0%	0	0
Habilitación y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB						29.960.851.760	0	0%	0	0
Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción						41.963.055.680	0	0%	0	0
Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nac. Nº 9 y Accesos						110.000.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco						1.500.000.000	0	0%	0	0
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	308.550.301.996	94.022.226.397	30%	66.983.208.621	27.039.017.776	358.228.928.901	102.702.932.847	29%	76.523.264.860	26.179.667.987
SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	25.273.105.746	5.283.745.962	21%	3.742.529.434	1.541.216.528	19.852.379.106	12.311.075.538	62%	9.292.844.424	3.018.231.114
Construcción Av. Costanera Norte, 2º Etapa	32.666.475.924	27.235.805.096	83%	22.233.243.991	5.002.561.105	3.567.008.381	2.384.645.014	67%	2.139.335.711	245.309.303
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	213.451.827.482	54.620.430.146	26%	41.007.435.196	13.612.994.950	303.374.097.534	83.305.085.853	27%	62.134.175.301	21.170.910.552
SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar - FONPLATA-PAR	12.129.243.975	686.245.193	6%	0	686.245.193					0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	10.659.648.869	0	0%	0	0	6.651.443.880	1.745.217.018	26%	0	1.745.217.018
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río PY	14.370.000.000	6.196.000.000	43%	0	6.196.000.000	24.784.000.000	2.956.909.424	12%	2.956.909.424	0
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	645.504.730.440	201.353.208.531	31%	125.218.137.831	76.135.070.700	644.272.448.395	214.691.870.994	33%	157.040.140.079	57.651.730.915
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	139.658.158.876	41.032.567.854	29%	24.806.242.250	16.226.325.604	70.685.190.371	21.959.440.558	31%	16.196.834.297	5.762.606.261
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	97.452.952.730	32.748.343.064	34%	17.757.306.870	14.991.036.194	85.013.296.305	33.659.126.132	40%	25.900.900.312	7.758.225.820
Mejoramiento de Caminos Vecinales en La Región Oriental	133.406.806.125	44.790.106.826	34%	24.442.327.760	20.347.779.066	162.094.454.635	69.459.838.786	43%	54.364.720.548	15.095.118.238
Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental						53.404.568.493	0	0%	0	0
Conservación Caminos Rurales no Pavimentados R. Occidental	15.616.463.150	0	0%	0	0	62.400.000.000	4.252.279.354	7%	3.675.427.954	576.851.400
Construcción Caminis Rurales No Pavimentados R. Oriental	98.801.147.174	19.851.975.160	20%	11.937.486.049	7.914.489.111	90.545.109.191	76.079.256.739	84%	49.197.132.543	26.882.124.196
Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	51.065.000.000	18.378.987.695	36%	12.521.485.416	5.857.502.279	24.500.000.000	8.648.329.425	35%	7.071.524.425	1.576.805.000
Construcción de Puentes y Alcantarillas en la R. Occidental	2.565.000.000	0	0%	0	0	2.500.000.000	633.600.000	25%	633.600.000	0
Mant. De Caminos Rurales No Pavimentados en la R. Oriental	106.939.202.385	44.551.227.932	42%	33.753.289.486	10.797.938.446	42.661.400.000	0	0%	0	0
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Ro.						50.468.429.400	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	2.500.000.000	0	0%	0	0					
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	2.500.000.000	0	0%	0	0					
Diagnostico y Protocolo de Intervención en Edif. Historicos	2.500.000.000	0	0%							
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD						110.557.044.459	0	0%	0	0
Construcción de Penitenciarías						110.557.044.459	0	0%	0	0
Construcción de Penitenciaría						40.557.044.459	0	0%	0	0
Construcción del Ciris de Emboscada						60.000.000.000	0	0%	0	0
Const. De Correc. Mujeres de Itagua						10.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL DE ENTIDAD	3.196.570.531.677	1.048.083.237.546	33%	726.726.190.399	321.357.047.147	3.765.309.879.712	1.164.773.124.290	31%	860.189.154.036	304.583.970.254

Fuente MH-SIAF, Fecha: 02/07/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario Nº 1.145/19

Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

30 RECURSOS INSTITUCIONALES – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	18.000.000.000	7.357.158.897	41%	7.357.158.897	0	12.836.411.280	3.270.704.601	25%	3.270.704.601	0
ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.000.000.000	7.357.158.897	41%	7.357.158.897	0	12.836.411.280	3.270.704.601	25%	3.270.704.601	0

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE ACCIÓN	910.731.646	0	0%	0	0	1.017.608.006	0	0%	0	0
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	168.000.000	0	0%	0	0	295.220.276	0	0%	0	0
SubPrograma Regulación del Transporte Público	168.000.000	0	0%	0	0	295.220.276	0	0%	0	0
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	742.731.646	0	0%	0	0	722.387.730	0	0%	0	0
Sub Programa Gestión de los Recursos Naturales	742.731.646	0	0%	0	0	722.387.730	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

30 RECURSOS INSTITUCIONALES – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL PROGRAMA DE INVERSION	258.920.475.747	77.689.798.622	30%	61.591.770.769	16.098.027.853	266.278.332.879	40.393.785.979	15%	35.886.154.008	4.507.631.971
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	102.334.977.219	26.684.310.691	26%	22.465.887.514	4.218.423.177	114.404.642.905	21.598.661.588	19%	19.552.186.775	2.046.474.813
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	102.334.977.219	26.684.310.691	26%	22.465.887.514	4.218.423.177	114.404.642.905	21.598.661.588	0%	19.552.186.775	2.046.474.813
SP Proyecto Prog.Saneam. Y agua Pot. P/Chaco y Ciud. Intern Re	102.334.977.219	26.684.310.691	26%	22.465.887.514	4.218.423.177	114.404.642.905	21.598.661.588	19%	19.552.186.775	2.046.474.813
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	156.585.498.528	51.005.487.931	33%	39.125.883.255	11.879.604.676	151.873.689.974	18.795.124.391	12%	16.333.967.233	2.461.157.158
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	38.175.641.405	9.063.590.508	24%	5.866.404.146	3.197.186.362	58.512.148.610	5.176.116.945	9%	4.634.202.371	541.914.574
SP FOCEM -Rehab. Y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	22.433.256.716	6.742.890.244	30%	5.866.404.146	876.486.098	16.199.888.855	105.182.196	1%	105.182.196	0
SP Proyecto Construcción -Pavimentación Naranjal -San Cristóbal Ruta 6	4.742.384.689	528.196.813	11%	0	528.196.813	4.182.164.675	1.892.751.899	45%	1.350.837.325	541.914.574
SP Proyecto Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	11.000.000.000	1.792.503.451	16%	0	1.792.503.451	27.538.536.697	3.178.182.850	12%	3.178.182.850	0
SP Proyecto Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata- Carmelo Peralta	0	0	0%	0	0	10.591.558.383	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

DESCRIPCIÓN	ENERO A JUNIO 2018					ENERO A JUNIO 2019				
	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	118.409.857.123	41.941.897.423	35%	33.259.479.109	8.682.418.314	93.361.541.364	13.619.007.446	15%	11.699.764.862	1.919.242.584
SP Proyecto Construcción Avda Costanera Norte	118.409.857.123	41.941.897.423	35%	33.259.479.109	8.682.418.314	93.361.541.364	13.619.007.446	15%	11.699.764.862	1.919.242.584
TOTAL DE ENTIDAD	277.831.207.393	85.046.957.519	31%	68.948.929.666	16.098.027.853	280.132.352.165	43.664.490.580	16%	39.156.858.609	4.507.631.971

Fuente MH-SIAF, Fecha: 02/07/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario N° 1.145/19

Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925

