


SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT – SENAVITAT

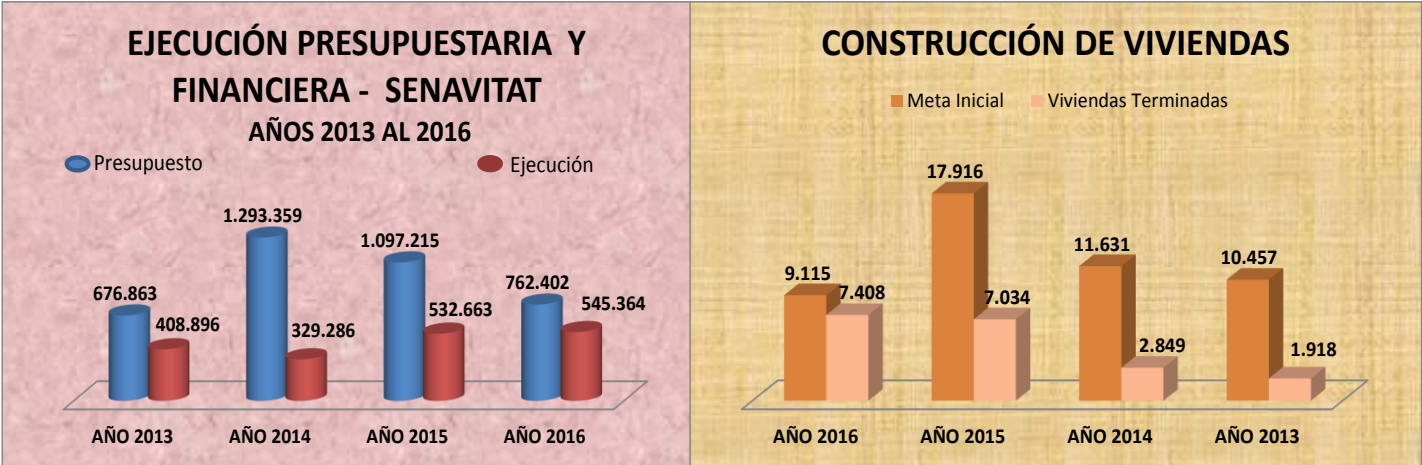

1 – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA, FINANCIERA Y COSTO PROMEDIO POR UNIDAD AÑOS 2013 AL 2016

| Viviendas Departamentos, Créditos y Subsidios | Ejecución Productiva |                      |            |                      | Ejecución Financiera |           |            |                      | Costo Por Unidad |                      | % de Incremento del Costo de la Viviendas |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                               | Meta Inicial         | Viviendas Terminadas | % de Ejec. | Saldo Presupuestario | Presupuesto          | Ejecución | % de Ejec. | Saldo Presupuestario | Meta Inicial     | Viviendas Terminadas |                                           |
| Total Viviendas                               | 49.119               | 19.209               | 39%        | 29.910               | 3.829.839            | 1.816.209 | 47%        | 2.013.630            | 78               | 95                   | 52%                                       |
| Año 2013                                      | 9.115                | 1.918                | 21%        | 7.197                | 676.863              | 408.896   | 60%        | 267.967              | 74               | 213                  | 188%                                      |
| Año 2014                                      | 17.916               | 2.849                | 16%        | 15.067               | 1.293.359            | 329.286   | 25%        | 964.073              | 72               | 116                  | 60%                                       |
| Año 2015                                      | 11.631               | 7.034                | 60%        | 4.597                | 1.097.215            | 532.663   | 49%        | 564.552              | 94               | 76                   | -20%                                      |
| Año 2016                                      | 10.457               | 7.408                | 71%        | 3.049                | 762.402              | 545.364   | 72%        | 217.038              | 73               | 74                   | 28%                                       |

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

2 – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA - AÑOS 2013 AL 2016

| Ejecución Productiva                               | Año 2013     |                      |            |                      | Año 2014     |                      |            |                      | Año 2015     |                      |            |                      | Año 2016     |                      |            |                      |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                    | Meta Inicial | Viviendas Terminadas | % de Ejec. | Saldo Presupuestario | Meta Inicial | Viviendas Terminadas | % de Ejec. | Saldo Presupuestario | Meta Inicial | Viviendas Terminadas | % de Ejec. | Saldo Presupuestario | Meta Inicial | Viviendas Terminadas | % de Ejec. | Saldo Presupuestario |
| Total de Viviendas                                 | 9.115        | 1.918                | 21%        | 7.197                | 17.916       | 2.849                | 16%        | 15.067               | 11.631       | 7.034                | 60%        | 4.597                | 10.457       | 7.408                | 71%        | 3.049                |
| Construcción de Viviendas                          | 3.238        | 906                  | 28%        | 2.332                | 13.008       | 421                  | 3%         | 12.587               | 9.153        | 2.151                | 24%        | 7.002                | 5.528        | 3.170                | 57%        | 2.358                |
| Construcción de Departamentos                      | 16           | 0                    | 0%         | 16                   | 245          | 0                    | 0%         | 245                  | 278          | 0                    | 0%         | 278                  |              |                      |            |                      |
| Préstamos para Viviendas                           | 4.766        | 403                  | 8%         | 4.363                | 288          | 43                   | 15%        | 245                  | 296          | 153                  | 52%        | 143                  |              |                      |            |                      |
| Regularización de tierras - Ex Tekoha              | 750          | 93                   | 12%        | 657                  | 696          | 0                    | 0%         | 696                  |              |                      |            |                      |              |                      |            |                      |
| Subsidio Habitacional para mejoramiento de barrios |              |                      |            |                      | 100          | 0                    | 0%         | 100                  |              |                      |            |                      |              |                      |            |                      |
| Subsidio Habitacional para compras de viviendas    | 4.645        | 516                  | 11%        | 4.129                | 3.579        | 2.385                | 67%        | 1.194                | 1.904        | 4.730                | 248%       | 2.826                | 4.929        | 4.238                | 86%        | 691                  |
| Mejoramiento y Ampliación de viviendas del AMA     |              |                      |            |                      |              |                      |            |                      |              |                      |            |                      | 0            | 0                    | 0%         | 0                    |

Fuente: SIAF  
\* Año 2015 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRAS DE VIVIENDAS (Ejercicios Anteriores 2011,2012,2013,y 2014)

3 – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA - AÑOS 2013 AL 2016

| EJECUCIÓN FINANCIERA        | AÑO 2013 |         |    |     | AÑO 2014 |           |    |     | AÑO 2015 |           |    |     | AÑO 2016 |         |    |     |
|-----------------------------|----------|---------|----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|---------|----|-----|
| Presupuesto de la Senavitat | G.       | 676.863 | \$ | 153 | G.       | 1.293.359 | \$ | 279 | G.       | 1.097.215 | \$ | 192 | G.       | 762.402 | \$ | 133 |
| Ejecución                   | G.       | 408.896 | \$ | 92  | G.       | 329.286   | \$ | 71  | G.       | 532.663   | \$ | 93  | G.       | 545.364 | \$ | 95  |
| Saldo Presupuestario        | G.       | 267.967 | \$ | 61  | G.       | 964.073   | \$ | 208 | G.       | 564.552   | \$ | 99  | G.       | 217.038 | \$ | 38  |

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, en millones de dólares

T.C.G. 4.429T.C.G. 4.629T.C.G. 5.700T.C.G. 5.730

4 – PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVO - AÑO 2013 AL AÑO 2016

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN   | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| % de Ejecución Financiera | 60%      | 25%      | 49%      | 72%      |
| % de Ejecución Productiva | 21%      | 16%      | 60%      | 71%      |
