



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

**SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA
Y EL HABITAT - SENAVITAT**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD
DESDE EL AÑO 2013 AL 30/11/2017**



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública


SENAVITAT

Evaluación de las Construcciones de Viviendas

Del Año 2013 al 30/11/2017



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera

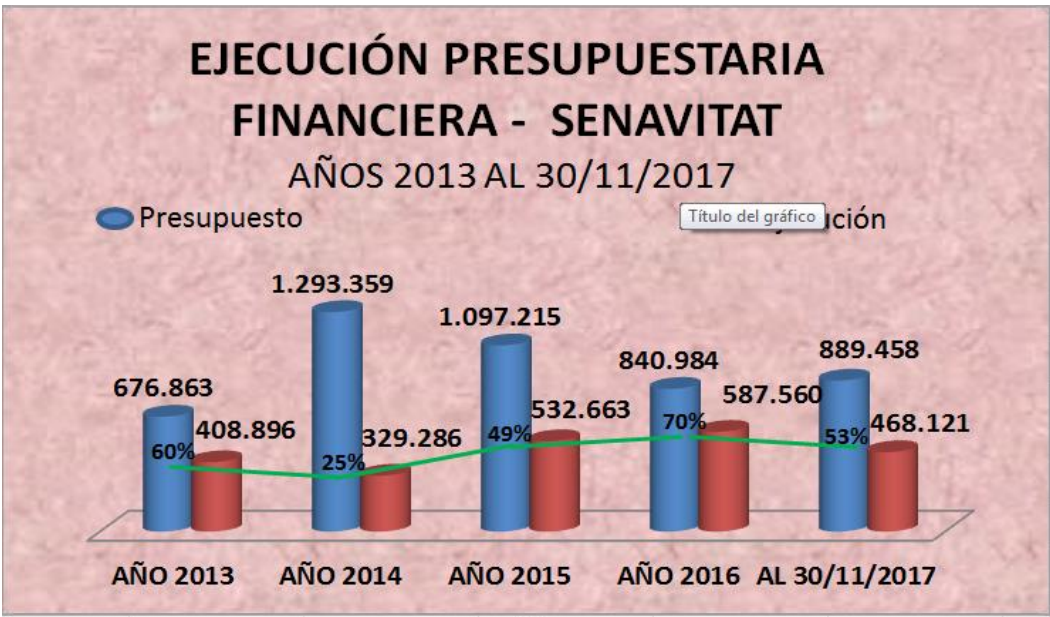

EJECUCIÓN FINANCIERA	AÑO 2013				AÑO 2014				AÑO 2015				AÑO 2016				AL 30/11/2017			
Presupuesto de la Senavitat	G.	676.863	\$	153	G.	1.293.359	\$	279	G.	1.097.215	\$	192	G.	762.402	\$	133	G.	889.459	\$	158
Ejecución	G.	408.896	\$	92	G.	329.286	\$	71	G.	532.663	\$	93	G.	545.364	\$	95	G.	468.122	\$	83
Saldo Presupuestario	G.	267.967	\$	61	G.	964.073	\$	208	G.	564.552	\$	99	G.	217.038	\$	38	G.	421.337	\$	75
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, en millones de dólares				T.C.G. 4.429	T.C.G. 4.629				T.C.G. 5.700				T.C.G. 5.730				T.C.G. 5.600			

La Ejecución Presupuestaria de la Construcción de Viviendas muestra que en estos 5 años se han construido 20.854 Viviendas el porcentaje de la Ejecución de Viviendas en el año 2014 y 2017 es de tan solo 16% con un costo unitario promedio de USD 50.455 en el año 2017, al comparar con los años anteriores se ha incrementado en más del 300%.


¿Será que en el último mes del año se construirá 8.394 viviendas?



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA AL 30/11/2017

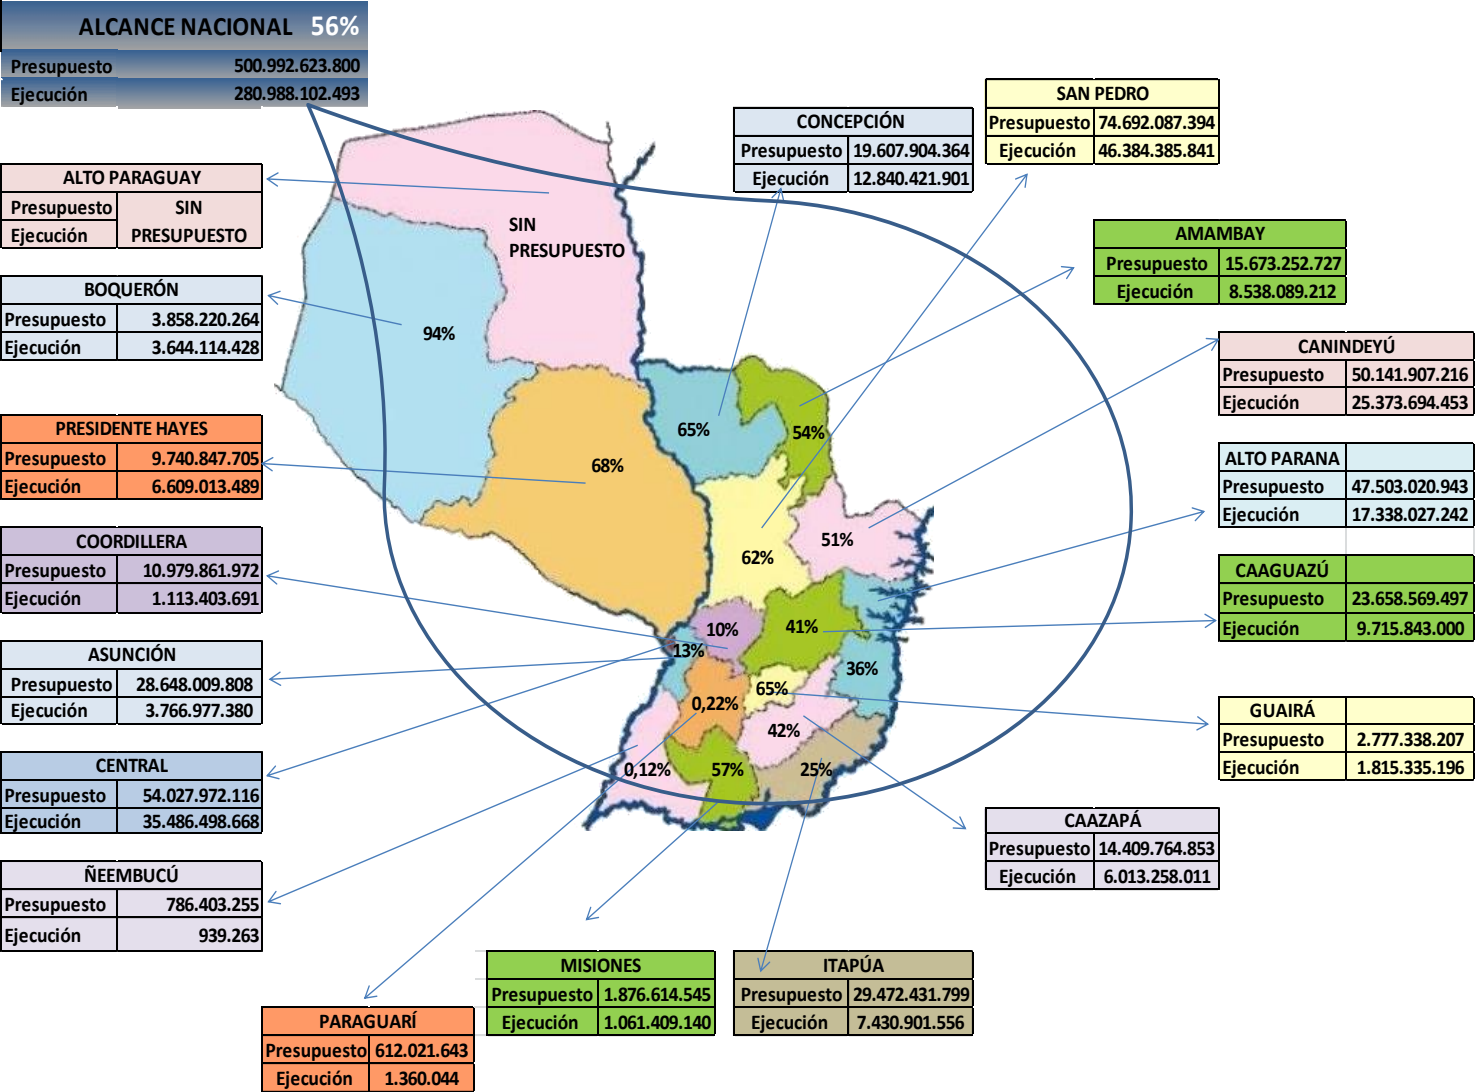

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR ÁREA GEOGRÁFICA AL 30/11/2017					
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% de Ejec.	% DE PARTICIPACION	
				PRES.	EJEC
ASUNCION	28.648.009.808	3.766.977.380	13%	3%	0,80%
CONCEPCION	19.607.904.364	12.840.421.901	65%	2%	3%
SAN PEDRO	74.692.087.394	46.384.385.841	62%	8%	10%
CORDILLERA	10.979.861.972	1.113.403.691	10%	1,23%	0,24%
GUAIRA	2.777.338.207	1.815.335.196	65%	0,31%	0%
CAAGUAZU	23.658.569.497	9.715.843.000	41%	3%	2%
CAAZAPA	14.409.764.853	6.013.258.011	42%	2%	1%
ITAPUA	29.472.431.799	7.430.901.556	25%	3,31%	1,59%
MISIONES	1.876.614.545	1.061.409.140	57%	0,21%	0,23%
PARAGUARI	612.021.643	1.360.044	0,22%	0,07%	0%
ALTO PARANA	47.503.020.943	17.338.027.242	36%	5%	4%
CENTRAL	54.027.972.116	35.486.498.668	66%	6%	8%
ÑEEMBUCU	786.403.255	939.263	0,12%	0,09%	0,00%
AMAMBAY	15.673.252.727	8.538.089.212	54%	2%	2%
CANINDEYU	50.141.907.216	25.373.694.453	51%	6%	5%
PRESIDENTE HAYES	9.740.847.705	6.609.013.489	68%	1%	1%
BOQUERON	3.858.220.264	3.644.114.428	94%	0,434%	0,78%
ALTO PARAGUAY	0	0	0%	0	0
ALCANCE NACIONAL	500.992.623.800	280.988.102.493	56%	56%	60%
TOTAL	889.458.852.108	468.121.775.008	53%		
TOTAL EN US\$	158.831.938	83.593.174	53%		

Fuente: SIAF de fecha 10/03/2017 Tipo de cambio G. 5.600

S.M.R.C



Dirección General de Control de la Gestión Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA, FINANCIERA Y COSTO PROMEDIO POR UNIDAD
 AÑOS 2013 AL 30/11/2017

Viviendas Departamentos, Créditos y Subsidios	Ejecución Productiva				Ejecución Financiera				Costo Por Unidad	
	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presupuestario	Presupuesto	Ejecución	% de Ejec.	Saldo Presupuestario	Meta Inicial	Viviendas Terminadas
Total Viviendas	59.158	20.854	35%	38.304	4.797.879	2.326.526	48%	2.471.353	410	768
Año 2013	9.115	1.918	21%	7.197	676.863	408.896	60%	267.967	74	213
Año 2014	17.916	2.849	16%	15.067	1.293.359	329.286	25%	964.073	72	116
Año 2015	11.631	7.034	60%	4.597	1.097.215	532.663	49%	564.552	94	76
Año 2016	10.457	7.408	71%	3.049	840.984	587.560	70%	253.424	80	79
Al 30/11/2017	10.039	1.645	16%	8.394	889.458	468.121	53%	421.337	89	285
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes										SMRC

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA POR PROYECTOS - AÑOS 2013 AL 30/11/2017

Ejecución Productiva	Año 2013				Año 2014				Año 2015				Año 2016				AL 30/11/2017			
	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.
Total de Viviendas	9.115	1.918	21%	7.197	17.916	2.849	16%	15.067	11.631	7.034	60%	4.597	10.457	7.408	71%	3.049	10.039	1.645	16%	8.394
Construcción de Viviendas	3.238	906	28%	2.332	13.008	421	3%	12.587	9.153	2.151	24%	7.002	5.528	3.170	57%	2.358	2.921	880	30%	2.041
Construcción de Departamentos	16	0	0%	16	245	0	0%	245	278	0	0%	278								
Préstamos para Viviendas	4.766	403	8%	4.363	288	43	15%	245	296	153	52%	143					75	0		
Regularización de tierras - Ex Tekoha	750	93	12%	657	696	0	0%	696												
Subsidio Habitacional para mejoramiento de barrios					100	0	0%	100												
Subsidio Habitacional para compras de viviendas	4.645	516	11%	4.129	3.579	2.385	67%	1.194	1.904	4.730	248%	2.826	4.929	4.238	86%	691	6.708	765	11%	5.943
Mejoramiento y Ampliación de viviendas del AMA																	335	SIN PRODUCCIÓN		
Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta - M2																	500			
Fuente: SIAF																				
* Año 2015 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRAS DE VIVIENDAS (Ejercicios Anteriores 2011,2012,2013,y 2014)																				
S.M.R.C																				

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA - AÑOS 2013 AL 30/09/2017

EJECUCIÓN FINANCIERA	AÑO 2013				AÑO 2014				AÑO 2015				AÑO 2016				AL 30/11/2017						
Presupuesto de la Senavitat	G.	676.863	\$	153	G.	1.293.359	\$	279	G.	1.097.215	\$	192	G.	762.402	\$	133	G.	889.459	\$	158			
Ejecución	G.	408.896	\$	92	G.	329.286	\$	71	G.	532.663	\$	93	G.	545.364	\$	95	G.	468.122	\$	83			
Saldo Presupuestario	G.	267.967	\$	61	G.	964.073	\$	208	G.	564.552	\$	99	G.	217.038	\$	38	G.	421.337	\$	75			
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, en millones de dólares				T.C.G. 4.429				T.C.G. 4.629				T.C.G. 5.700				T.C.G. 5.730				T.C.G. 5.600			



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel: (021) 414-5880 – (021) 414-45925

SM.RC

EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS AI 30/11/2017

SENAVITAT

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	META INICIAL	AVANCE	%	SALDO
TOTAL	832.280.171.437	832.280.171.437	432.513.797.658	52	10.039	1.645	16	8.394
Soluciones Habitacionales	58.680.034.076	58.680.034.076	10.099.783.154	17	207	0	0	207
Fonavis	410.330.180.335	410.330.180.335	233.720.636.147	57	6708	765	11	5.943
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	30.103.757.251	30.103.757.251	11.163.697.299	37	280	90	32	190
SP Mercosur Roga	10.851.227.980	10.851.227.980	1.643.207.691	15	185	0	0	185
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	75.498.715.632	75.498.715.632	61.348.473.260	81	985	355	36	630
Construcción de 5.800 Soluciones habitac en áreas rurales Py	223.253.224.656	223.253.224.656	108.676.726.774	49	1339	435	32	904
Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta - M2	1.857.000.000	1.857.000.000	0	0	500	0	0	500
Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del AMA	21.706.031.507	21.706.031.507	5.861.273.333	27	335	0	0	335

Fuente: SIAF de fecha 04/12/2017, en guaraníes

S.M.R.C



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES									
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - AL 30/11/2017								% DE PARTICIPACION	
CODIGO					DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES.
Dpto.	TP	Prog.	SP	Proy.					EJEC
0					ASUNCION	28.648.009.808	3.766.977.380	13%	3%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	8.296.408.840	94.428.132	1%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	2.567.034.140	135.207.894	5%	
	3	1		2	SP Mercosur Roga	829.777.685	137.277.752	17%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	1.893.548.197	1.193.810.741	63%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	3.265.703.124	2.118.419.528	65%	
	3	1		9	Mejoramiento de las condiciones de habitab de Chacarita Alta	1.857.000.000	0	0%	
	3	1		10	Mejoramiento y ampliación de viviendas del AMA	9.938.537.822	87.833.333	1%	
22 01					CONCEPCION	19.607.904.364	12.840.421.901	65%	2%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	608.000.000	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	479.902.658	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	2.940.422.158	2.940.422.158	100%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	15.579.579.548	9.899.999.743	64%	
22 02					SAN PEDRO	74.692.087.394	46.384.385.841	62%	8%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.006.958.933	187.582.113	19%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	1.600.000.000	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	4.536.339.244	2.391.907.090	53%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	67.548.789.217	43.804.896.638	65%	
22 03					CORDILLERA	10.979.861.972	1.113.403.691	10%	1%
	2	1	3		Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	876.976.300	46.560.394	5%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	10.102.885.672	1.066.843.297	11%	
22 04					GUAIRA	2.777.338.207	1.815.335.196	65%	0%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	77.975.893	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	459.336.342	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	4.828.578	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	2.235.197.394	1.815.335.196	81%	
22 05					CAAGUAZU	23.658.569.497	9.715.843.000	41%	3%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	2.987.721.068	573.348.332	19%	
	2	1	3		Construcción de Viviendas Sociales en Municipios en Py	3.181.269.937	2.621.820.363	82%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	17.489.578.492	6.520.674.305	37%	
22 06					CAAZAPA	14.409.764.853	6.013.258.011	42%	2%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	94.158.948	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	2.809.151.305	1.327.442.961	47%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	11.506.454.600	4.685.815.050	41%	
22 07					ITAPUA	29.472.431.799	7.430.901.556	25%	3%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.727.927.045	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	3.699.203.501	1.578.385.575	43%	
	3	1		2	SP Mercosur Roga	8.752.438.377	979.334.843	11%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	5.500.980.678	2.281.723.340	41%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	9.791.882.198	2.591.457.798	26%	
22 08					MISIONES	1.876.614.545	1.061.409.140	57%	0%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	472.023.764	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	1.404.590.781	1.061.409.140	76%	
22 09					PARAGUARI	612.021.643	1.360.044	0%	0%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	607.021.643	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	5.000.000	1.360.044	0%	
22 10					ALTO PARANA	47.503.020.943	17.338.027.242	36%	5%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	7.978.627.059	75.000.000	1%	
	3	1		7	Construcciones de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	7.721.597.072	7.453.367.105	97%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	31.802.796.812	9.809.660.137	31%	
22 11					CENTRAL	54.027.972.116	35.486.498.668	66%	6%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	9.514.210.163	1.908.631.410	20%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	5.723.074.709	1.989.091.684	35%	
	3	1		7	Construcciones de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	27.023.193.559	25.815.335.574	0%	
	3	1		10	Mejoramiento y ampliación de viviendas del AMA	11.767.493.685	5.773.440.000	0%	
22 12					ÑEEMBUCU	786.403.255	939.263	0%	0%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	785.463.992	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	939.263	939.263	100%	

Fuente: SIAF, en Guaraníes, T. C. 5.600

S.M.R.C




14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso

Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925


S.M.R.C

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES									
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - AL 30/11/2017								% DE PARTICIPACION	
CODIGO					DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES. EJEC
Dpto.	TP	Prog.	SP	Proy.					
22 13					AMAMBAY	15.673.252.727	8.538.089.212	54%	2% 2%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	802.667.280	0	0%	
	3	1		2	SP Mercosur Roga	466.895.277	199.467.738	43%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	2.510.797.004	1.534.193.015	61%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	11.892.893.166	6.804.428.459	57%	
22 14					CANINDEYU	50.141.907.216	25.373.694.453	51%	6% 5%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.707.033.774	889.986.865	52%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	8.866.999.790	6.087.280.149	69%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	39.567.873.652	18.396.427.439	46%	
22 15					PRESIDENTE HAYES	9.740.847.705	6.609.013.489	68%	1% 1%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.376.393.858	726.126.580	53%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	2.608.928.282	684.030.000	26%	
	3	1		7	Construcciones de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	5.755.525.565	5.198.856.909	90%	
22 16					BOQUERON	3.858.220.264	3.644.114.428	94%	0% 1%
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	3.858.220.264	3.644.114.428	94%	
99					ALCANCE NACIONAL	500.992.623.800	280.988.102.493	56%	56% 60%
	1				Programas de Administración	57.177.037.223	35.607.977.350	62%	
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	23.304.618.495	5.644.679.722	24%	
	2	1	2		Fonavis	410.330.180.335	233.720.636.147	57%	
	2	1	3		Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	3.431.703.398	2.781.158.428	81%	
	3	1		2	SP Mercosur Roga	802.116.641	327.127.358	41%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	4.885.324.260	2.806.523.488	57%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	1.060.000.000	100.000.000	9%	
	4	1			Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	0	0%	
TOTAL EN GUARANÍES						889.458.852.108	468.121.775.008	53%	
TOTAL EN MILLONES DE USD						158.831.938	83.593.174	53%	
Fuente: SIAF, en Guaraníes, T. C. 5.600								S.M.R.C	

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO

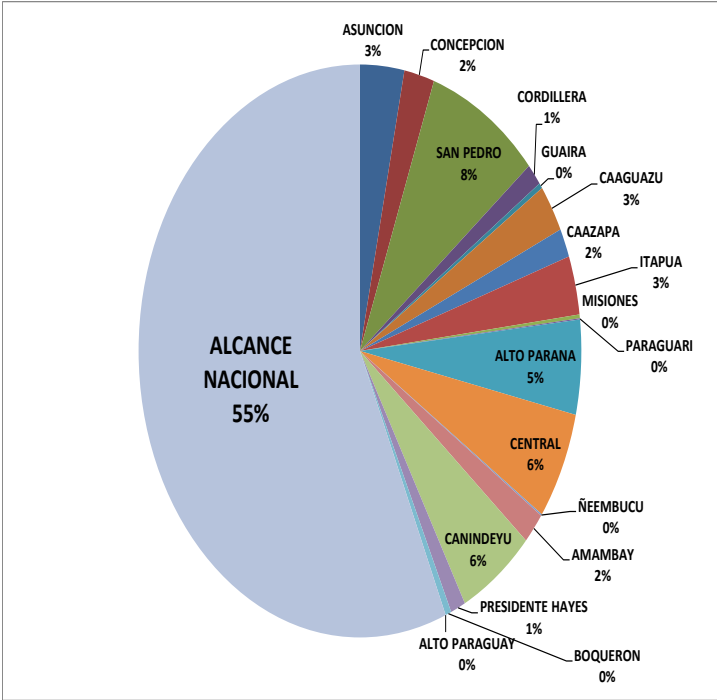

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA EJECUCIÓN

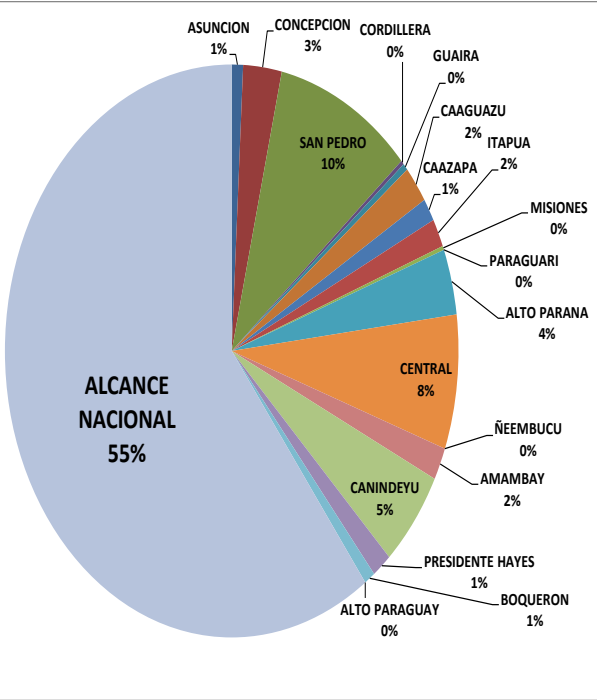

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SE SOLICITA:

DISTRIBUCIÓN DE LA META INICIAL DE PRODUCCIÓN Y EL AVANCE DE PRODUCCIÓN POR MUNICIPIO. ALCANCE NACIONAL DEMOSTRAR FINANCIERA Y PRODUCTIVAMENTE POR MUNICIPIO.

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017							
VIVIENDAS	Ejecucion Financiera			Ejecución Productiva			
	Plan Financiero	Ejecucion	%	Meta Inicial	Avance	%	Saldo
TOTAL	788.398.779.259	491.186.527.882	62%				
SOLUCIONES HABITACIONALES	58.680.034.076	10.099.783.154	17%				
Asunción	8.296.408.840	94.428.132	1%				
Concepción	608.000.000	0	0%				
San Pedro	1.006.958.933	187.582.113	19%				
Guairá	77.975.893	0	0%				
Caaguazú	2.987.721.068	573.348.332	19%				
Caazapá	94.158.948	0	0%				
Itapúa	1.727.927.045	0	0%				
Alto Paraná	7.978.627.059	75.000.000	1%				
Central	9.514.210.163	1.908.631.410	20%				
Canindeyú	1.707.033.774	889.986.865	52%				
Presidente Hayes	1.376.393.858	726.126.580	53%				
Alcance Nacional	23.304.618.495	5.644.679.722	24%				
FONAVIS - SUBSIDIO PARA VIVIENDAS SOCIAL	364.409.200.607	292.398.366.371	80%				
Alcance Nacional	410.330.180.335	233.720.636.147	57%				
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY.	32.143.344.801	11.163.697.299	35%				
Asunción	2.567.034.140	135.207.894	5%				
Concepción	479.902.658	0	0%				
San Pedro	1.600.000.000	0	0%				
Cordillera	876.976.300	46.560.394	5%				
Guairá	459.336.342	0	0%				
Caaguazú	3.181.269.937	2.621.820.363	82%				
Caazapá	2.809.151.305	1.327.442.961	47%				
Itapúa	3.699.203.501	1.578.385.575	43%				
Misiones	2.511.611.314	0	0%				
Paraguarí	607.021.643	0	0%				
Central	5.723.074.709	1.989.091.684	35%				
Ñeembucu	785.463.992	0	0%				
Amambay	802.667.280	0	0%				
Presidente Hayes	2.608.928.282	684.030.000	26%				
Alcance Nacional	3.431.703.398	2.781.158.428	81%				
SP MERCOSUR ROGA	10.851.227.980	1.638.207.691	15%				
Asunción	829.777.685	132.277.752	16%				
Itapúa	8.752.438.377	979.334.843	11%				
Amambay	466.895.277	199.467.738	43%				
Alcance Nacional	802.116.641	327.127.358	41%				
CONSTRUCCIÓN DE 4.500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY	75.498.715.632	61.348.473.260	81%				
Asunción	1.893.548.197	1.193.810.741	63%				
Concepción	2.940.422.158	2.940.422.158	100%				
San Pedro	4.536.339.244	2.391.907.090	53%				
Guairá	4.828.578	0	0%				
Itapúa	5.500.980.678	2.281.723.340	41%				
Alto Paraná	7.721.597.072	7.453.367.105	97%				
Central	27.023.193.559	25.815.335.574	96%				
Ñeembucú	939.263	939.263	100%				
Amambay	2.510.797.004	1.534.193.015	61%				
Canindeyú	8.866.999.790	6.087.280.149	69%				
Presidente Hayes	5.755.525.565	5.198.856.909	90%				
Boquerón	3.858.220.264	3.644.114.428	94%				
Alcance Nacional	4.885.324.260	2.806.523.488	57%				
VY´A RENDA - CONSTRUCCIONES DE 5.800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES DEL PY.	223.253.224.656	108.676.726.774	49%				
Asunción	3.265.703.124	2.118.419.528	65%				
Concepción	15.579.579.548	9.899.999.743	64%				
San Pedro	67.548.789.217	43.804.896.638	65%				
Cordillera	10.102.885.672	1.066.843.297	11%				
Guairá	2.235.197.394	1.815.335.196	81%				
Caaguazú	17.489.578.492	6.520.674.305	37%				
Caazapá	11.506.454.600	4.685.815.050	41%				
Itapúa	9.791.882.198	2.591.457.798	26%				
Misiones	1.404.590.781	1.061.409.140	76%				
Paraguarí	5.000.000	1.360.044	27%				
Alto Paraná	31.802.796.812	9.809.660.137	31%				
Amambay	11.892.893.166	6.804.428.459	57%				
Canindeyú	39.567.873.652	18.396.427.439	46%				
Alcance Nacional	1.060.000.000	100.000.000	9%				
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HÁBITAT DE CHACARITA ALTA	1.857.000.000	0	0%				
Asunción	1.857.000.000	0	0%				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA	21.706.031.507	5.861.273.333	27%				
Asunción	9.938.537.822	87.833.333	1%				
Central	11.767.493.685	5.773.440.000	49%				
Alcance Nacional	0	0	0%				

Fuente: SIAF de fecha 11/12/2017, SENA VITAT

S.M.R.C

